



Operation Number: **CO-L1126**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2015**
Last Update: **10/16/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/19/2015**
Division Chief validation date: **10/29/2015**
Country Representative validation date: **10/29/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Program to Strengthen the Public Investment System	Loan Number:	2977/OC-CO
Executing Agency (EA):	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		
Team Leader:	Arisi,Diego	Sector/Subsector:	DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	COLOMBIA
Borrower:	REPUBLICA DE COLOMBIA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
CO-L1126	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$25,000,000.00	\$0.00	\$33,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
CO-L1126	\$8,000,000.00	\$1,784,202.64	22.30%	\$6,215,797.36


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

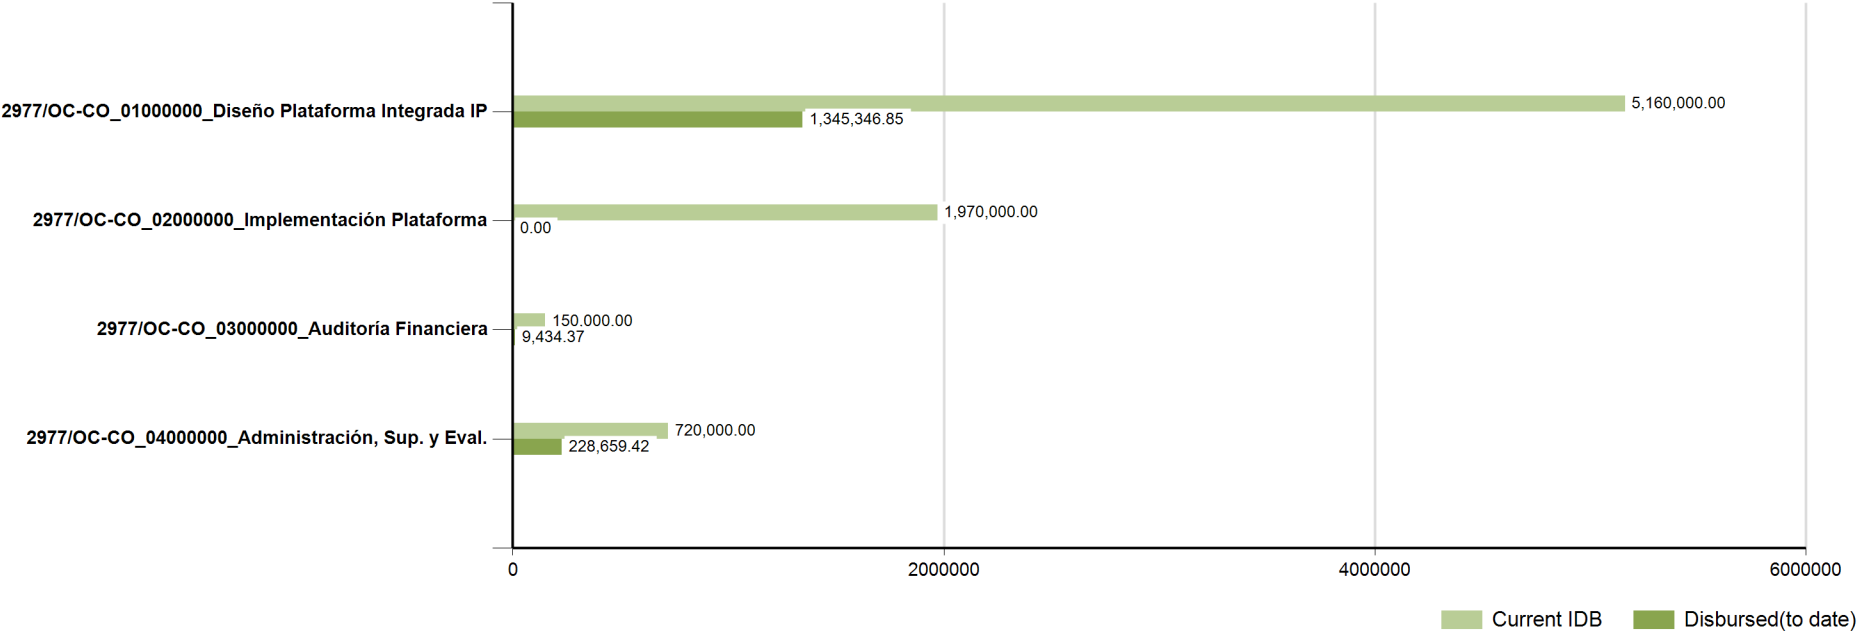

Results Matrix

Impacts

Impact:	0 Mejorar la transparencia en el uso de los recursos de inversión pública								
Observation:	fuente: Estadísticas de la Subdirección Territorial y de Inversión Pública del DNP. La línea de base se compone por el número de visitas al Sistema General de Regalías (SGR) y al Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión (SPI).								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2017		EOP
0.0 Número de visitas anuales a los sistemas de información en línea para los proyectos de inversión pública		Visitas	1,266,575.00	2012	Estadísticas de la Subdirección Territorial y de Inversión Pública- DNP	La línea de base se compone por el número de visitas al Sistema General de Regalías (SGR) y al Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión (SPI). Al finalizar el programa, la información sobre proyectos de inversión se publicará en un sistema único denominado Mapa Inversiones. Los detalles que soportan las proyecciones estimadas para el incremento de visitas se encuentran en el Enlace Opcional 9.	P	4,051,414.00	4,051,414.00
							P(a)	4,051,414.00	
							A		

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	0 Los recursos de inversión pública nacional financiados con recursos provenientes con regalías estarán sujetos a un monitoreo y seguimiento que facilite la toma de decisiones y que permita la identificación de alertas tempranas
Observation:	Fuente: Subdirección Territorial y de Inversión Pública y Dirección de Regalías del DNP.

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2017		EOP
0.0 Porcentaje de proyectos aprobados financiados con recursos de regalías cuya información está disponible on-line		Porcentaje	0.00	2013	No. de proyectos aprobados financiados con recursos de regalías cuya información está disponible on-line / No. de proyectos aprobados financiados con recursos de regalías. Subdirección Territorial y de Inversión Pública-DNP / Sistemas DNP (https://sgr.dnp.gov.co/).	Aunque hoy en día hay información en la página del SGR, esta no es específica a ningún proyecto. Mapa Inversiones mostrara información sobre cada proyecto, no general, por lo que el valor de línea de base es 0%.	P	100.00	100.00
	P(a)						100.00		
	A								

0.0 Porcentaje de proyectos aprobados financiados con SGR registrados en el SUIFP con información completa						Por información completa se entiende que como mínimo está: (i) Ejecución financiera actualizada con corte a la normatividad establecida por el DNP. (ii) Ejecución física actualizada con corte a la normatividad establecida por el DNP. (iii) Proyecto georeferenciado (iv) Fotos de ejecución con corte a la normatividad establecida por el DNP. Datos de responsables actualizados de acuerdo a la normatividad establecida por el DNP.	P	80.00	80.00
							P(a)	80.00	
							A		
		Porcentaje	10.00	2013	No. de proyectos aprobados financiados con recursos de regalías cuya información está completa / No. de proyectos aprobados financiados con recursos de regalías DNP – Dirección de regalías				
Observación:	Fuente: Dirección de Regalías. Encuestas Secretarías de Planeación. Información Banco de Proyectos (SUIFP).								

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2017		EOP
							P		
0.0 Tiempo promedio que dedica un funcionario del DNP en solicitar, enviar y procesar información para el monitoreo, seguimiento y control de los proyectos de inversión financiados con recursos de regalías		Días	30.00	2013	DNP. Encuesta a funcionarios Dirección de Regalías.	Se realizó una encuesta para estimar la línea de base. Los resultados de la misma, se encuentran disponibles en el enlace opcional No. 10. Será necesario realizar una encuesta de seguimiento en 2017, para verificar la reducción en tiempos.	P	25.00	25.00
	P(a)					25.00			
	A								

0.0 Tiempo promedio que dedican funcionarios de la Secretaría de Planeación municipal en la revisión y verificación de requisitos por proyecto a ser financiado con recursos de regalías						Se realizó una encuest a para estimar la línea de base. Los resultados de la misma, se encuentran disponibles en el enlace opcional No. 10. Se estima que el tiempo establecido en la norma de 5 días hábiles se alcanzará en 2019. Será necesario realizar un encuesta de seguimiento en 2017, para verificar la reducción en tiempos.	P	11.00	11.00
							P(a)	11.00	
							A		
		Días	14.29	2013	Tiempo promedio que dedican funcionarios de la Secretaria de Planeación municipal en la revisión y verificación de requisitos por proyecto a ser financiados con recursos de regalías.				

0.0 Tiempo promedio que tarda un proyecto desde la formulación (inscripción inicial en el SUIFP) hasta la aprobación						Actualm	P	30.00	30.00
						ente la	P(a)	30.00	
						informac	A		
						ión del			
						Banco			
						de			
						Proyecto			
						s no			
						incluye			
						el			
						tiempo			
						entre			
						formulac			
						ión e			
						inscripci			
						ón en el			
						Banco			
						de			
						Proyecto			
						s. En la			
						encuest			
						a			
						realizad			
						a a los			
						actores			
						del			
						sistema			
						se			
						estimó			
						que el			
						tiempo			
						de			
						proceso			
						es más			
						alto y			
						puede			
						llegar a			
						ser del			
						doble de			
						este			
						valor.			
						Los			
						resultad			
						os de la			
						misma,			
						se			
						encuentr			
						an			
						disponib			
						les en el			
						enlace			
						opcional			
						No. 10 .			
						Será			
						necesari			
						o			
						realizar			
						una			
						encuest			
						a de			
						seguimi			
						ento			
						para			
						evaluar			
						el			
						cumplim			
						iento de			
						la meta.			

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Diseño de una Plataforma Tecnológica Integrada de Inversión Pública		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Análisis de procedimientos existentes y la elaboración de propuestas al marco regulatorio para el funcionamiento de la PII	Análisis	P		1.00	P	120,000.00	240,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	120,000.00	240,000.00
		A		0.00	A	36,364.69	36,364.69
Diseño, planificación, construcción y estabilización de la plataforma base de servicios y el módulo web de la nueva MGA	Herramienta Web	P		1.00	P		1,400,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		1,400,000.00
		A		1.00	A		1,345,346.85
Análisis del estado actual de sistemas de información, infraestructura tecnológica, bases de datos en utilización, recursos humanos y dimensionamiento de requerimientos	Análisis	P		1.00	P	420,000.00	840,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	190,000.00	430,000.00
		A		0.00	A	9,005.27	9,005.27
Plataforma Tecnológica Integrada de Inversión Pública diseñada	Plan	P		1.00	P	1,325,000.00	2,650,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	1,296,430.00	2,650,000.00
		A		0.00	A		0.00
Plan Organizacional para la gestión de contenido de la PII	Plan	P		1.00	P		220,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		220,000.00
		A		0.00	A		0.00
Propuesta de gestión de cambio y programa de entrenamiento e implementación de una estrategia de comunicaciones para MapalInversiones	Propuesta	P		1.00	P		220,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		220,000.00
		A		0.00	A		0.00
Implementación de la Plataforma Tecnológica Integrada de Inversión		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Implementación herramienta de visualización y georeferenciación de recursos y proyectos de inversión pública - MapalInversiones	Sistema	P		1.00	P	985,000.00	1,970,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	985,000.00	1,970,000.00
		A		0.00	A		0.00

Other Cost		2015	Cost
Auditoría Financiera	P	\$35,190.00	\$150,000.00
	P(a)	\$58,990.00	\$150,000.00
	A	\$20,666.36	\$20,666.36
Administración, Supervisión y Evaluación	P		\$310,000.00
	P(a)	\$292,497.29	\$720,000.00
	A	\$79,860.42	\$297,933.13
Módulo del Sistema General de Regalías (SGR) en la PII. Pilotos en entidades territoriales y un OCAD implementados. Asistencia técnica al diseño e implementación de la Plataforma. (Aporte Local)	P		\$25,000,000.00
	P(a)		\$25,000,000.00
	A		\$0.00
Total Cost		2015	Total Cost
	P	\$2,885,190.00	\$33,000,000.00
	P(a)	\$2,942,917.29	\$30,202,979.45
	A	\$145,896.74	\$1,709,316.30

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
