



Operation Number: **BR-L1020**
Year- PMR Cycle: **Segundo período enero-diciembre 2014**
Last Update: **4/3/2015**
PMR Validation Stage: **Validada por el Representante de País**

Chief of Operations validation date: **04/17/2015**
Division Chief validation date: **04/23/2015**
Country Representative validation date: **05/09/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Producción y Difusión de Innovaciones Competitividad Clusters Estado Pernambuco	Loan Number:	2147/OC-BR
Executing Agency (EA):	ESTADO DE PERNAMBUCO		
Team Leader:	Radaelli,Vanderleia	Sector/Subsector:	IN
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Desembolso (De la elegibilidad hasta que todos los préstamos están cerrados).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	ESTADO DE PERNAMBUCO		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1020	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$6,700,000.00	\$0.00	\$16,700,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1020	\$10,000,000.00	\$1,000,000.00	10.00%	\$9,000,000.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C(R)
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

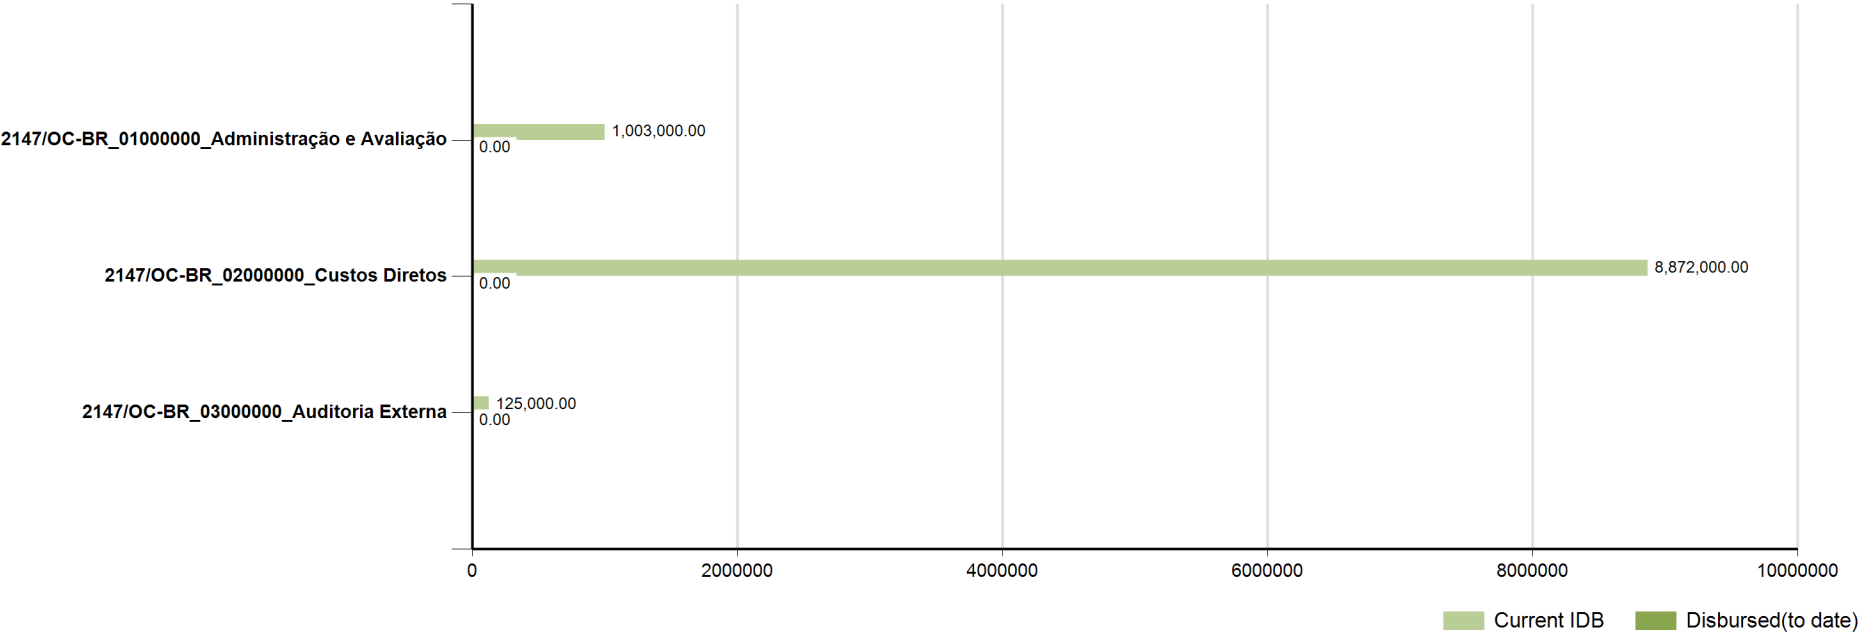

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Contribuir al crecimiento económico sostenible de Pernambuco, aumentando la competitividad de las empresas involucradas en los APLs del estado donde se pueden lograr resultados en el periodo de ejecución del Programa.								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		EOP
1.1 Valor de las ventas por empleado en las empresas beneficiarias en los APLs participantes elevado		Porcentaje	0.00	2011	Encuestas especializadas y datos secundarios oficiales.		P	10.00	10.00
							P(a)	10.00	10.00
							A		
1.2 Valor de las exportaciones de las empresas beneficiarias en los APLs participantes elevado		%	0.00	2011	Encuestas especializadas y datos secundarios oficiales.		P	10.00	10.00
							P(a)	10.00	10.00
							A		

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Desarrollo de un mecanismo de producción y difusión de innovaciones y de articulación entre los actores (empresas, instituciones relacionadas, etc.) de los APLs participantes, apoyado.									
Observation:	Cada uno de los indicadores siguientes está referido a un impacto específico y único a lograr por el programa, y no está referido a una acción particular. Por diseño, de acuerdo a lo especificado en el Reglamento Operativo, la línea de base se mide en cad									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		2015	EOP
1.1 Número de empresas que manifiestan haber realizado actividades innovadoras o introducido nuevos productos y/o procesos en el mercado incrementado.		%	0.00	2011	Sistema de Seguimiento o y Evaluación del Programa.		P		25.00	25.00
	P(a)							25.00	25.00	
	A									
1.2 Número de consorcios, asociaciones, etc., entre las empresas del APL, y entre éstas y otros actores de la cadena productiva incrementado		%	0.00	2011	Sistema de Seguimiento o y Evaluación del Programa.		P	15.00	15.00	30.00
	P(a)						15.00	15.00	30.00	
	A									

1.3 Número de entidades de apoyo relacionadas (universidades, centros de investigación, etc.) que participan en acciones para el desarrollo elevado.							P	10.00	10.00	20.00
							P(a)	10.00	10.00	20.00
							A	0.00		
		%	0.00	2011	Sistema de Seguimient o y Evaluación del Programa.					

 RF - RF Indicator
  SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente 1: Desarrollo de un Modelo Público-Privado de Apoyo al Mejoramiento de la Competitividad de los APLs.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Sistema Público-Privado de Apoyo al Mejoramiento de la Competitividad de los Arreglos Productivos Locales (APLs) desarrollado.	Sistema	P	0.00	1.00	P	200,000.00	1,000,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	435,000.00	578,783.94
		A		0.00	A	13,783.94	32,783.94
Componente 2: Cofinanciamiento de acciones específicas de los PMCs de APLs		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Arreglos Productivos Locales (APLs) fortalecidos	APL	P		0.00	P	5,456,250.00	12,125,000.00
		P(a)		0.00	P(a)	5,640,000.00	6,489,327.40
		A		0.00	A	4,327.40	4,327.40
Componente 3: Aplicaciones estratégicas de tecnología de información y comunicación (TIC) para los APLs		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Sistema de aplicaciones estratégicas de tecnología de información y comunicación (TIC) para los 7 APLs desarrollado e implementado.	Sistema	P	1.00	1.00	P	640,000.00	1,280,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	520,000.00	760,000.00
		A		0.00	A		0.00
Componente 4: Desarrollo e implementación de un sistema de acompañamiento y evaluación y de identificación y divulgación de lecciones aprendidas.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Sistema de acompañamiento y evaluación y de identificación y divulgación de lecciones aprendidas desarrollado y en funcionamiento.	Sistema	P	1.00	1.00	P	76,000.00	380,000.00
		P(a)	1.00	0.00	P(a)	158,000.00	222,000.00
		A		0.00	A		0.00
Administración del Programa							

Other Cost		2014	Cost
Gestión y administración del Programa.	P	\$200,000.00	\$1,053,000.00
	P(a)	\$575,000.00	\$989,621.62
	A	\$511,621.62	\$952,621.62
Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$6,572,250.00	\$15,838,000.00
	P(a)	\$7,328,000.00	\$989,732.96
	A	\$529,732.96	\$989,732.96

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Producto	Sistema Público-Privado de Apoyo al Mejoramiento de la Competitividad de los Arreglos Productivos Locales (APLs) desarrollado.	Modify Financial P(a) value	Projeto em vias de reformulação/modificação.	4/2/2015	3/30/2015
Producto	Arreglos Productivos Locales (APLs) fortalecidos	Modify Financial P(a) value	Projeto em vias de reformulação/modificação.	4/2/2015	3/30/2015
Producto	Sistema de acompañamiento y evaluación y de identificación y divulgación de lecciones aprendidas desarrollado y en funcionamiento.	Modify Financial P(a) value	Projeto em vias de reformulação/modificação.	4/2/2015	3/30/2015

Producto	Sistema de aplicaciones estratégicas de tecnología de información y comunicación (TIC) para los 7 APLs desarrollado e implementado.	Modify Financial P(a) value	Projeto em vias de reformulação/modificação.	4/2/2015	3/30/2015
----------	---	-----------------------------	--	----------	-----------

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
