



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	SECRETARIA EJECUTIVA DE ICMSJ				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE				
Número(s) de Préstamo:	1905/OC-GU	Monto Aprobado Actual:	30.000.000,00	BID Original:	30.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:		Actual BID:	30.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:		Pari-passu:	99,00
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo:	30.000.000,00	Co-financiamiento/País:	170.020,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica			Estimado Original:	30.170.020,00
				Período de Amortización (meses):	

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: C	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Sep 26, 2011 Validado por Representante de País: Sep 28, 2011

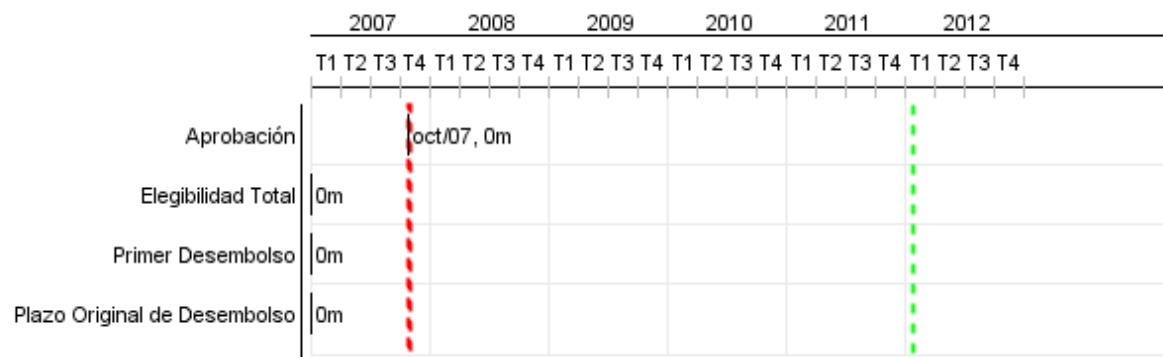

Progreso Acumulado al 2011

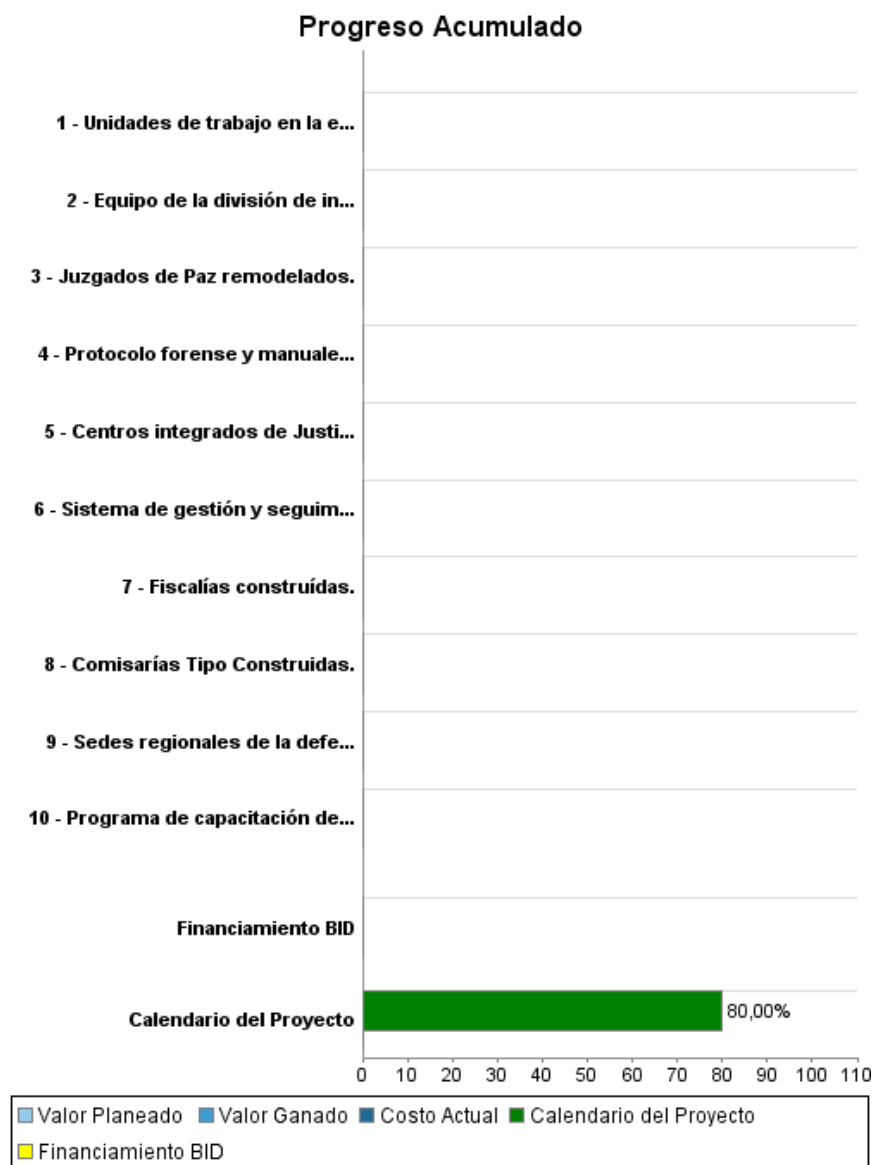

Resultados

Resultado: Acceso al sistema de Justicia penal en Guatemala incrementada en el área de influencia del programa.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	Fin de Proyecto
Casos conocidos y resueltos.	Casos	140.058,00	2005	P	175.073,00	175.073,00
				A		
Horario de atención diario del servicio de justicia penal.	Horas	7,00	2005	P	24,00	24,00
				A		

Resultado: Efectividad del sistema de Justicia penal en Guatemala incrementada.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	Fin de Proyecto
Tiempo de duración en el cumplimiento de los plazos procesales y constitucionales de la primera declaración ante el juez competente en los CIJP.	Días	30,00	2005	P		1,00
				A		
Detenciones ilegales que se procesan en las áreas donde se construyen los CIJ.	%	20,00	2005	P		10,00
				A		

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Acceso a la Justicia.									
Centros integrados de Justicia -CIJ- Construidos.	Centros				13,00				6.374.600,00
Sedes regionales de la defensa penal construidos.	Sedes regionales				5,00				3.721.000,00
Juzgados de Paz remodelados.	Juzgados de Paz				15,00				2.425.000,00
Comisaría Tipo Construidas.	Comisaría tipo				5,00				2.133.000,00
Fiscalías construidas.	Fiscalías				5,00				2.317.226,00
Gestión y seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal.									
Sistema de gestión y seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal.	Sistema de Gestión				1,00				7.229.181,00
Fortalecimiento Sectorial en materia de investigación criminal y científica.									
Programa de capacitación de los funcionarios que tienen a cargo la función sustantiva y la investigación científica.	Programa				1,00				373.540,00
Equipo de la división de investigación criminal y verificación de la prueba.	Equipo				1,00				401.460,00
Unidades de trabajo en la escena del crimen e investigación de la prueba conformadas.	Unidades de trabajo				1,00				288.540,00
Protocolo forense y manuales estandarizados para el tratamiento y conservación de la prueba .	Protocolo forense				1,00				276.460,00
Gestión del Programa									
TOTAL									25.540.007,00
