



Operation Number: **BR-L1372**
Year- PMR Cycle: **Primer período enero-junio 2014**
Last Update: **10/29/2014**
PMR Validation Stage: **Borrador**

Chief of Operations validation date: **10/31/2014**
Division Chief validation date: **10/31/2014**
Country Representative validation date: **11/02/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Programa Integrado de Inclusión Social y Recualificación Urbana: Fam. Paranaense		Loan Number:	3129/OC-BR
Executing Agency (EA):	ESTADO DO PARANA			
Team Leader:	Ochoa,Francisco Jose	Sector/Subsector:	POVERTY ALLEVIATION	
Operation Type:	Loan Operation		Overall Stage:	Desembolso (De la elegibilidad hasta que todos los préstamos están cerrados).
Lending Instrument:	Investment Loan		Country:	BRAZIL
Borrower:	ESTADO DO PARANA		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1372	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$40,000,000.00	\$0.00	\$100,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1372	\$60,000,000.00	\$0.00	0.00%	\$60,000,000.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

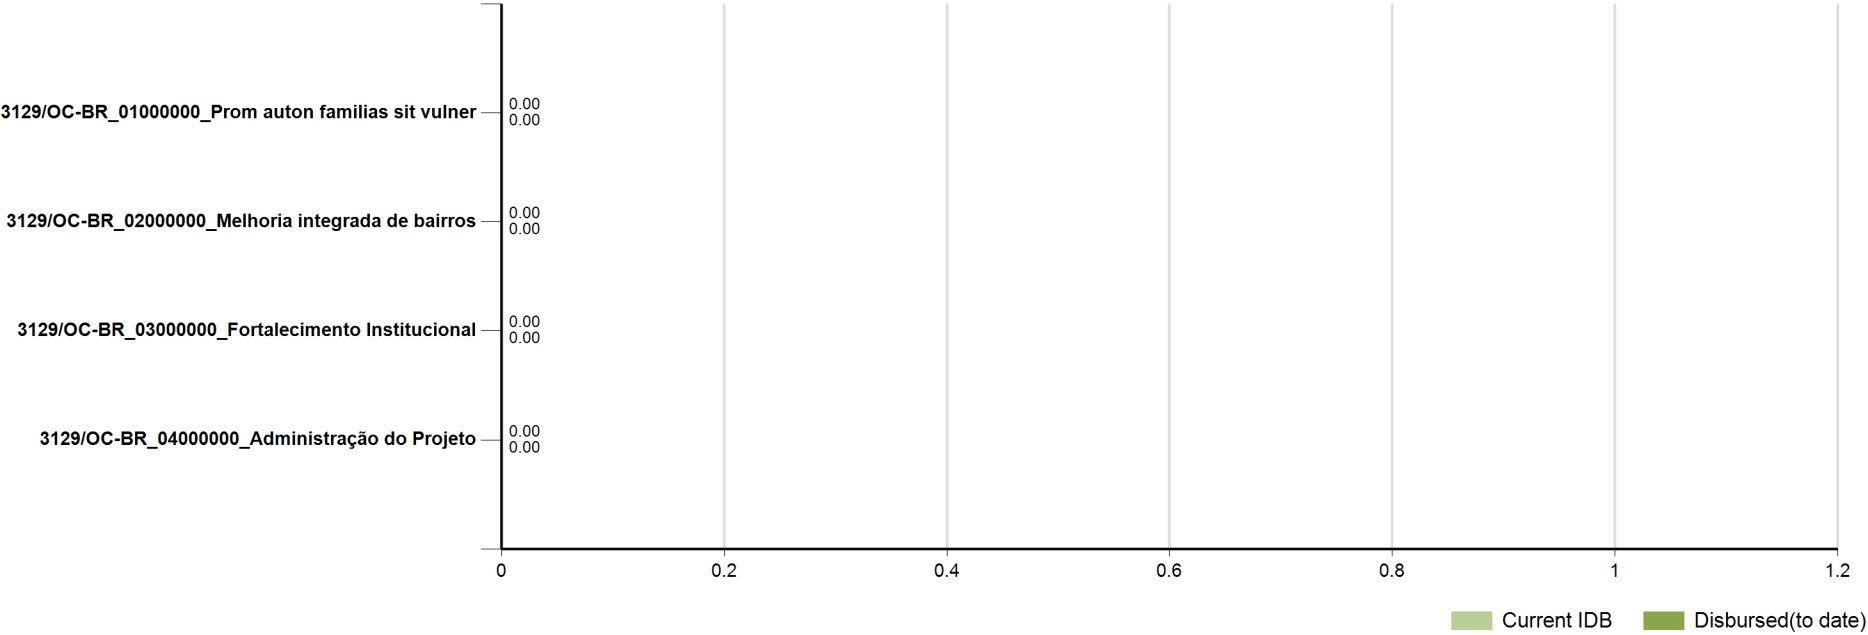

Results Matrix

Impacts

Impact:	0 Condiçao de vida das familias mediante acoes do Governo melhoradas							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
0.0 Familias com acesso e uso dos servicos em educacao, saude e desenvolvimento social produtivo melhorados		%		2014	Sistema de informacao do Programa		P	
							P(a)	
							A	
0.1 Familias com indice melhorado de habilitação psicosocial		%		2014			P	
							P(a)	
							A	
0.2 Familias abordadas pelo programa ao concluir 24 meses de acompanhamento, que deram continuidade a sua propria habilitacao social		%		2014			P	
							P(a)	
							A	

 RF - RF Indicator
 SI - Sector Indicator
 CI - Country Indicator
 PG - Pro-Gender
 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	0 Resultado Final 1: Autonomia das Famílias vulneráveis melhorado							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
0.0 Famílias que após dois anos de acompanhamento, possuem 60% das ações do plano de ação cumpridas		%		2014	Sistema de informação do Programa		P	100.00
	P(a)							
	A							
0.1 Mulheres e homens participantes dos empreendimentos financiados pelo programa que melhoram sua renda		%		2014	Sistema de informação do Programa		P	70.00
	P(a)							
	A							
0.2 Crianças entre 06 e 14 anos, que estavam fora da escola, foram incorporados e permaneceram na escola após dois anos de acompanhamento		%		2014	Sistema de informação do Programa		P	50.00
	P(a)							
	A							

Outcome:	0 Resultado Final 2: Bairros integralmente melhorados							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
0.0 Familias atendidas pelo subcomponent e 2.1 que habitam em casas de materiais e pisos permanentes		%	30.00	2014	Relatorio semestral do Programa		P	100.00
							P(a)	
							A	
0.1 Familias atendidas pelo subcomponent e 2.1 com acesso a agua potavel no domicilio		%	50.00	2014	Relatorio semestral do Programa		P	100.00
							P(a)	
							A	
Outcome:	0 Resultado Final 3: Capacidade institucional fortalecida							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
0.0 Participantes da capacitacao sobre a metodologia do programa e que obtiveram pelo menos 60% da prova de conhecimento		%	0.00	2014	Testes de conhecimento		P	90.00
							P(a)	
							A	

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente I: Promoção a Autonomia das Famílias em Situação de Vulnerabilidade		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Planos de Ação Familiar pactuados com a família beneficiaria elaborados	Planos	P	4,571.00	21,251.00	P		
		P(a)	4,571.00	21,251.00	P(a)	4,443,637.50	20,658,877.50
		A			A		
Pessoas perfil FP capacitadas e certificadas (SETS)	Capacitações	P	540.00	3,060.00	P		
		P(a)	540.00	3,060.00	P(a)	439,853.00	10,492,393.00
		A			A		
Projetos produtivos familiares rurais implementados (SEAB)	Projetos	P	0.00	2,826.00	P		
		P(a)		2,826.00	P(a)		12,014,500.00
		A			A		
Famílias participantes de novos projetos de inclusao socio produtiva em funcionamento (economia solidaria)	Famílias	P	180.00	540.00	P		
		P(a)	180.00	540.00	P(a)	840,718.00	13,538,954.00
		A			A		
Componente II: Melhoria Integrada de Bairros		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Famílias com casas novas recebidas	Famílias	P	25.00	500.00	P		
		P(a)	25.00	500.00	P(a)	800,000.00	16,000,000.00
		A			A		
Lotes regularizados	Lotes	P	0.00	695.00	P		
		P(a)		695.00	P(a)		8,340,000.00
		A			A		
CRAS construidos e em funcionamento	CRAS	P	0.00	22.00	P		
		P(a)		22.00	P(a)		7,040,000.00
		A			A		
CREAS construidos e em funcionamento	CREAS	P	0.00	8.00	P		
		P(a)		8.00	P(a)		2,560,000.00
		A			A		
Componente III: Fortalecimento Institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Investigações e estudos realizados	Estudos	P	1.00	6.00	P		
		P(a)	1.00	6.00	P(a)	500,000.00	1,900,000.00
		A			A		
Participantes do Programa Capacitados	Participantes	P	2,460.00	12,300.00	P		
		P(a)	2,460.00	12,300.00	P(a)	320,000.00	1,240,276.00
		A			A		
Modulos do Sistema de informacoes Gerenciais desenhados e em funcionamento	Sistema	P	2.00	5.00	P		
		P(a)	2.00	5.00	P(a)	400,000.00	1,215,000.00
		A			A		
Componente IV: Administração do Projeto							
Other Cost						2014	Cost
Administração					P		
					P(a)	\$1,500,000.00	\$5,000,000.00
					A		

Total Cost		2014	Total Cost
	P		
	P(a)	\$9,244,208.50	\$75,985,535.50
	A		

Changes to the Matrix

No information related to this operation.
