



Operation Number: **AR-L1127**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2014**
Last Update: **4/1/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/07/2015**
Division Chief validation date: **05/05/2015**
Country Representative validation date: **05/07/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Program for Strengthen. Provincial. Inst & Fiscal Managem. Stage II (PROFIP II)	Loan Number:	2754/OC-AR
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBL		
Team Leader:	Reyes,Javier Ramiro	Sector/Subsector:	DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	ARGENTINA
Borrower:	NACION ARGENTINA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
AR-L1127	\$36,000,000.00	\$36,000,000.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$45,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
AR-L1127	\$36,000,000.00	\$15,288,911.17	42.47%	\$20,711,088.83


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

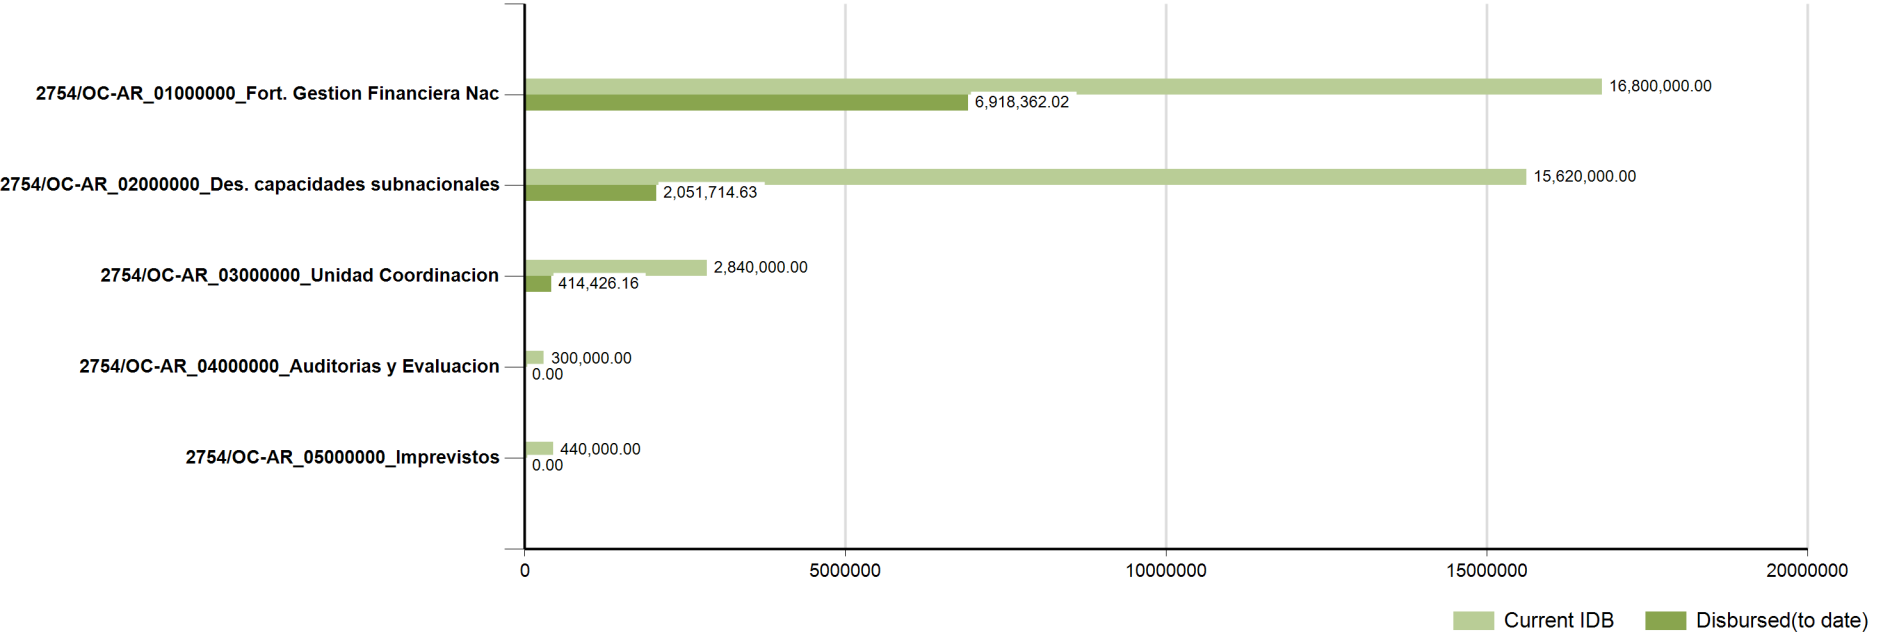

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Gestión pública orientada a resultados a nivel nacional y subnacional mejorada									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		EOP	
1.1 Puntaje del SEP- Pilar Gestión Financiera		Puntaje	3.30	2008	Informes SEP- PRODEV ¿ próximas publicaciones previstas en 2012 y 2015	En Argentina el presupuesto está estructurado por programas. La Secretaría de Hacienda (SH) es el Órgano Rector (OR) en cuanto a gestión financiera, PxR y monitoreo y evaluación presupuestari a. El indicador considera a 3 pilares de los 5	P	3.30	3.40	
							P(a)	3.30	3.40	
							A	3.40		
1.2 Puntaje del SEP- Pilar Presupuesto por Resultados		Puntaje	2.10	2008	Informes SEP- PRODEV ¿ próximas publicaciones previstas en 2012 y 2015	En Argentina el presupuesto está estructurado por programas. La Secretaría de Hacienda (SH) es el Órgano Rector (OR) en cuanto a gestión financiera, PxR y monitoreo y evaluación presupuestari a. El indicador considera a 3 pilares de los 5	P	2.20	2.60	
							P(a)	2.20	2.60	
							A	2.50		

1.3 Puntaje del SEP- Pilar Monitoreo y Evaluación						En Argentina el presupuesto está estructurado por programas. La Secretaría de Hacienda (SH) es el Órgano Rector (OR) en cuanto a gestión financiera, PxR y monitoreo y evaluación presupuestaria. El indicador considera a 3 pilares de los 5	P	1.40	2.00
							P(a)	1.40	2.00
							A	0.80	
		Puntaje	0.80	2008	Informes SEP- PRODEV ¿ próximas publicaciones previstas en 2012 y 2015				

 RF - RF Indicator
  SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Sistema público de gestión financiera y presupuestaria en las instituciones de la APN modernizado
Observation:	

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	EOP	
1.1 Número de programas presupuestarios de la APN con presupuesto primario gestionado en base a indicadores de resultado alineados con la programación presupuestaria			programas presupuestarios	16.00	2012	Informes anuales de monitoreo de la SH	La SH realiza el seguimiento de categorías programáticas y/o proyectos de inversión que tienen metas físicas, mediante el Sistema de Seguimiento Físico. En 2010, este sistema cubrió el 66,3% de la cartera programática (265 programas sobre un total de 400).	P	28.00	46.00	71.00	85.00		100.00
							P(a)	28.00	48.00	71.00	85.00		100.00	
							A	36.00	48.00					
1.2 Gasto primario de la APN administrado por el Sistema Integrado de Información Financiera internet (e-SIDIF) transaccional			% gasto primario	8.00	2012	Informes anuales de monitoreo de la SH	El e-SIDIF trabajará sobre un total de 109 organismos de la APN más los 40 órganos rectores.	P			30.00			100.00
							P(a)			30.00			100.00	
							A							
Outcome:	2 Gestión Pública orientada a resultados en las entidades públicas y/o mixtas sub-nacionales fortalecida													
Observation:														

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations							
2.1 Sub-índice de capacidad institucional del ICI		puntaje	0.24	2012	Informes anuales de seguimiento a la ejecución y metas del Programa elaborados por la UCEN	La Línea de Base se construyó con el promedio de 34 proyectos evaluados al inicio del Programa. La meta será un promedio total de proyectos.	P	0.26	0.30	0.35	0.38	0.40	0.40
	P(a)					0.26	0.30	0.35	0.38	0.40	0.40		
	A						0.32						
2.2 Atributo referido a las capacidades de gestión de políticas públicas orientadas a resultado a nivel sub-nacional (IGER)		puntaje	0.09	2012	Informe de medición del IGER	Atributo del IGER referido a gestión pública orientada a resultados sub-nacional. La LB se obtuvo como proxy, cubriendo 34 proyectos del PROFIP I. La meta se medirá en base a la totalidad de proyectos financiados con el PROFIP II	P			0.11			0.15
	P(a)							0.11			0.15		
	A												

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Fortalecimiento de la gestión presupuestaria y financiera gubernamental		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Sistema e-SIDIF desplegado	sistema	P		1.00	P	3,221,607.00	16,754,446.00
		P(a)		1.00	P(a)	6,198,000.00	16,754,446.00
		A		0.00	A	5,032,753.00	7,684,753.00
Herramientas y soluciones informáticas de PxR desarrolladas por los 4 ORs implementadas	Programas presupuestarios	P	18.00	84.00	P	996,614.00	4,245,554.00
		P(a)	12.00	78.00	P(a)	1,188,000.00	4,245,554.00
		A	12.00	48.00	A	874,773.00	1,610,773.00
Fortalecimiento Institucional de la gestión pública sub-nacional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Proyectos de Desarrollo de la Capacidad Institucional implementados	proyectos	P	10.00	40.00	P	4,099,200.00	19,520,000.00
		P(a)	14.00	40.00	P(a)	4,099,200.00	19,520,000.00
		A	17.00	21.00	A	3,031,800.00	4,696,800.00
Provincias beneficiadas con el programa	Governments	P		0.00	P		
		P(a)		19.00	P(a)		
		A	19.00	19.00	A		
Administración, seguimiento y evaluación							

Other Cost		2014	Cost
Unidad Coordinadora	P	\$708,000.00	\$3,540,000.00
	P(a)	\$708,000.00	\$3,540,000.00
	A	\$721,272.00	\$1,306,272.00
Auditoría, Monitoreo y Evaluación e Imprevistos	P	\$203,000.00	\$940,000.00
	P(a)	\$29,000.00	\$940,000.00
	A	\$28,775.00	\$28,775.00
Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$9,228,421.00	\$45,000,000.00
	P(a)	\$12,222,200.00	\$32,598,313.00
	A	\$9,689,373.00	\$15,327,373.00

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Provincias beneficiadas con el programa	Create Output	Se acuerda inclusión de indicador para reflejar de mejor manera los resultados del programa.	4/1/2015	4/1/2015
Output	Herramientas y soluciones informáticas de PxR desarrolladas por los 4 ORs implementadas	Modify Physical P(a) value	Revisión de metas con el ejecutor	3/25/2015	3/25/2015

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
