



Operation Number: **AR-L1145**  
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**  
Last Update: **10/6/2016**  
PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/18/2016**  
Division Chief validation date:  
Country Representative validation date:

Inter-American Development Bank - IDB  
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	MSME Competitiveness Support Program	Loan Number:	2923/OC-AR
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA, PRESIDENCIA DE LA NACION		
Team Leader:	Casaburi,Gabriel	Sector/Subsector:	ENTERPRISE DEVELOPMENT, CLUSTERS AND INNOVATION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	ARGENTINA
Borrower:	NACION ARGENTINA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
AR-L1145	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$30,000,000.00		\$80,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
AR-L1145	\$50,000,000.00	\$14,562,659.00	29.13%	\$35,437,341.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

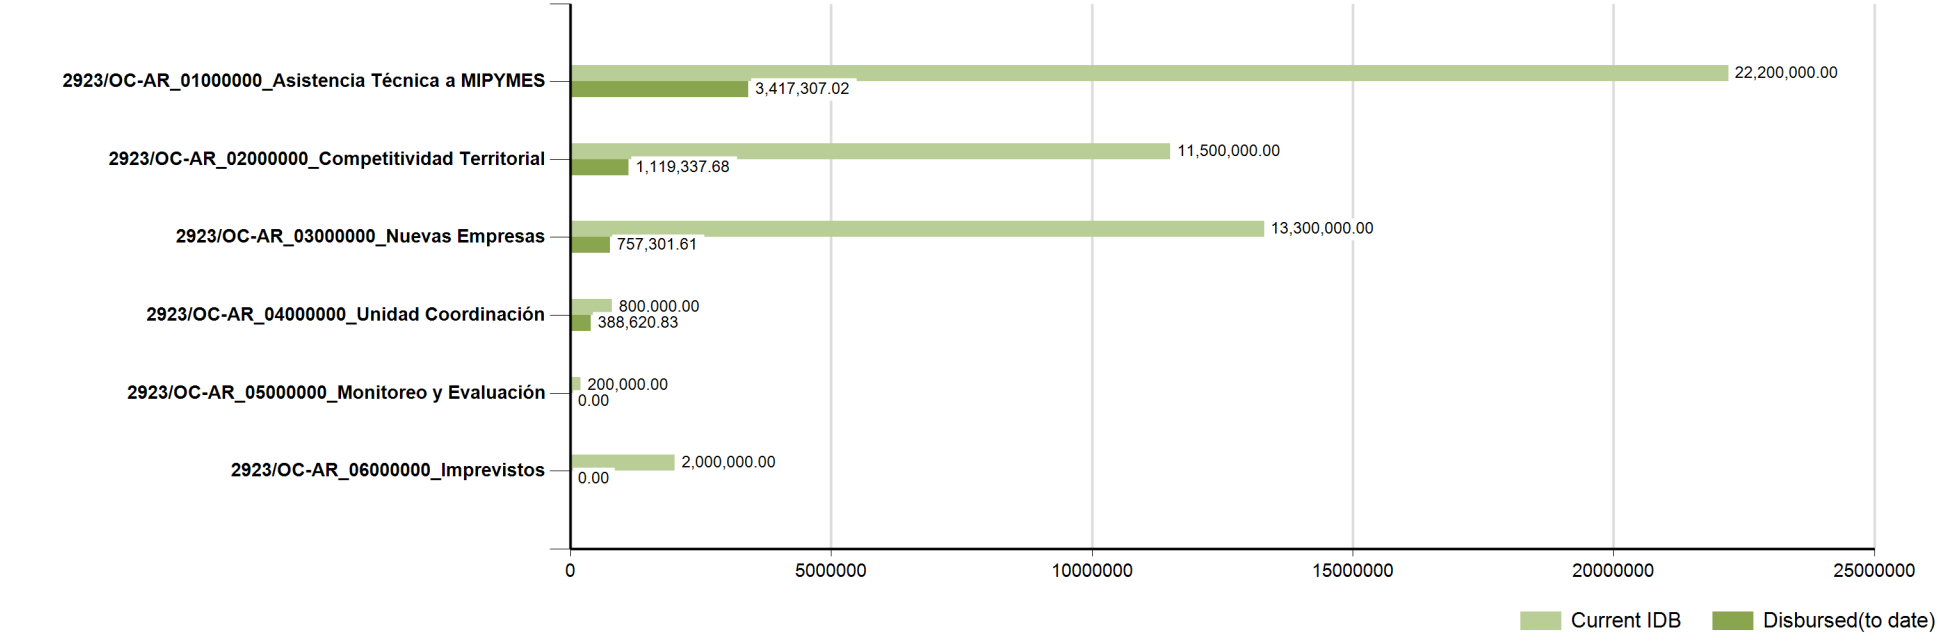

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Productividad de las MIPYMES mejorada							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Diferencia en el cambio porcentual de la productividad total de los factores entre las MIPYMES financiadas por el programa y las no financiadas		Variacion %		2013	Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, entre otros	Linea de base a construir	P	3.00
							P(a)	3.00
							A	
1.2 Diferencia en el cambio porcentual en el empleo entre las MIPYMES financiadas por el programa y las no financiadas		Variacion %		2013	Base de datos del sistema de monitoreo y evaluación del programa, entre otros	Linea de base a construir	P	2.00
							P(a)	2.00
							A	
1.3 Diferencia en el cambio porcentual de facturación entre las MIPYMES financiadas por el programa y las no financiadas		Variacion %		2013	Encuesta a empresas participantes en el programa y al grupo de control, entre otros.	Linea de base a construir	P	5.00
							P(a)	5.00
							A	

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Aumento en la inversión de las MIPYMES en servicios de desarrollo empresarial
Observation:	

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		EOP
1.1 Porcentaje de MIPYMES que invierten en SDE (Diferencia con un grupo de control)			Puntos porcentuales	70.00	2012	Encuesta con empresarios y bases de datos de la SEPYME y del PACC, al principio del programa y al final	Unidad de Medida: Puntos porcentuales de diferencia entre el porcentaje de MIPYMES beneficiarias que compran SDE y el porcentaje de no beneficiarias que también lo hacen	P		55.00
							P(a)		55.00	
		A								
Outcome:	2 Acceso a servicios de desarrollo empresarial de empresas de aglomerados productivos aumentado									
Observation:										
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		EOP
2.1 Número de acciones colectivas de compra de SDE o de mejora de su provisión colectiva territorial			Numero de acciones	0.00	2013	Informes de avance del programa		P	4.00	10.00
							P(a)	4.00	10.00	
		A					0.00			
Outcome:	3 Aumento en el número de empresas creadas y consolidadas									
Observation:										

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		EOP
3.1 Diferencia en la tasa de supervivencia de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas creadas con el apoyo del programa y empresas de un grupo de control			Diferencia %	0.00	2012	Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, entre otros	Unidad de Medida: Diferencia porcentual de la tasa de supervivencia entre las empresas del programa y las del grupo control	P		15.00
							P(a)		15.00	
							A			
Outcome:	4 Aumento del porcentaje de mujeres beneficiarias del programa									
Observation:										
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		EOP
4.1 Porcentaje de mujeres titulares de empresas beneficiarias del programa aumentado			Aumento %	18.00	2012	Informes de avance del programa	Linea de base: Empresas existentes 18% - Emprendedores: 27%	P	2.00	5.00
							P(a)	2.00	5.00	
							A	0.00		
Outcome:	5 Aumento de la participación de empresas de provincias del Norte Grande como beneficiarios del programa									
Observation:										
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		EOP
5.1 Porcentaje de empresas beneficiarias de las Provincias del Norte Grande (NG) sobre el total de las empresas beneficiarias aumentado			Aumento %	5.00	2012	Informes de avance del programa		P		6.50
							P(a)		6.50	
							A			

 RF - Contribution
  RF - Alignment
  RF - Strategic Alignment
  RF - Strategic Alignment during Execution

 SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Asistencia Técnica a MIPYMES		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Empresas asistidas técnicamente (supone haber finalizado al menos una actividad)	Micro / small / medium enterprises (#)	P	300.00	1,500.00	P	7,400,000.00	37,600,000.00
		P(a)	300.00	1,500.00	P(a)	6,700,000.00	37,600,000.00
		A	321.00	497.00	A	2,915,000.00	4,989,000.00
Articulación Productiva y Competitividad Territorial		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Aglomerados maduros asistidos (supone haber finalizado al menos una actividad)	Número de aglomerados	P	2.00	7.00	P	3,000,000.00	11,100,000.00
		P(a)	2.00	7.00	P(a)	2,300,000.00	10,870,203.00
		A	0.00	2.00	A	88,900.00	997,103.00
Aglomerados incipientes asistidos (supone haber finalizado al menos un componente con todas sus actividades)	Número de aglomerados	P	4.00	9.00	P	1,200,000.00	3,600,000.00
		P(a)	4.00	9.00	P(a)	1,600,000.00	3,829,797.00
		A	0.00	2.00	A	0.00	229,797.00
Instituciones de la Plataforma Territorial Asistidas (supone al menos la mitad de las actividades finalizadas)	Número de Instituciones	P	10.00	20.00	P	800,000.00	1,640,000.00
		P(a)	10.00	20.00	P(a)	100,000.00	1,640,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Apoyo a Nuevas Empresas		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Emprendedores y empresas jóvenes asistidas (supone que la UE haya aprobado la primera rendición del proyecto)	Número de emprendedores y empresas jóvenes	P	100.00	400.00	P	3,300,000.00	12,000,000.00
		P(a)	61.00	400.00	P(a)	3,000,000.00	12,000,000.00
		A	61.00	140.00	A	343,400.00	1,056,400.00
Acciones de fomento y servicios de apoyo al desarrollo emprendedor financiadas	Número de acciones	P	7.00	30.00	P	400,000.00	1,710,000.00
		P(a)	7.00	30.00	P(a)	300,000.00	1,710,000.00
		A	3.00	7.00	A	5,700.00	308,700.00
Número de Instituciones especializadas asistidas (supone al menos la mitad de las actividades finalizadas)	Número de Instituciones	P	10.00	25.00	P	1,550,000.00	3,900,000.00
		P(a)	10.00	25.00	P(a)	1,000,000.00	3,900,000.00
		A	1.00	1.00	A	0.00	0.00
Talleres y otras acciones de fomento del rol de la mujer emprendedora realizadas	Número de actividades	P	2.00	9.00	P	100,000.00	450,000.00
		P(a)	2.00	9.00	P(a)	100,000.00	450,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Administración							

Other Cost		2016	Cost
Administración	P	\$1,600,000.00	\$8,000,000.00
	P(a)	\$1,240,000.00	\$8,000,000.00
	A	\$80,800.00	\$468,800.00
Total Cost		2016	Total Cost
	P	\$19,350,000.00	\$80,000,000.00
	P(a)	\$16,340,000.00	\$80,000,000.00
	A	\$3,433,800.00	\$8,049,800.00

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
