


PMR Public Report

Operation Number	BR-L1376	Chief of Operations Validation Date	04/07/22
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2021	Division Chief Validation Date	04/11/22
Last Update	04/06/22	Country Representative Validation Date	04/19/22
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Strengthening health management in the State of São Paulo	Loan Number	3051/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO SÃO PAULO	Sector/Subsector	HEALTH-HEALTH SYSTEM STRENGTHENING
Team Leader	ROCHA, MARCIA GOMES	Overall Stage	Fully Disbursed
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADO DO SAO PAULO		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
BR-L1376	270,000,000	269,069,687	110,000,000	0	380,000,000	269,069,687	269,069,686.83	100.00%	-
Aggregated	270,000,000	269,069,687	110,000,000	0	380,000,000	269,069,687	269,069,686.83	0.00%	-

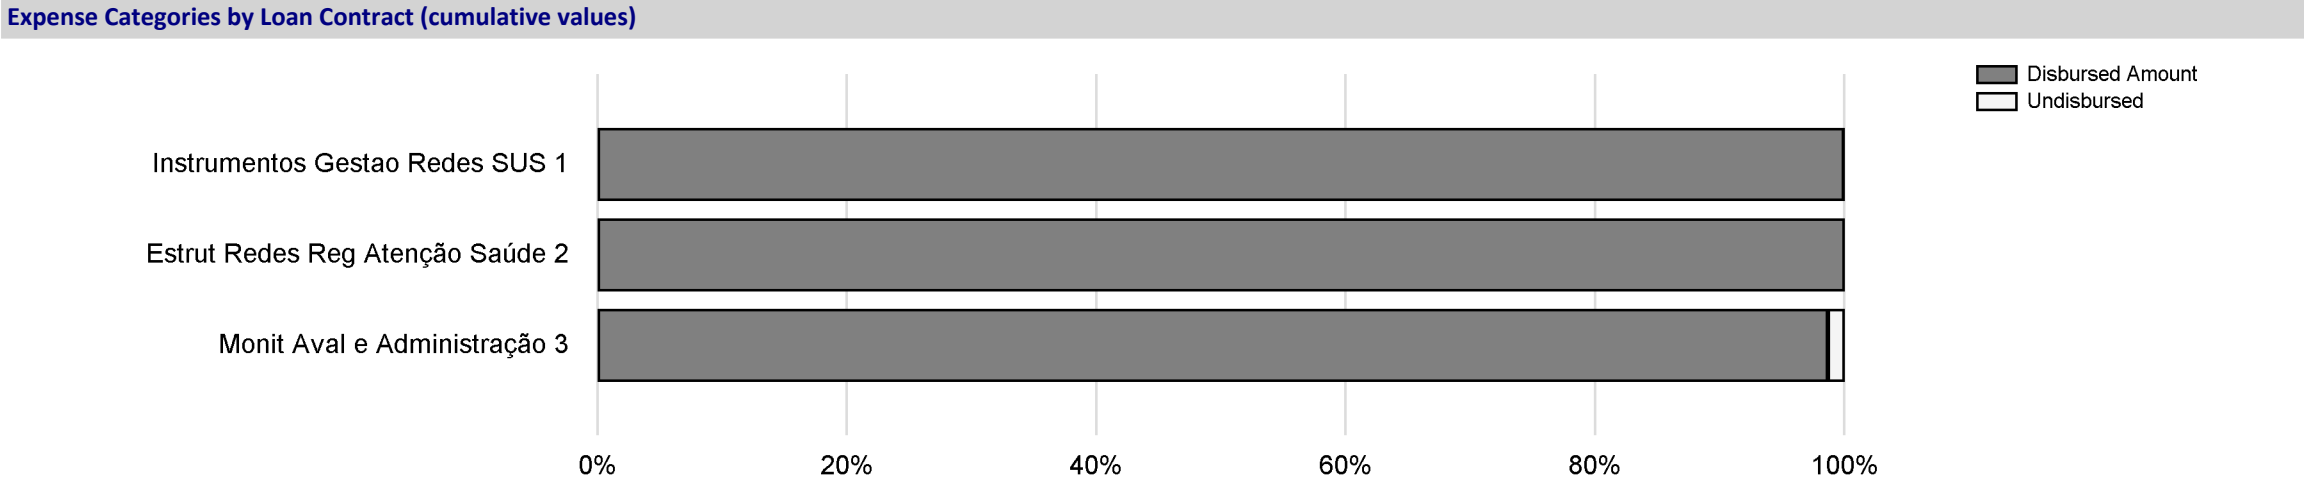

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Condições de Saúde da População do Estado de São Paulo melhoradas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2021	
0.1	Mortalidade por enfermidades crônicas não transmissíveis por 100.000 habitantes	por 100.000 hab	308.6	2014	2022	P	291.08
						A	-
Details							

Means of Verification: Capitulo II y Capitulo IX da classificação internacional de enfermidades (cid 10)

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
		Homens				P	-
						A	-
		Mulheres				P	-
						A	-

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2021	
0.2	Mortes prematuras por diabetes mellitus	percentual	19	2014	2022	P	16.5
						A	-
Details							

Means of Verification: SEADE/DATASUS

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
		Homens				P	-
						A	-
		Mulheres				P	-
						A	-

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2021	
0.3	Mortes prematuras por accidentes cardiovasculares	percentual	13.8	2014	2022	P	11.7
						A	-
Details							

Means of Verification: SEADE/DATASUS

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
		Homens				P	-

		Homens					A	-
		Mulheres					P	-
							A	-
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2021	
0.3	Taxa de internações sensíveis à atenção básica	percentual	20.1	2014	2022	P	11.7	
						A	-	
Details								

Means of Verification: DATASUS

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
		Homens				P	-
						A	-
		Mulheres				P	-
						A	-

RESULTS MATRIX														
Specific Development Objectives														
Specific Development Objectives Nbr. 0: Serviços de Saúde seguindo o modelo de redes estruturados														
Observation:														
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.0	Índice sobre produção em Unidades Basicas de Saúde (consultas e outros serviços de saúde no municípios priorizados)	Percentual	100	2014	P	100	105	105	110	120	-	-	-	120
					A	100	-	-	-	-	-	104	-	-
Details														
Means of Verification: Valor indice 2012=100, fonte DATASUS														
Observations:														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.1	Índice de consultas em CAP's nos municípios priorizados	Percentual	100	2014	P	100	100	110	130	150	-	-	-	150
					A	100	-	-	-	-	-	141	-	-
Details														
Means of Verification: Valor indice 2012=100, fonte DATASUS														
Observations:														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.2	Índice de Eficiencia em Regulação de CRG's	Percentual	100	2014	P	100	100	105	110	115	-	-	-	115
					A	-	-	-	-	-	-	124.53	-	-
Details														
Means of Verification: valor a ser definido na missao de arranque														
Observations:														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.3	Eventos eletivos incorporados nas CRG's	Percentual	20	2014	P	20	25	30	40	50	-	-	-	50
					A	-	-	-	-	-	-	41	-	-
Details														
Means of Verification: dado a ser verificado na missao de arranque nas DRS														
Observations:														
Evaluation Methodology: -														
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator										

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.4	Beneficiários que recebem serviços de saúde	# of beneficiaries	539550	2016	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	-	1,524,687	-	2,865,105	-	4,389,792
Details														

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.2 Beneficiaries receiving health services (#) (C)

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 C1: Subcomponente 1.A: Fortalecimento da Gestão em nível Estatal (Foco SES/SUS)

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2021	2021	EOP 2021
1.01	Produto 01: Estudos Estratégicos de fortalecimento de SES/SP aprovados	Estudos	P	-	5	-	1,896,682
			P (a)	-	3	-	457,710.69
			A	-	3	-	457,710.69
1.02	Produto 03: Núcleo Estratégico Central de Gestão da SES implementado e em funcionamento	Núcleo	P	-	1	-	189,018
			P (a)	1	1	2,519,524.4	3,880,828.37
			A	1	1	613,207.52	1,974,511.49
1.03	Produto 04: Modelo de Gestão de Redes (Regulação SUS/SP) elaborado	Modelo	P	-	1	-	1,545,972
			P (a)	-	1	-	1,114,182.88
			A	-	1	22,731.28	1,154,861.86
1.04	Produto 05: Plano de Educação permanente, desenvolvido	Plano	P	-	1	-	826,119
			P (a)	-	1	-	462,408.21
			A	-	1	-	462,408.21

Component Nbr. 2 C1: Subcomponente 1.B: Fortalecimento da Gestão para a melhora da qualidade de atenção a Saúde seguindo o modelo de redes regionais

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2021	2021	EOP 2021
2.01	Produto 06: Sistemas de apoio operativo na Redes Regionais de atenção a saude fortalecidos	Sistema	P	-	1	-	27,993,704
			P (a)	-	8	-	7,372,177.82
			A	-	8	50,555.04	7,856,863.5
2.02	Produto 07: Linhas de Cuidado formuladas, divulgadas e implantadas	Linhas de Cuidado	P	-	5	-	7,245,498
			P (a)	-	3	-	1,218,058.31
			A	-	3	5,525.71	1,457,714.23
2.03	Produto 09: Capacitações para os profissionais da SUS/SP realizadas	Profissional	P	-	5,300	-	3,289,100
			P (a)	-	4,636	-	1,247,579.86
			A	-	5,428	282,175.31	2,253,822.3

Component Nbr. 3 C2: Subcomponente 2A: Apoio as RAS nas Microregionais Selecionadas

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2021	2021	EOP 2021
3.01	Produto 10 : Projetos Executivos de engenharia para obras novas elaborados	Projetos	P	-	81	-	4,684,834
			P (a)	-	112	-	2,110,155.81
			A	-	112	41,542.98	2,213,237.29
3.02	Produto 11: Projetos executivos de engenharia para reformas elaborados	Projetos	P	-	70	-	4,684,834
			P (a)	-	10	-	491,132.93
			A	-	10	-	494,712.03
3.03	Produto 12: Unidades Básicas de Saúde (UBS) Contruidas e em funcionamento	UBS	P	-	40	-	40,988,815
			P (a)	-	38	-	35,252,192.52
			A	-	38	221,216.62	35,535,707.98
3.04	Produto 13: Unidades Básicas de Saúde (UBS) reformadas e/ou ampliadas em funcionamento	UBS	P	-	16	-	7,097,630
			P (a)	2	22	2,271,737.16	4,722,403.88
			A	2	22	129,187.23	2,579,853.95
3.05	Produto 14: Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) Vale do Ribeira construído e em funcionamento	CAPS	P	-	2	-	2,732,588

3.05	Produto 14: Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) Vale do Ribeira construído e em funcionamento	CAPS	P (a)	1	2	2,025,685.52	3,340,945.42
			A	1	2	155,156.77	1,470,416.67
3.06	Produto 15: Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) construídos e em funcionamento	CAPS	P	-	2	-	5,855,545
			P (a)	-	13	-	10,161,631.03
			A	-	13	19,690.12	10,037,747.78
3.07	Produto 16: Unidades Hospitalares novas construídas e em funcionamento	Hospital	P	-	2	-	148,640,758
			P (a)	1	4	-	148,431,835.11
			A	1	4	1,450,182.71	145,981,046.25
3.08	Produto 17: Unidades Hospitalares de referência Regional reformadas conforme modelo de redes em funcionamento	Hospital	P	-	3	-	7,347,868
			P (a)	1	5	-	1,637,986.58
			A	-	4	10,241.94	2,018,056.19
3.09	Produto 18: Ambulatório Médico de Especialidades implementado e em funcionamento (AME Avaré)	Ambulatório	P	-	1	-	2,661,612
			P (a)	-	-	-	5,157,762.13
			A	-	1	106,299.94	6,328,909.39
3.10	Produto 19: Diretorias Regionais de Saúde (DRS) construídas (Vale do Ribeira e Jurimirim)	DRS	P	-	1	-	3,948,019
			P (a)	-	1	-	4,060,496.03
			A	-	1	-	4,061,070.7
3.11	Produto 20: Diretorias Regionais de Saúde (DRS) reformadas e equipadas	DRS	P	-	3	-	11,381,674
			P (a)	-	3	-	4,032,548.17
			A	-	1	-	3,003,304.6
3.12	Produto 35: Implantação do Plano de Transporte Sanitário na Região de Itapeva	Piloto	P	-	-	-	-
			P (a)	-	1	-	2,569,159.27
			A	-	1	-	1,252,472.69
3.13	Produto 36: Informatização das Redes de Atenção à Saúde do Estado de São Paulo	Equipamentos	P	-	-	-	-
			P (a)	-	9,265	-	2,701,237.6
			A	-	5,249	-	1,663,265.55
3.14	Produto 37: Monitoramento das Redes de Atenção à Saúde do Estado de São Paulo	Equipamentos	P	-	-	-	-
			P (a)	-	1	-	680,614.48
			A	-	1	3,756.95	96,233.37
3.15	Produto 38: Municípios do Vale do Ribeira equipados com veículos para o combate ao COVID 19	municípios	P	-	-	-	-
			P (a)	-	25	-	-
			A	-	25	-	596,071.08
3.16	Produto 39: Ambulatório Médico de especialidades (AME) Taubaté equipado para combate ao COVID 19	Ambulatório Médico	P	-	-	-	-
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	1	-	568,335.56
3.17	Produto 40: Estabelecimentos de saúde do Estado equipados para combate ao COVID 19	Estabelecimento de saúde	P	-	-	-	-
			P (a)	-	21	-	-
			A	-	21	1,496,122.35	3,502,699.66
3.18	Produto 41:Unidades de saúde que receberam materiais e equipamentos para apoio ao combate ao COVID 19	Unidade de Saúde	P	-	-	-	-
			P (a)	-	220	-	-
			A	-	220	1,182,252.45	9,018,283.39

Component Nbr. 4 C2: Subcomponente 2B: Apoio as RAS na Região Metropolitana de Campinas (RMC)

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2021	2021	EOP 2021
4.01	Produto 23: Unidades Básicas de Saúde (UBS) construídas e em funcionamento	UBS	P	-	30	-	29,277,725
			P (a)	-	48	-	45,422,539.89
			A	-	48	12,999.35	45,087,122.43
4.02	Produto 24: Unidades Básicas de Saúde (UBS) reformadas e/ou ampliadas em funcionamento	UBS	P	-	38	-	16,856,872
			P (a)	-	12	-	5,588,364.94
			A	-	17	1,024.93	6,227,164.58
4.03	Produto 25: Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) novos construídos e em funcionamento	CAPS	P	-	5	-	8,588,133
			P (a)	-	6	-	4,463,249.03
			A	-	6	3,323.61	4,531,501.07
4.04	Produto 26: Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) reformados e ampliados em funcionamento	CAPS	P	-	8	-	5,766,824
			P (a)	-	-	-	524,375.22
			A	-	3	7,124.32	766,913.87
4.05	Produto 27: Diretoria Regional de Saúde reformada e equipadas	DRS	P	-	1	-	4,913,716
			P (a)	-	1	-	4,995,802.48
			A	-	1	-	4,995,802.48
4.06	Produto 33: Ambulatório de Especialidades Médicas (AME) Campinas construído e em funcionamento	Ambulatorio	P	-	-	-	-
			P (a)	-	1	-	11,137,776.32
			A	-	1	6,530.22	12,604,042.3
4.07	Produto 34: Unidades Hospitalares novas construídas e em funcionamento	Hospital	P	-	-	-	-
			P (a)	-	1	-	47,093,091.16
			A	-	1	-	40,982,996

Component Nbr. 5 C3: Subcomponente 3A: Gerenciamento e Supervisão de Obras

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2021	2021	EOP 2021
5.01	Produto 29: Empresa de Apoio ao Gerenciamento do Projeto e Supervisão das Obras em funcionamento	Gerenciadora	P	-	1	-	19,661,354
			P (a)	1	1	1,987,040.52	18,753,824.26
			A	1	1	1,298,313.75	18,065,097.49

Component Nbr. 6 C3: Subcomponente 3B: Auditoria, Monitoramento e Avaliação

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2021	EOP 2021	2021	EOP 2021
6.01	Produto 31: Avaliações do Programa realizadas	Relatorios	P	-	3	-	1,413,270
			P (a)	2	3	150,709.54	363,586.74
			A	2	3	52,652.93	265,530.13

Other Cost				
	Produto 30: Unidade de Coordenação do Projeto em funcionamento	P		587,678
		P (a)		382,618.35
		A	0	382,618.35
	Produto 32: Auditoria independente do Programa realizada	P		394,313
		P (a)	38,253.71	163,740.57
		A	37,761.42	163,248.28
Total Cost				
	Total Cost	P		380,000,000

	Total Cost	P (a)	8,992,950.85	380,000,000
		A	7,209,575.45	380,119,337.33

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Inactive		Internal Processes
	Response Actions		
	2.0	Management Strategy	Status
		-	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Inactive		Political Environment
	Response Actions		
	4.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
	4.2	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE
	4.3	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE
	4.4	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
	4.5	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
	4.6	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
	4.7	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
	4.8	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
	4.9	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Inactive		Political Environment
	Response Actions		
	5.0	Management Strategy	Status
		-	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Legal aspects and public processes
Project Monitoring & Evaluation
