



Operation Number: **BR-L1287**
Year- PMR Cycle: **Primer período enero-junio 2014**
Last Update: **10/30/2014**
PMR Validation Stage: **Validada por el Representante de País**

Chief of Operations validation date: **10/31/2014**
Division Chief validation date: **10/31/2014**
Country Representative validation date: **11/02/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Programa de Inclusión Social y Oportunidades para la Juventud en Rio de Janeiro	Loan Number:	2762/OC-BR
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREI TOS HUMANOS		
Team Leader:	Sorio,Rita Elizabeth	Sector/Subsector:	YOUTH AT RISK
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Desembolso (De la elegibilidad hasta que todos los préstamos están cerrados).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1287	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$24,550,000.00	\$0.00	\$84,550,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1287	\$60,000,000.00	\$4,596,700.55	7.66%	\$55,403,299.45


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

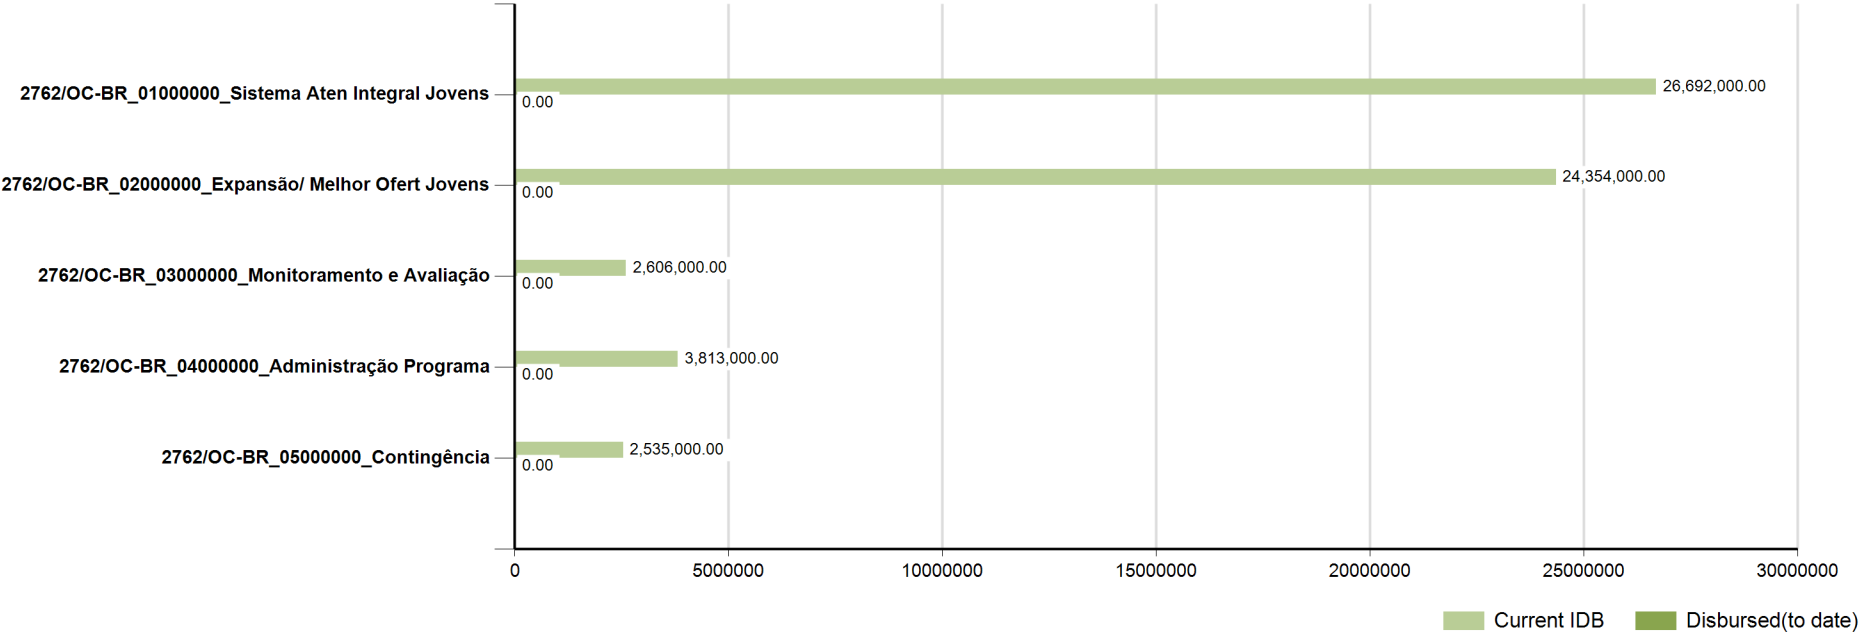

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Condições de vida dos jovens que vivem em favelas com Unidades de Polícia Pacificadora (UPP's) melhoradas.							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Diferença entre a incidencia de gravidez em jovens de favelas atendidas pelo Programa e em jovens de favelas não atendidas pelo programa.		%	0.00	2013	Sistema de Registro e Monitorament o do Programa. Avaliação de Impacto		P	6.00
							P(a)	6.00
							A	
1.2 Diferença entre a taxa de inatividade dos jovens atendidos pelo programa e dos jovens de favelas não atendidas pelo programa.		%	0.00	2013	Sistema de Registro e Monitorament o do Programa. Avaliação de Impacto.		P	15.00
							P(a)	15.00
							A	
1.3 Diferença entre a escala de autoeficiencia percebida dos jovens de favelas atendidas pelo programa e dos jovens de favelas não atendidas pelo programa		%	0.00	2013	Sistema de Registro e Monitorament o do Programa. Avaliação de Impacto. Pesquisa de seguimento. Escada de Autoeficiencia percebida (EAP).	Escala de Auto Eficiencia Percebida - Instrumento de multiplos itens que mede a confiança para desenvolver-se perante situações da viada cotidiana. Ver Plano de Monitorament o e Avaliação do Documento de Projeto (POD) BR-L 1287.	P	20.00
							P(a)	20.00
							A	
1.4 Porcentagem de entrevistados nas areas de intervenção do programa que informam estar satisfeitos com o comportamento e participação dos jovens na comunidade.		%	0.00	2013	Pesquisa de Satisfação da População de Comunidades que conta com o Programa.		P	70.00
							P(a)	70.00
							A	

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outco me:	1 Qualidade dos serviços de atenção integral aos jovens
Observ ation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013		2014	2015	2016	EOP
1.1 Jovens atendidos pelo programa que cumprem com os objetivos do seu plano de trabalho.		Percentual	0.00	2013	Sistema de Registro e Monitoramento do Programa		P					70.00
							P(a)					70.00
	A											
1.2 Jovens inativos que retornam ao sistema educativo ou ingressam no mercado de trabalho.		Percentual	0.00	2013	Sistema de Registro e Monitoramento do Programa.		P					70.00
							P(a)					70.00
	A											
1.3 Jovens que retomam seus estudos e concluem seu ano escolar (se graduam e recebem certificação).		Percentual	0.00	2013	Sistema de Registro e Monitoramento do Programa		P					50.00
							P(a)					50.00
	A											
1.4 Jovens matriculados em curso de qualificação profissional que recebem uma certificação.		Percentual	0.00	2013	Sistema de Registro e Monitoramento do Programa		P					85.00
							P(a)					85.00
	A											
1.5 Jovens que finalizam o processo de tutoria e aconselhamento.		Percentual	0.00	2013	Sistema de Registro e Monitoramento do Programa		P					85.00
							P(a)					85.00
	A											
1.6 Jovens egressos dos cursos de formação profissional oferecidos pelo programa que conseguem um posto de trabalho		Percentual	0.00	2013	Sistema de registro e Monitoramento do Programa		P					40.00
							P(a)					40.00
	A											
1.7 Taxa de deserção escolar de mulheres grávidas e mães adolescentes.		Percentual	78.00	2013	Sistema de Registro e Monitoramento do Programa. Estatísticas setoriais da Secretaria Estadual da Educação.		P					40.00
							P(a)					40.00
	A											
1.8 Jovens em cumprimento de medidas socioeducativas que recebem acompanhamento de tutores.		Percentual	0.00	2013	Sistema de Registro e Monitoramento do Programa		P					60.00
							P(a)					60.00
	A											

1.9 Jovens que cumprem penas alternativas ou que estão saindo da prisao e que recebem aconselhament o profissional ou apoio de tutores.		Percentual	0.00	2013	Sistema de Registro e Monitoram ento do Programa		P					60.00
							P(a)					60.00
							A					
1.10 Jovens que participam em processos de aconselhament o ou tutoria que demandam acesso a oferta das Secretarias parceiras e tem acesso a oferta preferente		Percentual	0.00	2013	Sistema de Registro e Monitoram ento do Programa		P	60.00	70.00	80.00	90.00	90.00
							P(a)	60.00	70.00	80.00	90.00	90.00
							A					

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Sistema de atenção integral a jovens		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Produto 3: Sistema de identificação dos casos prioritarios em funcionamento	Sistema	P	1.00	1.00	P	256,000.00	710,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	256,000.00	587,000.00
		A	0.00	0.00	A	228,000.00	273,000.00
Serviço de Aconselhamento e Tutoria para Jovens		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Produto 5: Unidades Territoriais para a atenção dos Jovens em funcionamento	Unidades Territoriais	P	12.00	67.00	P	1,471,000.00	9,127,000.00
		P(a)	12.00	64.00	P(a)	1,471,000.00	9,088,000.00
		A	5.00	7.00	A	345,000.00	648,000.00
Produto 6: Profissionais capacitados para trabalhar com os jovens do Programa	Pessoa	P	150.00	700.00	P	68,000.00	1,438,000.00
		P(a)	150.00	727.00	P(a)	68,000.00	1,372,000.00
		A	110.00	287.00	A	19,000.00	120,000.00
Produto 7: Jovens atendidos pelo Sistema de Atenção Integral (sem tutoria) com aconselhamento	Jovens	P	6,600.00	34,200.00	P	2,165,000.00	19,919,000.00
		P(a)	840.00	27,939.00	P(a)	489,000.00	18,201,000.00
		A	815.00	914.00	A	191,000.00	357,000.00
Produto 8: Novos jovens atendidos pelo Sistema de Atenção Integral na modalidade de Tutoria	Jovens	P	645.00	3,390.00	P	850,000.00	7,124,000.00
		P(a)	198.00	2,830.00	P(a)	850,000.00	7,129,000.00
		A	44.00	51.00	A	124,000.00	249,000.00
Expansao e Melhoria da Oferta de Oportunidades para Jovens		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Produto 10: Vagas disponiveis nos programas de formação profissional para jovens em aconselhamento ou tutoria	Vagas	P	700.00	2,550.00	P	348,000.00	1,807,000.00
		P(a)	700.00	2,200.00	P(a)	348,000.00	1,629,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Produto 11: Vagas disponiveis nos programas de Educação para jovens em aconselhamento ou tutoria	Vagas	P	1,757.00	6,396.00	P	1,963,000.00	8,434,000.00
		P(a)	1,757.00	5,646.00	P(a)	1,963,000.00	7,754,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Produto 12: Vagas disponíveis para atendimento em serviços de prevenção, tratamento ou reabilitação de álcool e drogas	Vagas	P	600.00	3,100.00	P		1,507,000.00
		P(a)	0.00	2,500.00	P(a)		1,507,000.00
		A	550.00	550.00	A	0.00	0.00
Produto 13: Vagas disponíveis em programas culturais, esportivos e de recreação	Vagas	P	1,273.00	5,092.00	P	771,000.00	3,916,000.00
		P(a)	1,750.00	4,819.00	P(a)	771,000.00	3,103,000.00
		A	1,605.00	1,605.00	A	0.00	0.00
Produto 14: Unidades de Saúde contruidas	Unidades	P		3.00	P	0.00	6,076,000.00
		P(a)		3.00	P(a)	0.00	6,076,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Produto 15: Jovens que demandam e são encaminhados a atendimento de saúde em educação sexual, direitos sexuais e reprodutivos, acompanhamento pré-natal e outros.	jovenes	P	2,400.00	12,600.00	P	900,000.00	5,294,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	900,000.00	4,596,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Produto 16: Unidades para Juventude construidas	unidades	P		13.00	P	2,319,000.00	6,709,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A			A		
Produto 17: Unidades para Juventude reformadas	unidades	P	7.00	12.00	P	1,645,000.00	2,562,000.00
		P(a)	7.00	7.00	P(a)	1,645,000.00	1,645,000.00
		A	6.00	6.00	A	0.00	0.00
Monitoramento e avaliação		Physical Progress			Financial Progress		

Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Produto 19: Gestores de políticas públicas e programas para os jovens participantes das atividades de conhecimento capacitados levadas a cabo pelo programa (socialiação de resultados de estudos e pesquisas)	Pessoa	P	411.00	1,864.00	P	42,000.00	200,000.00
		P(a)	411.00	1,864.00	P(a)	42,000.00	200,000.00
		A	415.00	415.00	A	0.00	0.00
Produto 20: Pesquisas e estudos com os jovens nos territórios cobertos difundidas e publicadas ao mínimo na Web	Estudo	P	2.00	8.00	P	68,000.00	616,000.00
		P(a)	2.00	6.00	P(a)	68,000.00	523,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Produto 21: Sistema de indicadores de acompanhamento e avaliação dos resultados do programa implementado	Sistema	P	1.00	1.00	P	382,000.00	1,790,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	382,000.00	1,752,000.00
		A	1.00	1.00	A	0.00	0.00

Other Cost		2014	Cost
Custo de Administração	P	\$1,316,000.00	\$4,191,000.00
	P(a)	\$1,316,000.00	\$3,680,000.00
	A	\$0.00	\$221,000.00
Auditoria	P	\$65,000.00	\$270,000.00
	P(a)	\$65,000.00	\$238,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
Contingencia	P	\$0.00	\$2,535,000.00
	P(a)	\$0.00	\$8,761,000.00
	A		\$0.00
Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$14,629,000.00	\$84,225,000.00
	P(a)	\$10,634,000.00	\$34,913,000.00
	A	\$907,000.00	\$1,868,000.00

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
