



Operation Number: **BR-L1252**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2015**
Last Update: **10/7/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/14/2015**
Division Chief validation date: **10/29/2015**
Country Representative validation date: **11/08/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	National Prog. to Support the Adm. and Fiscal Manag Brazilian Municipios-PNAFM	Loan Number:	2248/OC-BR
Executing Agency (EA):	SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA FA ZENDA		
Team Leader:	Dezolt,Ana Lucia Paiva	Sector/Subsector:	FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1252	\$150,000,000.00	\$150,000,000.00	\$16,600,000.00	\$0.00	\$166,600,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1252	\$150,000,000.00	\$106,310,000.00	70.87%	\$43,690,000.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

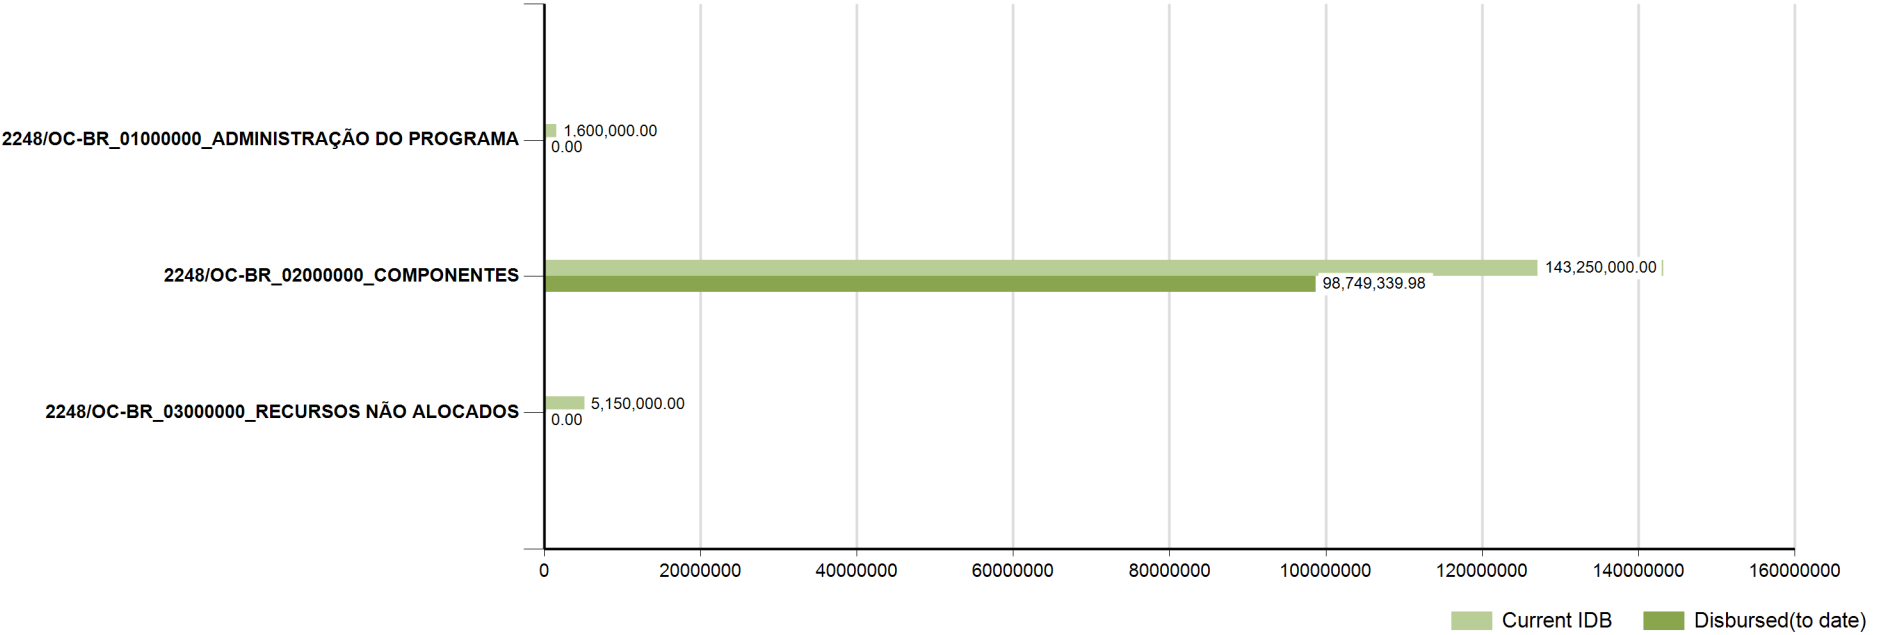

Results Matrix

Impacts

No information related to this operation.

Outcomes

Outcome:	1 R1 - Projetos de subempréstimos municipais contratados.													
Observation:														
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010	2011	2012	2013	2014	2015	EOP	
1.1 subempréstimo contratados.		contratos	0.00	2009	Relatório Semestral de Progresso		P						6.00	
							P(a)	2.00	4.00				12.00	
							A	5.00	8.00	22.00		0.00	0.00	
Outcome:	2 R2 -Recursos financeiros comprometidos mediante contratos de subempréstimos													
Observation:														
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010	2011	2012	2013	2014	2015	EOP	
2.1 Volume de recursos comprometidos		US\$ milhões	0.00	2009	Relatório Semestral de Progresso		P						106.80	
							P(a)							106.80
							A		93,677,633.00	147,910,339.00		0.00	0.00	
Outcome:	3 R3 - Eventos de difusão de melhores práticas incorporados em Banco de Mejores practicas.													
Observation:														
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010	2011	2012	2013	2014	2015	EOP	
3.1 Quantidade de eventos de avaliação e difusão incluídos no Banco de Melhores Práticas.		eventos	0.00	2009	Relatório Semestral de Progresso		P						2.00	
							P(a)							2.00
							A	2.00	2.00	8.00	12.00	13.00	0.00	
Outcome:	4 R4 - Uso do Ensino a Distância (EAD) ampliado.													
Observation:														
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010	2011	2012	2013	2014	2015	EOP	
4.1 Replicações dos cursos pilotos de EAD desenvolvidas.		replicações	0.00	2009	Relatório Semestral de Progresso		P						2.00	
							P(a)							2.00
							A	2.00	0.00	4.00		4.00	0.00	
Outcome:	5 R5 - Potencial de receita própria dos municípios participantes da 2ª fase do Programa identificados.													

Outco 5 R5 - Potencial de receita própria dos municípios participantes da 2ª fase do Programa identificados.

Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010	2011	2012	2013	2014	2015	EOP
5.1 município com potencial de receita própria identificados.		município	0.00	2009	Relatório Semestral de Progresso		P						50.00
							P(a)						11.00
							A		5.00	18.00		0.00	0.00
Outcome:	6 R6 - Linha de base para os 4 eixos estruturadores do Programa definida: atenção ao cidadão, administração tributária, gestão do cadastro de contribuintes e administração orçamentária e financeira es medida de manera independente por los municipios												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010	2011	2012	2013	2014	2015	EOP
6.1 municípios participante do Programa com diagnóstico de linha de base dos eixos estruturadores realizado.		município	0.00	2009	Relatório Semestral de Progresso		P						50.00
							P(a)						11.00
							A	5.00	8.00	18.00		0.00	0.00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

COMPONENTE I - COORDINACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA NACIONAL		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Projetos de fortalecimento institucional municipal apoiados em sua elaboração e revisão	projetos	P	10.00	78.00	P	12,111.98	276,559.86
		P(a)	7.00	152.00	P(a)	215,223.95	276,559.86
		A	4.00	146.00	A	215,223.95	276,559.86
Governo - Municípios apoiados para contratação de operações de crédito	Governments	P	1.00	12.00	P	2,424.65	195,123.17
		P(a)		49.00	P(a)	159,273.91	195,123.17
		A	0.00	49.00	A	159,273.91	195,123.17
Governo - Municípios apoiados na gestão dos respectivos projetos, envolvendo monitoramento e avaliação / Indicador: visitas técnicas de supervisão realizadas duranre a 2a fase do PNAFM	Governments	P	30.00	30.00	P	286,173.11	2,058,865.63
		P(a)	5.00	138.00	P(a)	843,204.00	2,058,896.50
		A	2.00	132.00	A	843,204.00	2,058,896.50
Banco de melhores práticas na área fiscal criado. / Indicador: eventos realizados para a difusão do Banco de Melhores práticas	eventos	P	1.00	1.00	P	179,780.00	1,138,930.00
		P(a)	5.00	28.00	P(a)	440,992.00	1,138,930.00
		A	2.00	22.00	A	440,992.00	1,138,930.00
Convênios e acordos de cooperação celebrados, tanto no âmbito nacional quanto no internacional	convênios	P	1.00	1.00	P	39,896.64	239,379.84
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	159,586.64	279,276.56
		A	1.00	1.00	A	159,586.64	279,276.56
Conferência técnica e estudos, no âmbito nacional e internacional, realizados.	conferência	P	1.00	1.00	P	72,213.75	433,068.35
		P(a)	1.00	8.00	P(a)	273,639.05	433,068.00
		A	1.00	8.00	A	273,639.05	433,068.00
Plano de Comunicação interna e externa elaborado, incluindo mecanismos de transparência e comunicação com a sociedade.	plano	P	1.00	1.00	P	135,021.55	810,129.20
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	540,086.83	810,129.89
		A	1.00	1.00	A	540,086.83	810,129.89
Piloto de Polo de modernização regional implantado.	Piloto	P	1.00	1.00	P	195,005.16	1,170,031.01
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	780,021.17	975,026.34
		A	1.00	1.00	A	780,021.17	975,026.34
Curso de EAD implantados.	cursos	P	1.00	2.00	P	2,574,885.38	9,389,427.02
		P(a)	5.00	13.00	P(a)	5,000,000.00	8,394,651.23
		A	3.00	9.00	A	2,000,000.00	5,394,651.23
Reunião de avaliação das ações do Programa realizadas.	reuniões	P	1.00	1.00	P	150,219.63	888,677.84
		P(a)	5.00	23.00	P(a)	485,438.30	842,370.92
		A	3.00	19.00	A	388,402.45	745,335.07
COMPONENTE II - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Projetos municipais implantados.	projetos	P	0.00	10.00	P	31,954,000.00	142,500,268.23
		P(a)	3.00	34.00	P(a)	42,050,716.15	143,695,967.53
		A	1.00	30.00	A	3,000,000.00	104,645,251.38
Outros							

Other Cost			2015	Cost
Administração do Programa.	P		\$533,320.00	\$1,333,330.00
	P(a)		\$1,600,000.00	\$1,600,000.00
	A		\$0.00	\$0.00
Imprevistos.	P		\$3,900,000.00	\$5,900,000.00
	P(a)		\$5,900,000.00	\$5,900,000.00
	A		\$0.00	\$0.00

Total Cost		2015	Total Cost
	P	\$40,035,051.85	\$166,333,790.15
	P(a)	\$58,448,182.00	\$116,952,248.00
	A	\$8,800,430.00	\$116,952,248.00

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Projetos municipais implantados.	Modify Physical P(a) value	Adequação de produtos, atendendo ao pedido de prorrogação Of. 10.609/2015. Reprogramação de metas, em tramitação.	9/25/2015	8/19/2015
Output	Reunião de avaliação das ações do Programa realizadas.	Modify Physical P(a) value	Adequação de produtos, atendendo ao pedido de prorrogação Of. 10.609/2015. Reprogramação de metas, em tramitação.	9/25/2015	9/25/2015

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
