



Operation Number: **CO-L1132**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2015**
Last Update: **10/23/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/26/2015**
Division Chief validation date: **10/28/2015**
Country Representative validation date: **10/28/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	III Loan for Investment Financing, Restructuring, Exporting Development		Loan Number:	2949/OC-CO
Executing Agency (EA):	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S A.			
Team Leader:	Concha Perdomo,Alvaro		Sector/Subsector:	BANKING MARKET DEVELOPMENT
Operation Type:	Loan Operation		Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan		Country:	COLOMBIA
Borrower:	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S A.		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
CO-L1132	\$200,000,000.00	\$200,000,000.00	\$200,000,000.00	\$0.00	\$400,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
CO-L1132	\$200,000,000.00	\$0.00	0.00%	\$200,000,000.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B13
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

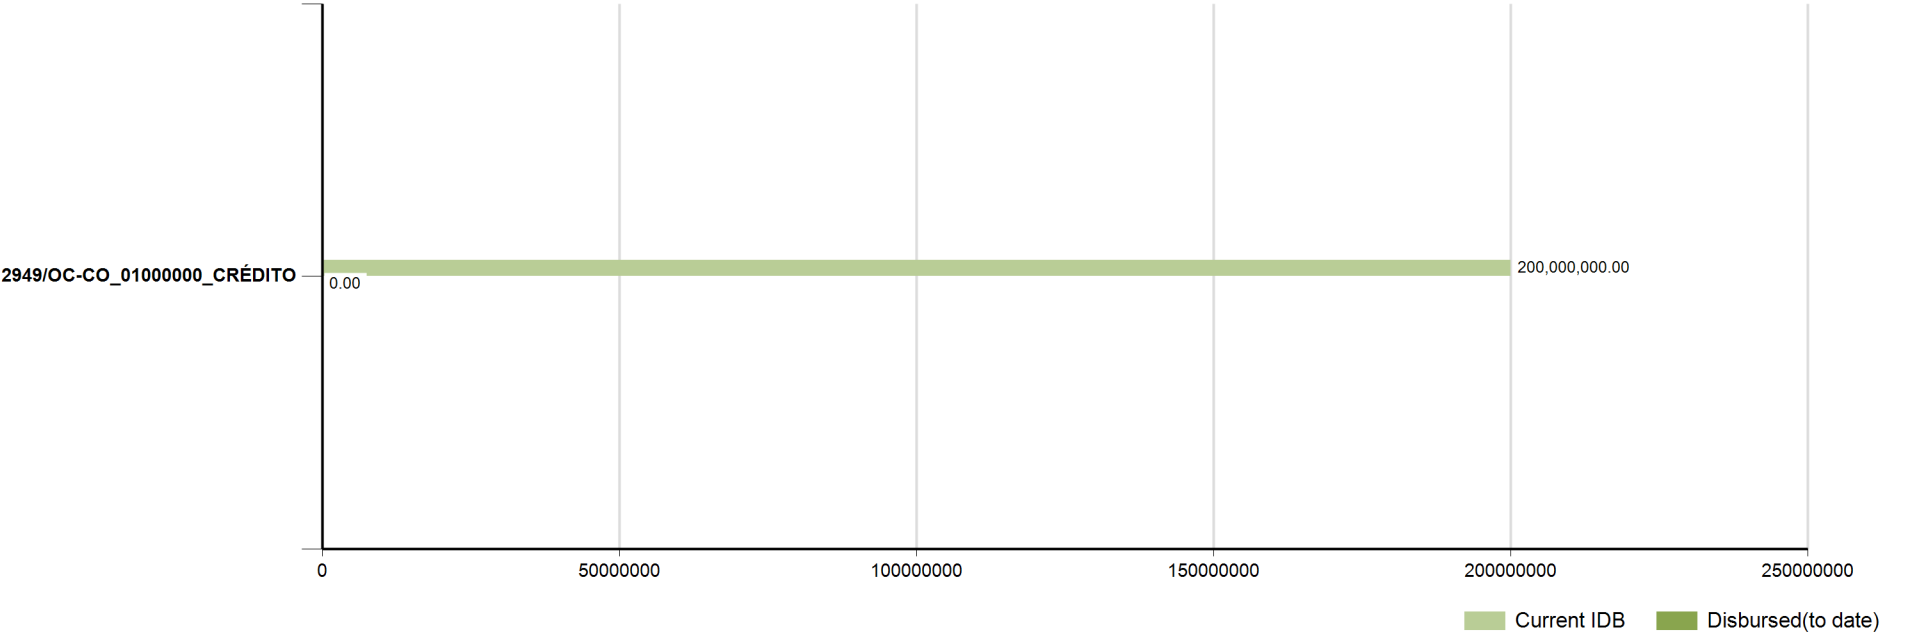

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Incrementar la producción real de las firmas beneficiarias									
Observation:	El indicador es igual a la producción real promedio de las firmas beneficiarias para el 2017 sobre la producción real promedio de firmas comparables, no beneficiarias, menos 1, multiplicado por 100.									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2017		2018	EOP
1.1 La producción real de las firmas beneficiarias se incrementa con relación a la producción de empresas comparables no beneficiarias para el 2017.						El indicador es igual a la producción real promedio de las firmas beneficiarias para el 2017 sobre la producción real promedio de firmas comparables, no beneficiarias, menos 1, multiplicado por 100. Note que este incremento porcentual será calculado hacia el final del periodo de ejecución del programa. El dato de la línea de base no se conoce todavía, pero para cuando se haga la evaluación se tendrá claro cuáles fueron las empresas beneficiarias y las comparables, no beneficiarias.	P	0.00	18.00	18.00
							P(a)	0.00	18.00	18.00
							A			
		Porcentaje	0.00	2013	Evaluación de Impacto ex-post con base en la Encuesta Anual Manufacturer a del DANE.					

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Mejora en el acceso al financiamiento de las empresas beneficiarias, medida por la evolución en el plazo promedio de los créditos otorgados con recursos del programa y la calidad de la cartera de sus los subpréstamos.
Observation:	El indicador de las entidades financieras se obtendrá de una encuesta realizada directamente a las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera correspondiente a créditos para actividad productiva.

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations							
							2014	2015	2016	2017	2018	EOP	
1.1 Plazo promedio de los préstamos otorgados con recursos del programa durante su periodo de ejecución.		Años	2.18	2013	Este indicador se obtendrá de una encuesta realizada directamente a las entidades financieras vigiladas por la SFC para créditos de act. productiva.	La línea de base corresponde al indicador del plazo promedio de las colocaciones del total del sistema financiero colombiano.	P	0.00	4.00	4.10	4.20	4.30	4.30
	P(a)						0.00	4.00	4.10	4.20	4.30	4.30	
	A						0.00	0.00				0.00	
1.2 Calidad de la cartera de subpréstamos del programa durante su periodo de ejecución.		Porcentaje	2.00	2013	Sistemas de Bancoldex	La línea de base corresponde al indicador promedio de la calidad de cartera del sistema financiero colombiano.	P	0.00	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
	P(a)						0.00	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	
	A						0.00	0.00				0.00	

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente de Crédito		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Número de empresas elegiles que obtienen financiamiento para inversión, reconversión productiva y desarrollo exportador a través del programa.	Empresas	P	133.00	1,333.00	P	40,000,000.00	400,000,000.00
		P(a)	133.00	1,333.00	P(a)	40,000,000.00	400,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Total Cost					2015	Total Cost	
				P	\$40,000,000.00	\$400,000,000.00	
				P(a)	\$40,000,000.00	\$360,000,000.00	
				A			

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.
