
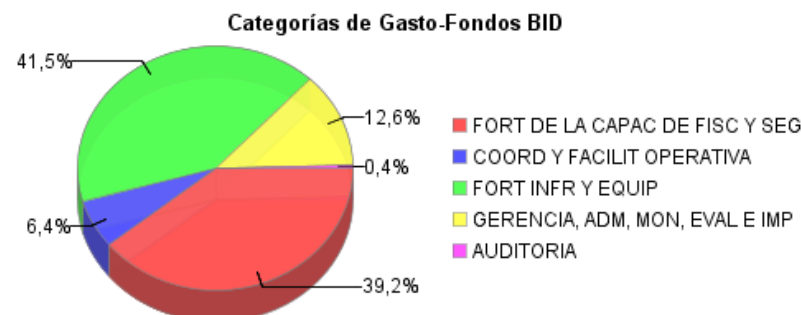
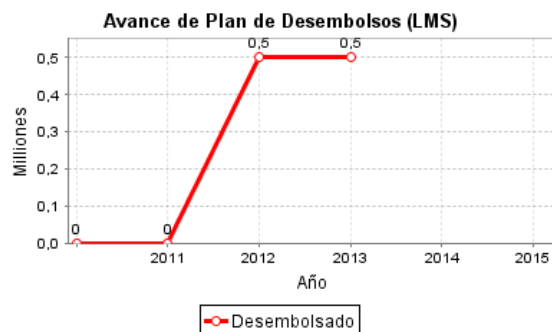



## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	SECRETARIA DE FINANZAS		
Sector:	TRADE		
Número(s) de Préstamo:	2467/BL-HO	Monto Aprobado Actual:	10.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	500.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	5,00
Operación(es) Relacionada(s):	HO-P1061, RG-P1400, RG-T2261	Saldo:	9.500.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		
		BID Original:	10.000.000,00
		Actual BID:	10.000.000,00
		Pari-passu:	100,00
		Co-financiamiento/País:	
		Estimado Original:	10.000.000,00
		Período de Amortización (meses):	281

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 11-abr-2013 Validado por Representante de País: 16-abr-2013

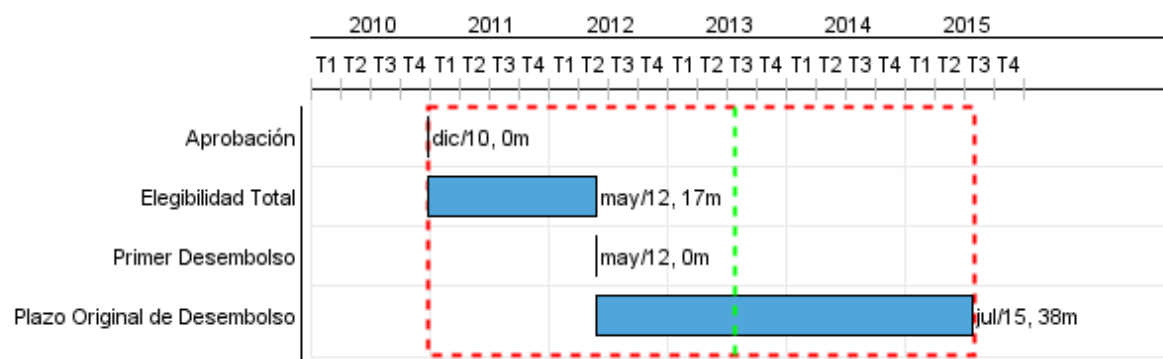

## Progreso Acumulado al 2012

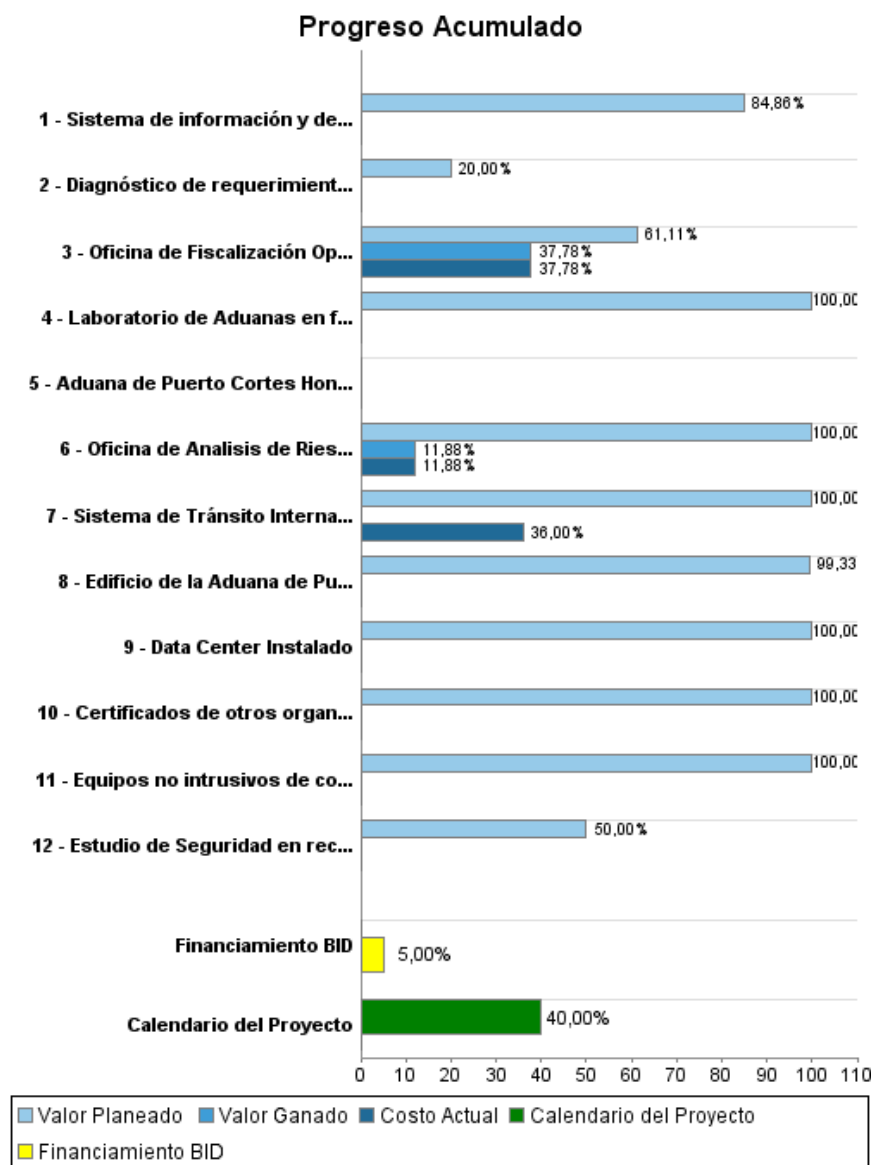

## Resultados

**Resultado:** Capacidad de fiscalización y seguridad en Puerto Cortés mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Declaraciones de importación, exportación y tránsito revisadas con base en análisis de riesgo, bajo reglas probabilísticas y aleatorias	Porcentaje	41,00	2010	P A					85,00
Eficacia en la selección medida por el porcentaje de liquidaciones complementarias efectuadas en el despacho (canal rojo y naranja).	Porcentaje	8,60	2010	P A		30,00 3,43			60,00
Recaudación proveniente de pago electrónico.	Porcentaje	12,00	2010	P A	25,00 12,00	50,00 51,00	65,00	90,00	90,00
Declaraciones de importación que aplican uso de reglas varias y probabilísticas en la selección mediante el análisis de riesgo	Porcentaje	4,00	2010	P A			50,00		95,00
Declaraciones de importación asignado a los canales rojo y naranja	Porcentaje	89,44	2010	P A		75,00 23,00			55,00
Cuota a ingresar sobre la cuota declarada como resultado de una fiscalización	Porcentaje	21,00	2011	P A					32,00
Incautaciones por ilícitos y contrabando	Incautaciones	70,00	2010	P A					140,00

**Resultado:** Facilitación operativa mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Declaraciones de importación y exportación tramitadas con certificación electrónica	Porcentaje		2011	P A			60,00		95,00
Tránsitos internacionales tramitados por sistema TIM en Puerto Cortés	Porcentaje		2011	P A		50,00			100,00
Tiempos de despacho de tránsitos internacionales de mercancías en Puerto Cortés mediante el sistema del TIM	horas		2011	P A		50,00			70,00
Tiempo promedio de despacho de la declaración de importación	Horas	18,80	2010	P A			10,00		6,00

**Resultado:** Nueva infraestructura y equipamiento de Puerto Cortés en operación

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Adjudicación de las obras del edificio de la Aduana de Puerto Cortés	Adjudicación		2010	P A		1,00			1,00
Usuarios externos e internos satisfechos con los servicios de la Aduana de Puerto Cortés	Porcentaje		2011	P A					70,00
Incremento en la disponibilidad de servicios informáticos y telecomunicaciones	Porcentaje	94,16	2010	P A					99,50
Mejora en ranking de Eficiencia de Administración de Aduanas elaborado por el Foro Económico Mundial	Ranking	93,00	2010	P A					90,00

**Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012**

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Fortalecimiento de la Capacidad de Fiscalización y Seguridad en Puerto Cortes</b>									
Sistema de información y despacho anticipado implementado	Sistema	1,00			1,00	471.000,00			555.000,00
Oficina de Analisis de Riesgo operativa	Oficina				1,00	300.000,00	50.000,00		421.000,00
Estudio de Seguridad en recintos y costas elaborado	Estudio	1,00			1,00	200.000,00			400.000,00
Equipos no intrusivos de control adquiridos	Equipos				1,00				1.160.000,00
Laboratorio de Aduanas en funcionamiento	Laboratorio				1,00	50.000,00			300.000,00
Oficina de Fiscalización Operativa	Individuos				20,00	20.000,00	34.000,00		90.000,00
<b>Coordinación y Facilitación Operativa</b>									
Certificados de otros organismos (agricultura, sanidad, etc.) necesarios para realizar operaciones aduaneras que están operativos para su tramite en línea y su control (REVISAR LINEA DE BASE)	Certificados				50,00	200.000,00			368.000,00
Sistema de Tránsito Internacional de Mercancías (TIM) implementado en Puerto Cortés	Sistema	1,00			1,00	200.000,00	72.000,00		200.000,00
Diagnóstico de requerimientos para la implantación del TIM transoceánico elaborado	Diagnóstico	1,00			1,00	20.000,00			100.000,00
<b>Fortalecimiento de la Infraestructura y equipamiento de Puerto Cortes</b>									
Aduana de Puerto Cortes Hondureña modernizada	Aduana modernizada				1,00				
Edificio de la Aduana de Puerto Cortés reacondicionado	Edificio				1,00	1.750.000,00			1.900.000,00
Data Center Instalado	Data Center				1,00				2.246.000,00
<b>Gestion del programa</b>									
Gestion del Programa	N/A					69.000,00			485.000,00
Contingencias e intereses	N/A					100.000,00			700.000,00
Evaluacion y auditorias externas	N/A					25.000,00			115.000,00
Salarios de especialistas en comercio exterior, area de fiscalizacion y de analisis de riesgo	N/A								960.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>3.405.000,00</b>	<b>156.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>
