
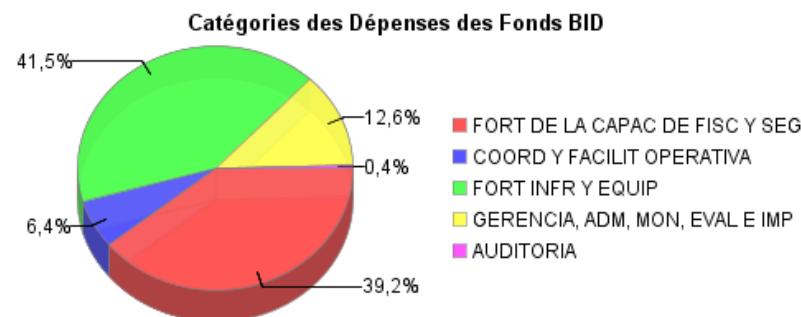
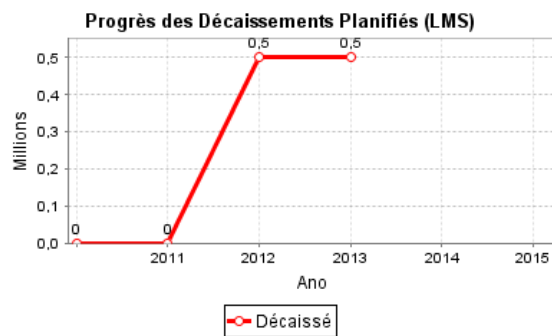



## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	SECRETARIA DE FINANZAS				
Secteur:	TRADE				
Numéro(s) de Prêt(s):	2467/BL-HO	Montant Courant Approuvé:	10.000.000,00	Initial BID:	10.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	500.000,00	Courant BID:	10.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	5,00	Pari Passu:	100,00
Opération(s) Connexe(s):	HO-P1061, RG-P1400, RG-T2070, RG-T2261	Solde:	9.500.000,00	Cofinancement/Pays:	
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	10.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	281

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 27-sep-2013 Validé par le Représentant: 01-oct-2013

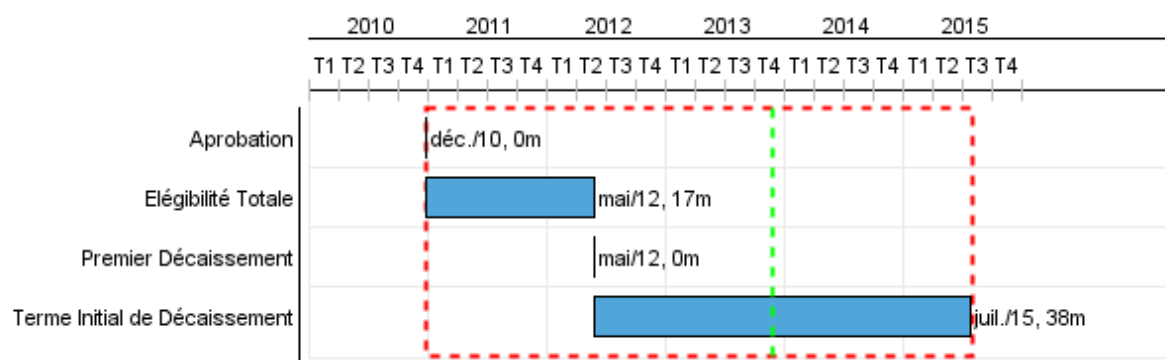

## Progrès Cumulé à 2013

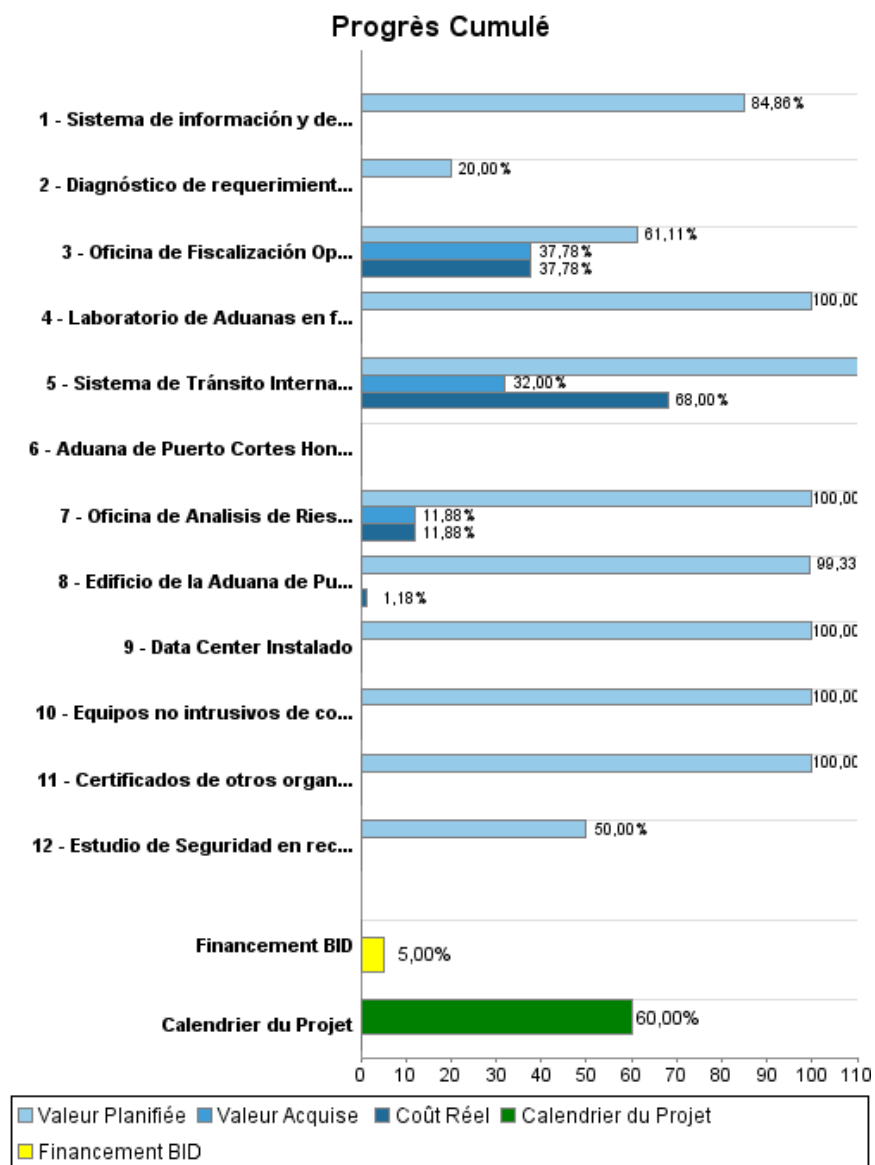

## Résultats

**Résultat:** Capacité de fiscalización y seguridad en Puerto Cortés mejorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	Fin du Projet
Declaraciones de importación, exportación y tránsito revisadas con base en análisis de riesgo, bajo reglas probabilísticas y aleatorias	Porcentaje	41,00	2010	P A					85,00
Eficacia en la selección medida por el porcentaje de liquidaciones complementarias efectuadas en el despacho (canal rojo y naranja).	Porcentaje	8,60	2010	P A		30,00 13,74			60,00
Recaudación proveniente de pago electrónico.	Porcentaje	12,00	2010	P A	25,00 12,00	50,00 51,00	65,00	90,00	90,00
Declaraciones de importación que aplican uso de reglas varias y probabilísticas en la selección mediante el análisis de riesgo	Porcentaje	4,00	2010	P A			50,00		95,00
Declaraciones de importación asignado a los canales rojo y naranja	Porcentaje	89,44	2010	P A		75,00 72,00			55,00
Cuota a ingresar sobre la cuota declarada como resultado de una fiscalización	Porcentaje	21,00	2011	P A					32,00
Incautaciones por ilícitos y contrabando	Incautaciones	70,00	2010	P A					140,00

**Résultat:** Facilitación operativa mejorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	Fin du Projet
Declaraciones de importación y exportación tramitadas con certificación electrónica	Porcentaje		2011	P A			60,00		95,00
Tránsitos internacionales tramitados por sistema TIM en Puerto Cortés	Porcentaje		2011	P A		50,00			100,00
Tiempos de despacho de tránsitos internacionales de mercancías en Puerto Cortés mediante el sistema del TIM	horas		2011	P A		50,00			70,00
Tiempo promedio de despacho de la declaración de importación	Horas	18,80	2010	P A			10,00		6,00

**Résultat:** Nueva infraestructura y equipamiento de Puerto Cortés en operación

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	Fin du Projet
Adjudicación de las obras del edificio de la Aduana de Puerto Cortés	Adjudicación		2010	P A		1,00			1,00
Usuarios externos e internos satisfechos con los servicios de la Aduana de Puerto Cortés	Porcentaje		2011	P A					70,00
Incremento en la disponibilidad de servicios informáticos y	Porcentaje	94,16	2010	P					99,50

## RAPPORT DE SUIVI

HO-L1055 - Puerto Cortés Customs Modernization  
2013 1<sup>o</sup> período con cierre al (31-oct.-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement  
Dernière Mise à Jour: 24/09/2013

telecomunicaciones				A					
Mejora en ranking de Eficiencia de Administración de Aduanas elaborado por el Foro Económico Mundial	Ranking	93,00	2010	P					90,00
				A					

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Fortalecimiento de la Capacidad de Fiscalización y Seguridad en Puerto Cortés</b>									
Sistema de información y despacho anticipado implementado	# sistemas implementados				1,00				555.000,00
Oficina de Analisis de Riesgo operativa	# oficinas en funcionamiento	1,00			1,00	121.000,00			421.000,00
Estudio de Seguridad en recintos y costas elaborado	# estudios elaborados				1,00				400.000,00
Equipos no intrusivos de control adquiridos	# equipos en funcionamiento	1,00			1,00	1.160.000,00			1.160.000,00
Laboratorio de Aduanas en funcionamiento	# laboratorios en funcionamiento	1,00			1,00	250.000,00			300.000,00
Oficina de Fiscalización Operativa	# funcionarios contratados				20,00	35.000,00			90.000,00
<b>Coordinación y Facilitación Operativa</b>									
Certificados de otros organismos (agricultura, sanidad, etc.) necesarios para realizar operaciones aduaneras que están operativos para su tramite en línea y su control (REVISAR LINEA DE BASE)	# certificados intercambiados	25,00			50,00	168.000,00			368.000,00
Sistema de Tránsito Internacional de Mercancías (TIM) implementado en Puerto Cortés	# sistemas implementados				1,00		64.008,00		200.000,00
Diagnóstico de requerimientos para la implantación del TIM transoceánico elaborado	# estudios elaborados				1,00				100.000,00
<b>Fortalecimiento de la Infraestructura y equipamiento de Puerto Cortés</b>									
Aduana de Puerto Cortés Hondureña modernizada	# oficinas de aduana modernizadas				1,00				
Edificio de la Aduana de Puerto Cortés reacondicionado	# edificaciones remodeladas	1,00			1,00	137.200,00	22.385,00		1.900.000,00
Data Center Instalado	# sistemas data center implementados	1,00			1,00	2.246.000,00			2.246.000,00
<b>Gestion del programa</b>									
Gestion del Programa	N/A					116.100,00	4.577,00		485.000,00
Contingencias e intereses	N/A					250.000,00			700.000,00
Evaluacion y auditorias externas	N/A					10.000,00			115.000,00

## RAPPORT DE SUIVI

HO-L1055 - Puerto Cortés Customs Modernization  
2013 1<sup>o</sup> período con cierre al (31-oct.-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement  
Dernière Mise à Jour: 24/09/2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Salarios de especialistas en comercio exterior, area de fiscalizacion y de analisis de riesgo	N/A					385.000,00			960.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>4.878.300,00</b>	<b>90.970,00</b>		<b>10.000.000,00</b>
