



Operation Number: **PE-L1062**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2013**
Last Update: **6/20/2014**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **06/20/2014**
Division Chief validation date: **06/26/2014**
Country Representative validation date: **06/27/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Program to Improve Early Education in Ayacucho, Huancavelica and Huánuco	Loan Number:	2661/OC-PE
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE EDUCACION		
Team Leader:	Alfonso,Mariana	Sector/Subsector:	PRIMARY EDUCATION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	PERU
Borrower:	REPUBLICA DEL PERU	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
PE-L1062	\$25,000,000.00	\$25,000,000.00	\$25,700,000.00	\$13,800,000.00	\$64,500,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
PE-L1062	\$25,000,000.00	\$1,137,950.00	4.55%	\$23,862,050.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

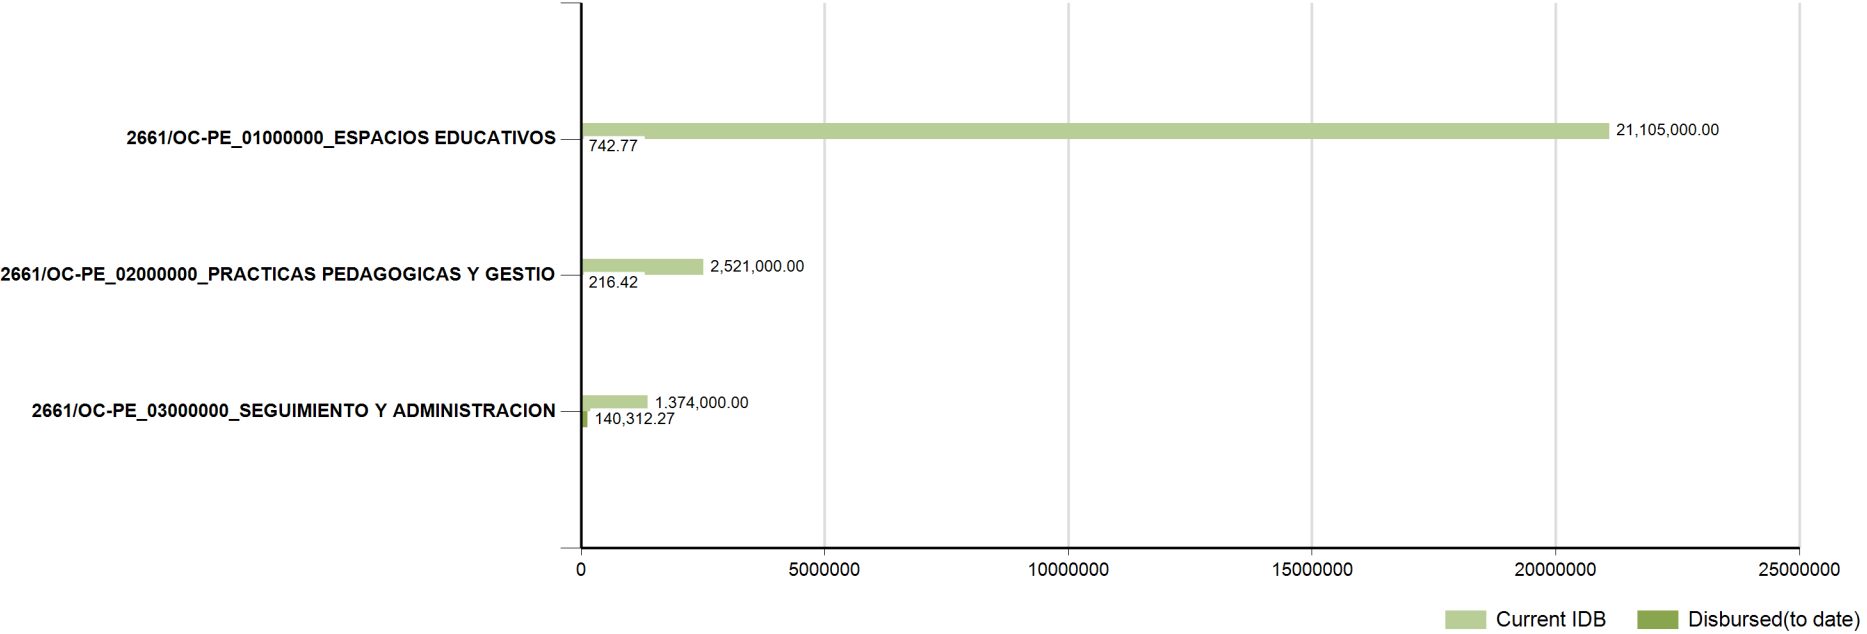

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Mejora en la entrada a tiempo al primer año de la primaria de alumnos beneficiados								
Observation:									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Alumnos en edad oficial que ingresan al primer año de la primaria (entrada a tiempo)			Porcentaje	0.00	2013	Registros del MINEDU y UEP	Los valores de línea de base y meta serán definidos una vez se levante la línea de base (finales de 2013 o principios de 2014).	P	0.00
								P(a)	0.00
								A	
Impact:		2 Mejora en el desarrollo psicomotor y de lenguaje de los niños beneficiados							
Observation:									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.1 Resultado en las pruebas de desarrollo psicomotor y lenguaje			Puntaje	0.00	2013	Informes de línea de base y seguimiento longitudinal	Los valores de la línea de base y meta serán determinados una vez que se levante la línea de base (fines de 2013 o comienzos 2014)	P	0.00
								P(a)	0.00
								A	

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Estándares de seguridad y normas técnicas vigentes son utilizados para el diseño de locales escolares y espacios educativos
Observation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
							P	
4.1 Nivel de participación de padres de familia en actividades de desarrollo y aprendizaje organizados por centros de educación inicial		Porcentaje	0.00	2013	Encuestas a Padres de Familia	Valores de la Línea de Base y Metas por definir con la línea de base que sera levantada a fines de 2013 o inicios del 2014	P(a)	0.00
							A	

Outcome:

5 Estudiantes (niñas, varones) que se benefician de proyectos educativos

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
							P	
5.1 Estudiantes (niñas, varones) beneficiados por las actividades del programa	RF	Estudiantes	0.00	2013	Reportes de la UEP.		P(a)	6,794.00
							A	

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente 1: Espacios Educativos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
Centros de Educación Inicial son rehabilitados o reemplazados y están equipados y operando	Centros	P	0.00	127.00	P	2,143,000.00	49,593,630.00
		P(a)	0.00	127.00	P(a)	2,143,000.00	49,593,630.00
		A	0.00	0.00	A	1,030,554.00	1,030,554.00
Centros de Educación Inicial cuentan con Plan de Mantenimiento de Obras	Centros	P	0.00	212.00	P		
		P(a)	0.00	212.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A		
Componente 2: Prácticas Pedagógicas, gestión y participación familiar		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
Docentes reciben materiales de capacitación	Docentes	P	0.00	307.00	P	19,000.00	144,000.00
		P(a)	0.00	307.00	P(a)	19,000.00	144,000.00
		A	0.00	0.00	A	25,234.70	25,234.70
Docentes capacitados y acompañados en el aula	Docentes	P	0.00	307.00	P	34,000.00	3,141,667.00
		P(a)	0.00	307.00	P(a)	34,000.00	3,141,667.00
		A	0.00	0.00	A	45,253.30	45,253.30
Centros de Educación inicial reciben colección de materiales, incluyendo libros bilingües interculturales y módulos de equipamiento	Centros	P		212.00	P		2,320,000.00
		P(a)		212.00	P(a)		2,320,000.00
		A	0.00	0.00	A		
Sistema de Seguimiento periódico de docentes desarrollado	Sistema	P		1.00	P	50,000.00	50,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	50,000.00	50,000.00
		A	0.00	0.00	A	5,300.00	5,300.00
Docentes son monitoreados a través del sistema de seguimiento	Docentes	P		307.00	P		
		P(a)		307.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A		
Padres de familia son receptores de la Estrategia de Educación y Comunicación Social implementada por el proyecto	Padres	P		6,794.00	P	78,000.00	747,000.00
		P(a)		6,794.00	P(a)	78,000.00	747,000.00
		A	0.00	0.00	A	9,785.00	9,785.00
Seguimiento y administración del Programa		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
Unidad equipada y con recursos humanos capacitados en planeación	Unidad	P			P		
		P(a)		1.00	P(a)		425,603.64
		A	1.00	1.00	A	425,603.64	425,603.64
Evaluación de impacto del programa cuenta con línea de base y línea final	Informe	P			P		
		P(a)		2.00	P(a)		1,500,000.00
		A	0.00	0.00	A	395,270.00	395,270.00
Other Cost						2013	Cost
Administración, monitoreo y evaluación del Programa					P	\$240,000.00	\$8,503,400.00
					P(a)	\$240,000.00	\$6,578,099.36
					A	\$626,375.00	\$626,375.00
Total Cost						2013	Total Cost
					P	\$2,564,000.00	\$64,499,697.00
					P(a)	\$2,564,000.00	\$33,642,481.21
					A	\$2,563,375.64	\$2,563,375.64

Changes to the Matrix

No information related to this operation.
