



Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO ENERO 2017 - JUNIO 2017

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo de un canal alternativo de financiamiento verde a través de crowdlend

Nro. Proyecto: AR-T1176 - Proyecto No.: ATN/ME-16041-AR

Propósito: Desarrollo de un canal alternativo de financiamiento verde, crowdlending verde.

País Administrador

ARGENTINA

País Beneficiario


ARGENTINA

Agencia Ejecutora: AFLUENTA


Líder equipo de diseño: CÉSAR BUENADICHA

Líder equipo de supervisión: ERIKA MOLINA


CICLO DEL PROYECTO



RECURSOS

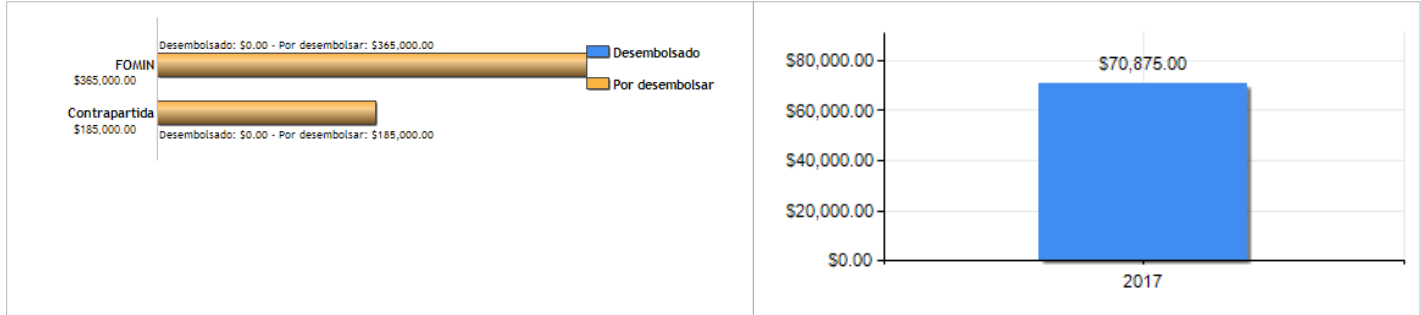

PUNTAJE DE DESEMPEÑO

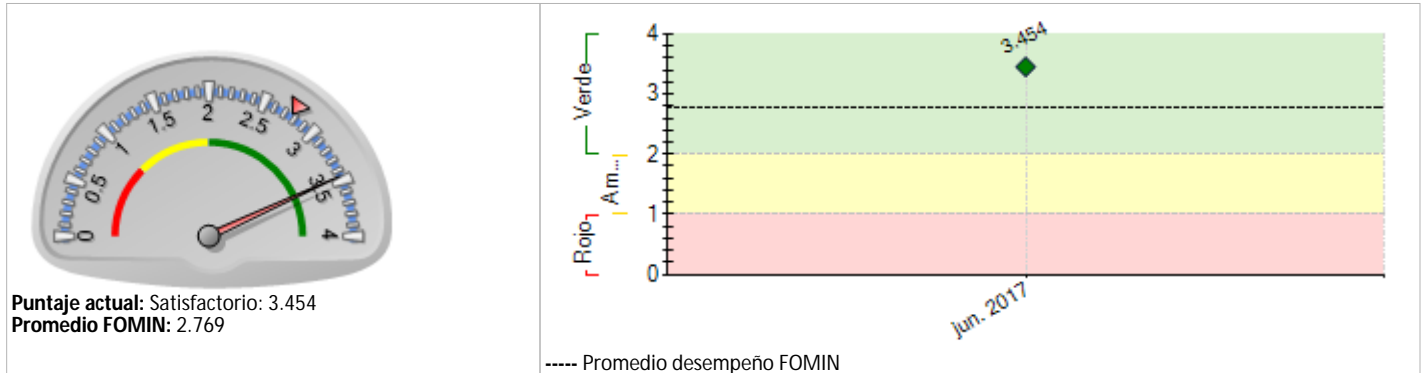

RIESGOS EXTERNOS


CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Riesgo

Administración Financiera: Alto

Adquisiciones: Alto

Capacidad Técnica: Baja

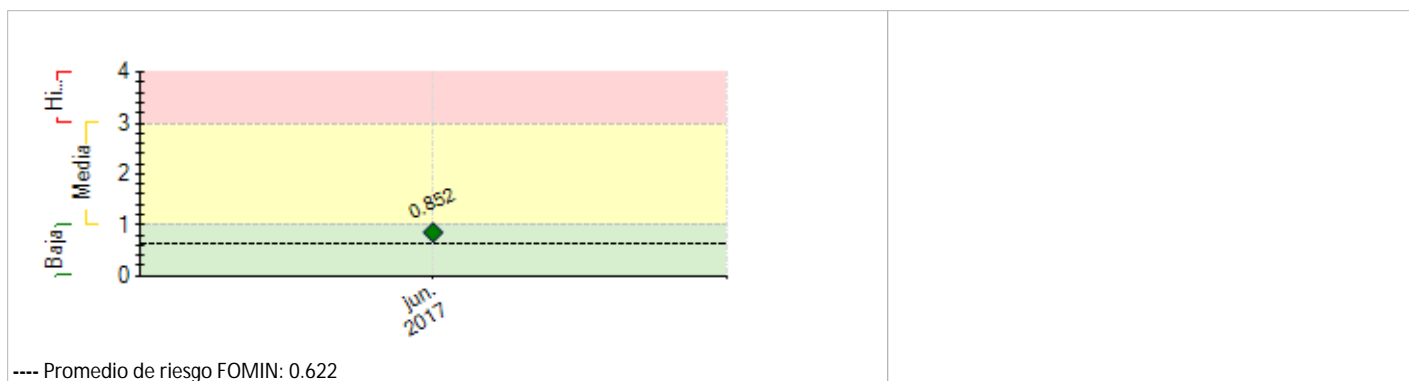

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

1.

Se cumplió el Hito 0 con las condiciones para el 1er desembolso.

Se armaron los (TdR) para las contrataciones 1.1 y 1.2. mediante la realización de un análisis para el armado de los mismos. Se enviaron los TdR y recibieron de acuerdo con lo estipulado, antes del 25 de julio. Se publicaron notas en los medios gráficos y online.

Se participó en eventos relacionados con la temática ambiental, se hicieron contactos con actores estratégicos, hubo una muy buena aceptación.

Se efectuó reunión con la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER). Fué presentado el producto de créditos verdes a los comités integrados por los principales actores del sector de energía renovable y ambiental. Existe la posibilidad de ser miembros de la misma.

2.

Hubo un leve retraso en el armado de los TdR de las primeras consultorías. Mercado y Marco Legal.

Planificado en junio, pero se enviaron en julio, esto fue debido al nivel de detalle expuesto en el armado de los mismos. Fuimos asesorados con actores especializados para poder armar los TdR y que estos reflejen de una manera clara y concisa las necesidades del proyecto.

3.

Realización de modelo de riesgo para Pymes.

Realizar los TdR y contratar la consultoría de impacto ambiental.

Finalización de informes de Estudio de mercado y marco legal.

Comenzar las reuniones para el armado de la cámara FINTECH con apoyo del BID/FOMIN para la contratación de una persona representante de la misma.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

La ejecución del proyecto durante el primer semestre sufrió un leve retraso, en parte debido al cambio en el equipo de ejecución (Coordinador contratado por el proyecto y personal de Afluenta asignado al proyecto - CFO y Director de Producto) y la necesaria curva de aprendizaje a recorrer en estos casos.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Fin:	I.1 Reducción de emisiones de GEI	0 Feb. 2017	1 Feb. 2018	1 Feb. 2019	1 Feb. 2020	1 Feb. 2020	0	
Propósito: Desarrollo de un canal alternativo de financiamiento verde, crowdlending verde.	R.1 Numero de PYMEs que adoptan tecnologías verdes	0 Feb. 2017	150 Ago. 2018			450 Feb. 2019	0	
Componente 1: Análisis del mercado y preparación de la plataforma	C1.1 Estudio de mercado completado	0 Feb. 2017				1 Ago. 2017		
Peso: 30%	C1.2 Desarrollo de sistema de gestión de riesgo PYME (desarrollo de algoritmo)	0 Feb. 2017				1 Feb. 2018		
Clasificación: Satisfactorio								
Componente 2: Piloto de producto financiero verde	C2.1 Campaña de promoción realizada	0 Feb. 2017				1 Ago. 2018		
Peso: 40%	C2.2 Producto financiero desarrollado	0 Feb. 2017	1 Feb. 2018	1 Feb. 2019	1 Feb. 2020	1 Feb. 2020		
Clasificación: Satisfactorio								
Componente 3: Escalamiento y mejora de la visibilidad del financiamiento alternativo	C3.1 Reuniones para buscar inversores	0 Feb. 2017	1 Feb. 2018	2 Ago. 2018		3 Feb. 2019		
Peso: 30%	C3.2 Estudio para roll out en Mexico y Perú	0 Feb. 2017				1 Feb. 2019		
Clasificación: Satisfactorio	C3.3 Numero de Plataformas participando en reuniones del ecosistema / estudio hecho	0 Feb. 2017	3 Ago. 2017	5 Feb. 2018	6 Ago. 2018	8 Feb. 2019		

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H1 Condiciones previas	6	Ago. 2017	6	May. 2017	Logrado
H1 Estudio de Mercado completado	1	Dic. 2017			
H2 Modelo de riesgo completado (version beta) y armado de modelo de medición de emisiones	1	Mar. 2018			
H3 Modelización y pricing del producto financiero	1	Jun. 2018			
H4 Plataforma adaptada para escalar	1	Sep. 2018			
H5 Colocación de 30 préstamos verdes	30	Oct. 2018			
H6 Acuerdos con inversores institucionales para colocar USD 100,000.	100000	Oct. 2018			

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Escasa demanda por parte de solicitantes de préstamos para la adquisición de un préstamo verde.	Media	Apalancamiento en actores ya establecidos en el mercado en la difusión de prácticas de cuidado del medio ambiente. Uno de los puntos de la consultoría del estudio de mercado, es poder establecer, cuantificar y segmentar la demanda que existe para este producto, para poder obtener herramientas y saber hacia dónde dirigir la comunicación y en donde realizar las campañas de concientización y conocimiento del producto.	Project Guest
2. Mal desempeño en el cumplimiento de pago de préstamos verdes	Media	Seguimiento continuo del desempeño del nuevo producto de crédito. Se estima que no debería existir un riesgo distinto al del resto de la cartera de Afluente para personas, y en el segmento de las Pymes, se trabajará en el modelo de riesgo para definir los criterios de contratación del producto y atenuar los posibles casos de incumplimiento de pago. (Mitigación del riesgo)	Project Guest
3. inexistencia de un modelo similar en América Latina y el Caribe del cual extraer lecciones aprendidas	Baja	Contacto con actores críticos del ecosistema para revisar avances en el mismo. Se realizaron reuniones con líderes del mercado FinTech para comenzar con el armado de la Cámara Argentina de Fintech. El cual será un espacio muy útil para representar los intereses del sector y compartir experiencias, conocimientos, entre otros, acerca de las finanzas sostenibles que puedan servir para el desarrollo del proyecto.	Project Guest
4. falta de inversores dispuestos a financiar prestamos verdes,	Baja	Establecimiento de acuerdos con grandes empresas para sumarlas como inversoras directas de su red de proveedores. Se prevé realizar rondas de inversiones para estos créditos verdes. Creemos que con la conciencia que existe respecto al cambio climático (ODS) y al avance de las finanzas sostenibles en la región, podría atenuarse dicho riesgo. También creemos que debemos mostrar la solidez del producto y el potencial de negocios para que sea atractivo para los inversores.	Project Guest
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 4 RIESGOS VIGENTES: 4 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

En este primer periodo desde AFLUENTA, se ha comprendido que existe una brecha entre los problemas que contribuyen hacia un desarrollo sostenible y la falta de financiamiento para afrontar estos desafíos.

El financiamiento FinTech, es una herramienta que permite viabilizar políticas, estrategias y estándares diseñados. La Agenda de desarrollo sostenible, reveló una urgencia que debe ser atendida no solo por los gobiernos, sino también por la sociedad civil y el sector privado.

El financiamiento de productos verdes contribuye a aliviar las brechas y posicionar estratégicamente nuevas modalidades que contribuyen al acceso de tecnologías alternativas y a la energía limpia.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a	Autor
1. Desde AFLUENTA, estamos convencidos del valioso aporte que brinda el proyecto y la íntima relación con los ODS (7)	Implementation	pinzone, gustavo alberto
