
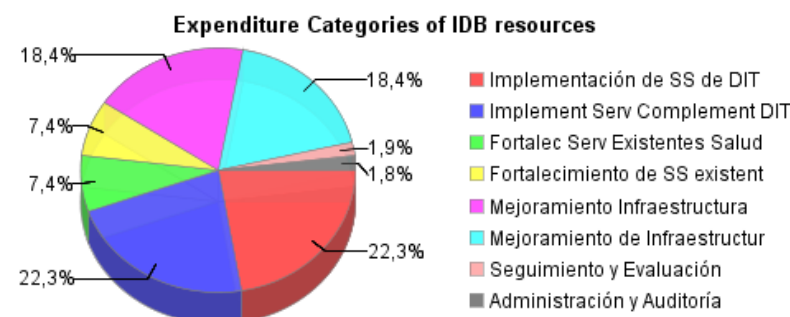
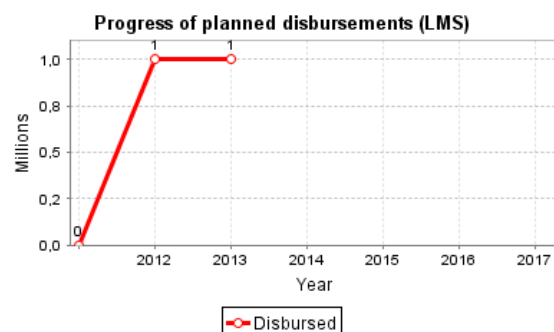


Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MISTERIO DE SALUD Y DEPORTES				
Sector:	SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT				
Loan Number(s):	2719/BL-BO	Current Approved Amount:	20.000.000,00	Original IDB:	20.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	1.000.000,00	Current IDB:	20.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	5,00	Pari-passu:	91,00
Related Operation(s):	BO-T1114, RG-P1478	Balance:	19.000.000,00	Co-Financing/Country:	2.000.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	22.000.000,00
				Amortization Period (months):	282

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: None	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 25-sep-2013 Validated by Country Representative: 25-sep-2013

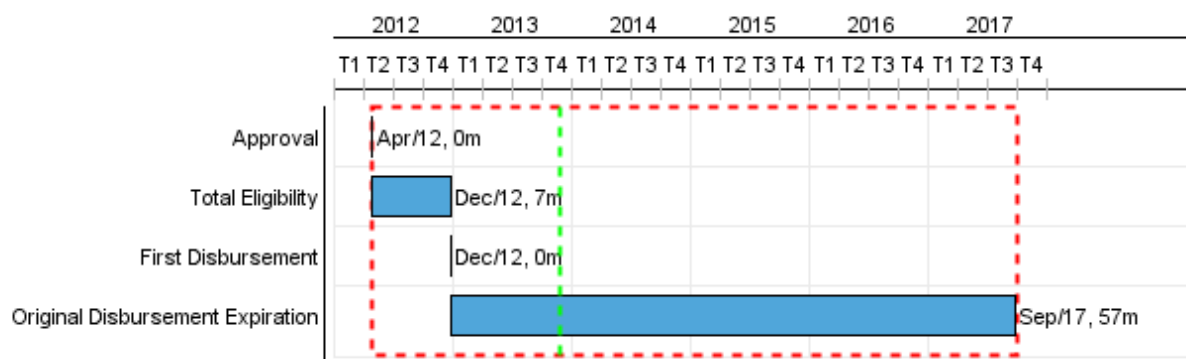

Accumulated Progress as of 2013



Outcomes

Outcome:	Acceso de menores de 4 años a servicios de DIT mejorado
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	End of project
Cobertura absoluta en DIT de niños/as de 0 a 4 años en municipios priorizados	Personas		2012	P A			14.600,00	14.600,00		23.600,00
Beneficiarios/as de 0 a 4 años incluidos en el registro nacional de DIT.	Beneficiarios		2012	P A				4.625,00	4.625,00	4.625,00

Outcome:	Calidad de los servicios ofrecidos de DIT mejorada
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	End of project
Tasa de niños/as de 0 a 4 años por personal calificado DIT bajo AIEPI Nut Comunitario en municipios priorizados	Tasa		2012	P A			40,00	40,00		40,00
Tasa de niños/as de 0 a 2 años por cuidador/a capacitado (comunitario o profesional) en centros infantiles en municipios priorizados	Tasa		2012	P A			7,00	7,00	7,00	7,00
Tasa de niños/as de 2 a 4 años por cuidador/a capacitado (comunitario o profesional) en centros infantiles en municipios priorizados	Tasa		2012	P A			11,00	11,00	11,00	11,00
Porcentaje del personal en centros infantiles capacitado en los estándares de calidad y currículo vigente en los municipios priorizados	Porcentaje		2012	P A			25,00	25,00	25,00	75,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Implementación de servicios complementarios de Desarrollo Infantil Temprano (DIT)									
1.1.1 Cuidadores/as capacitados en currículo de centros infantiles.	Personas				520,00	4.000,00			368.000,00
1.1.2 Personal de Centros Infantiles operando	Personas				250,00				5.395.140,00
1.2.1 Personal especializado capacitado en intervenciones en rezago	Personas				60,00				1.620.000,00
1.3.1 Normas y protocolos elaborados y aprobados	Documentos				2,00	3.000,00			430.000,00
1.3.2 Convenios entre MSD, FPS, Gob. Aut. Dep. (SEDEGES, SEDES) y/o Gob. Aut. Mun. (GAM) firmados.	Convenios				1,00	8.000,00			30.000,00
1.3.3 Sistema de supervisión capacitante de SEDES y SEDEGES, implementado.	Sistema				1,00				292.286,00
1.3.4 Fondo municipal de desarrollo infantil operando.	Fondo				1,00				1.600.579,00
Fortalecimiento de servicios existentes en el sector salud									
2.1.1 Personal de salud capacitado para la aplicación de protocolos e instrumentos de DIT	Personas				500,00				60.000,00
2.2.1 Personal de brigadas móviles DIT operando bajo AIEPI Nut Comunitario	Personas				140,00				2.956.467,00
2.3.1 Normas y protocolos elaborados y aprobados	Documentos				2,00	5,00			330.000,00
2.3.2 Personal de las instituciones sectoriales y locales capacitado en el programa DIT	Personas				500,00				68.000,00
2.3.3 Estrategia de información, educación y difusión del programa aprobada	Estrategia				1,00				150.000,00
Mejoramiento de infraestructura									
3.2 Pre-inversión de centros infantiles realizada y aprobada	Diseños	10,00			90,00	35.700,87			303.837,18
3.2 Centros readecuados y equipados según estándares	Centros				90,00				4.760.115,82
3.3 Pre-inversión de salas de rezago realizada y aprobada	Diseños	10,00			40,00	20.303,11			101.515,56
3.4 Salas de estimulación temprana instaladas y equipadas	Salas				40,00				1.590.410,44
Administración (5%) FPS	N/A					2.800,20			355.574,00
Seguimiento y evaluación									
4.1 Registro de beneficiarios o puntos de prestación, desarrollado e implementado	Sistema				1,00				218.000,00

PROGRESS MONITORING REPORT

BO-L1064 - Grow Well to Live Well Early Childhood Development Program
2013 1º period closed in (31-Oct-2013)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness
Last Update: 07/05/2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Sistematización participativa de experiencias	Consultoría				1,00				50.000,00
Evaluación de impacto y procesos	Consultoría				1,00				450.000,00
Administración y Auditoría									
Equipo de unidad ejecutora/coordinadora y personal departamental	N/A					34.914,00			770.081,00
Auditoría	N/A								100.000,00
TOTAL						108.723,18			22.000.006,00
