

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Número(s) de Préstamo: 1632/SF-HA;2386/GR-HA
Etapa: Approved
Tipo de Operación: INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s): TC0002083, TC9809289, HA-X1011
Subtipo de Operación: SEF - Facilidad Sectorial

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 5.250.000,00
Monto Desembolsado a la fecha: 4.077.523,66
% Desembolsado: 77,67
Saldo: 1.172.476,34

Costo total y Fuente

BID Original: 6.604.832,34
Actual BID: 5.250.000,00
Pari-passu: 100,00
Co-financiamiento/País: 45.000,00
Estimado Original: 6.649.832,34
Período de Amortización (meses): 354




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

Reformulación


Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validado por el Jefe de División: Apr 15, 2011
Validado por Representante de País: Apr 27, 2011

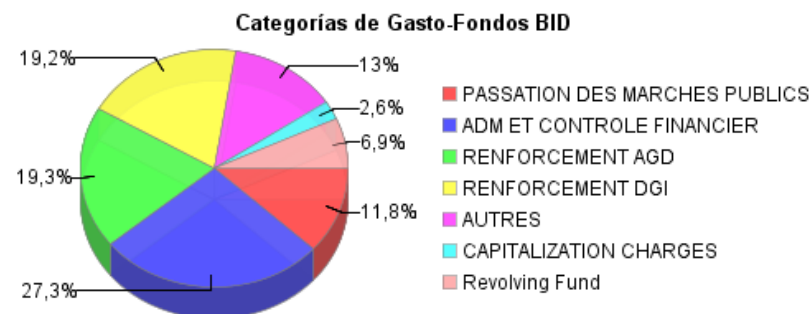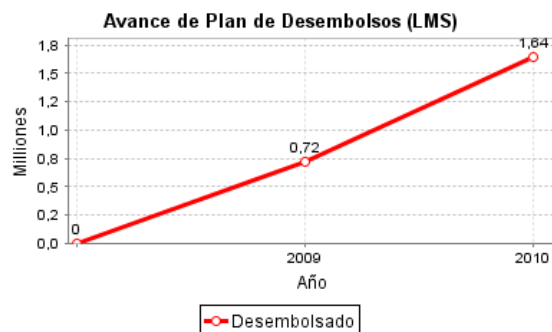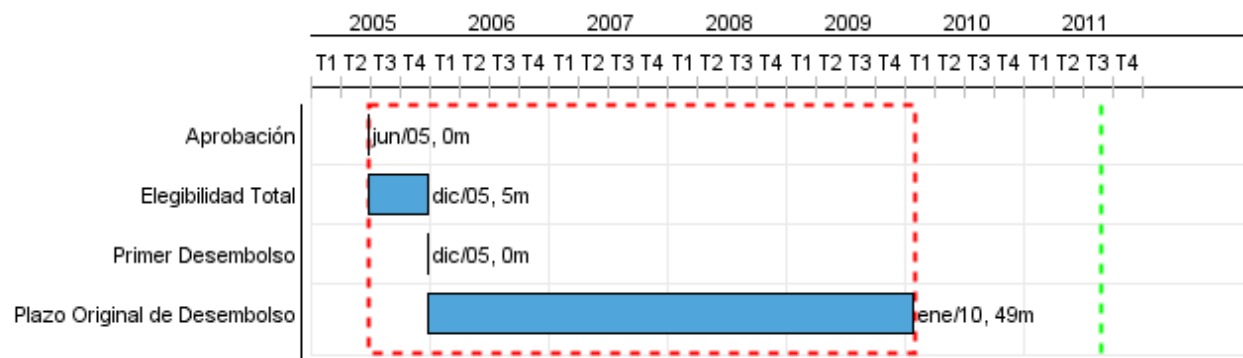

Progreso Acumulado al 2010

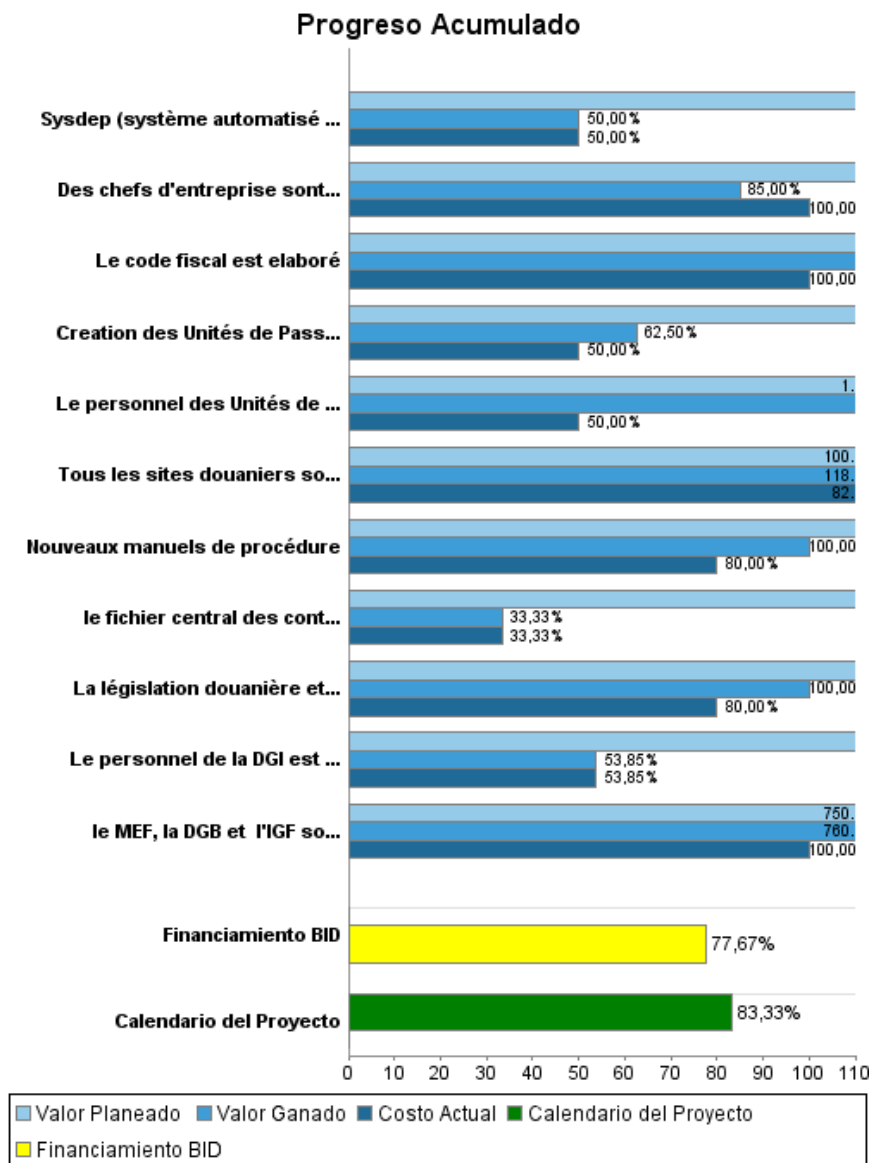

Resultados

Resultado:	Les dépenses sont plus efficaces et les collectes de revenus plus efficaces.
Supuestos:	Le MEF, l'IGF, la CSCCA et la CNMP devront être renforcés institutionnellement.
Observaciones:	Mis A part le MEF, il y a un grand travail à faire au niveau des autres institutions ici mentionnées.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2007	2008	2009	2010	Fin de Proyecto
Budget corréle à la Stratégie de Développement	Budget certifié conforme		2006	P				2,00	2,00
				A			2,00		
Augmentation (en pourcentage) de la performance de la DGI et de la Douane	Aumentation des recettes		2006	P				30,00	30,00
				A		37,00			
Amélioration de la systématisation des dépenses gouvernementales en fonction des Sources de financement, des Agences et des Types de débours.	Système en place		2006	P				1,00	1,00
				A	1,00				

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Administration et Contrôle financiers									
Sysdep (système automatisé de dépenses publiques) est en place	Sysdep en place	1,00	1,00		1,00	200.000,00	200.000,00		400.000,00
le MEF, la DGB et l'IGF sont équipées pour remplir le mandat qui leur est assigné	Equipements livrés	11,00	5,00		100,00	160.000,00	160,00		160,00
Passation de Marchés									
Le personnel des Unités de Passation de Marchés des Ministères Bénéficiaires est formé	Personnes formées	200,00	150,00		250,00	300.000,00	50.000,00		100.000,00
Creation des Unités de Passation de Marchés au sein des ministères bénéficiaires	Unités créées	5,00	5,00		5,00	250.000,00	200.000,00		400.000,00
Des chefs d'entreprise sont formés sur les procédures de passation de marchés	Chefs d'entreprise formés	100,00	85,00		80,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00
Renforcement de l'Administration Générale des Douanes (AGD)									
La législation douanière et le code douanier sont élaborés	Nouveaux Textes de loi	1,00	1,00		1,00	100.000,00	80.000,00		100.000,00
Nouveaux manuels de procédure	Nouveaux manuels	1,00	1,00		1,00	100.000,00	80.000,00		100.000,00
Tous les sites douaniers sont interconnectés	Sites en réseau	7,00	10,00		10,00	477.000,00	477.000,00		577,00
Renforcement de la Direction Générale des Impôts (DGI)									
Le code fiscal est élaboré	Code fiscal	1,00	1,00		1,00	100.000,00	80.000,00		80.000,00
le fichier central des contribuables est mis en place	Fichier central en fonctionnement	1,00	1,00		1,00	150.000,00	150.000,00		450.000,00
Le personnel de la DGI est formé	Cadres formés		650,00		650,00	40.000,00	70.000,00		130.000,00
TOTAL						1.937.000,00	1.447.160,00		1.820.737,00
