
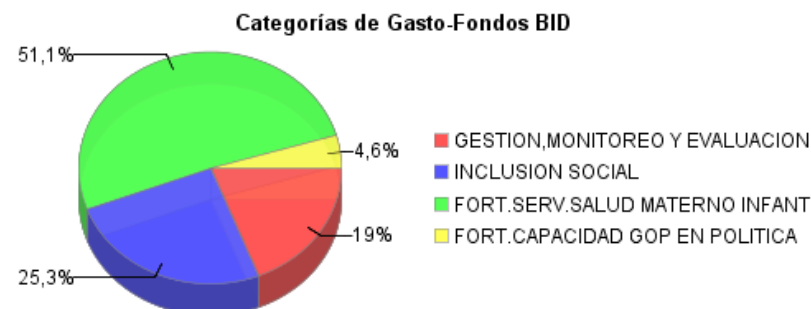
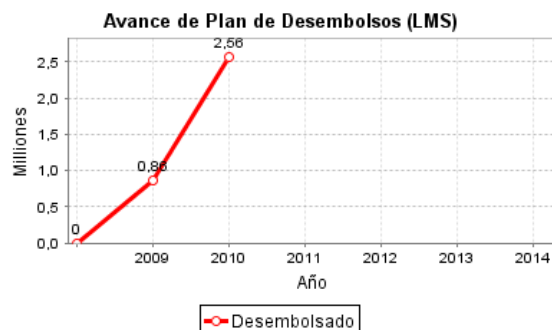



## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		
Sector:	SOCIAL INVESTMENT		
Número(s) de Préstamo:	1867/OC-PN	Monto Aprobado Actual:	20.170.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	5.087.452,43
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	25,22
Operación(es) Relacionada(s):	PN-T1019	Saldo:	15.082.547,57
Subtipo de Operación:	PFM - Proyecto de Fases Múltiples		
		BID Original:	20.170.000,00
		Actual BID:	20.170.000,00
		Pari-passu:	48,61
		Co-financiamiento/País:	2.770.000,00
		Estimado Original:	22.940.000,00
		Período de Amortización (meses):	228

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Apr 12, 2011 Validado por Representante de País: Apr 13, 2011

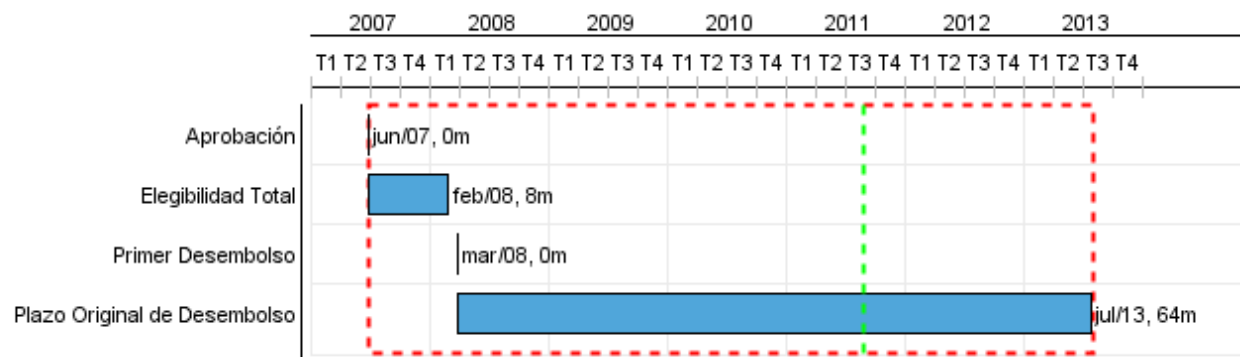

## Progreso Acumulado al 2010

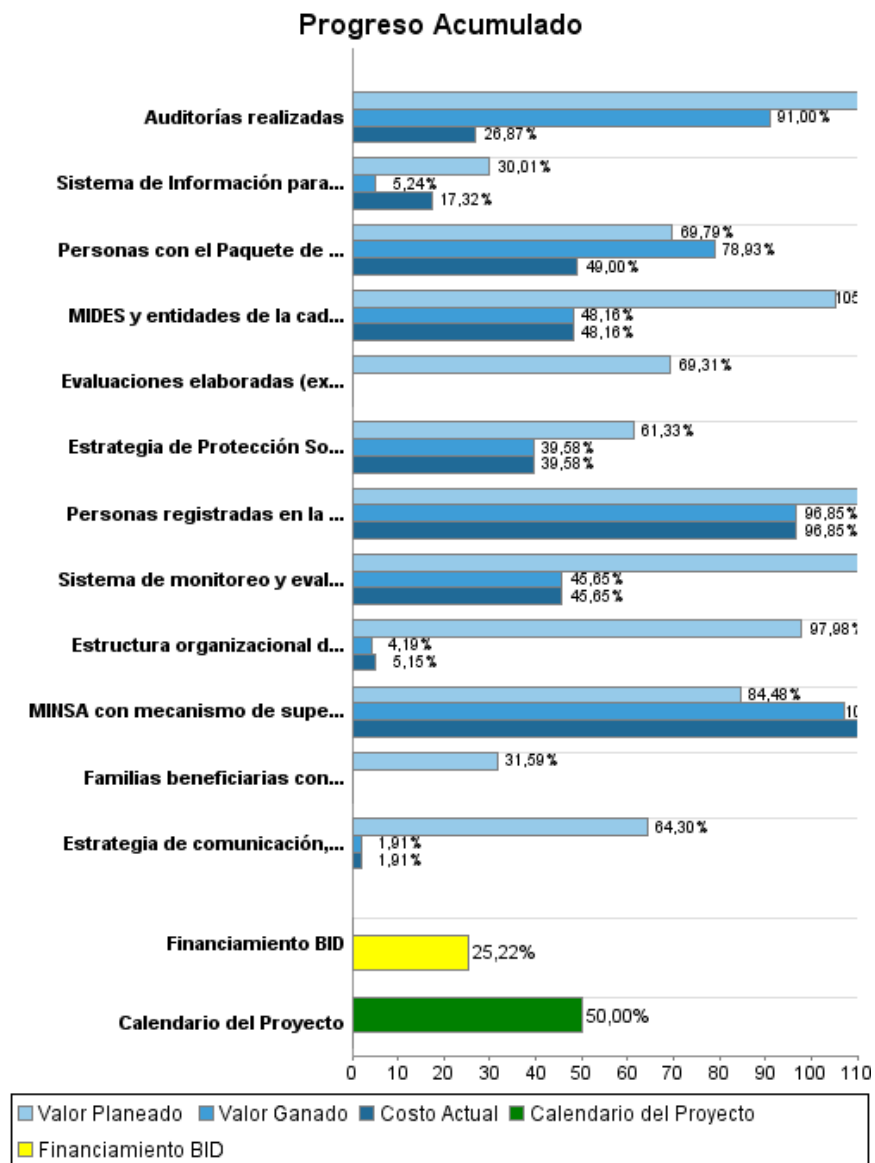

## Resultados

<b>Resultado:</b>	Capital humano y social de los hogares beneficiarios de la Red de Oportunidades potencializado.
<b>Supuestos:</b>	(i) Se mantiene durante todo el periodo de ejecución la voluntad política del GOP de respaldar la RdO; (ii) Se mantiene el compromiso sectorial de actuar de manera coordinada.
<b>Observaciones:</b>	La medición se hace sobre los hogares beneficiarios de la Red de Oportunidades.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	Fin de Proyecto
Prevalencia de desnutrición crónica de niños y niñas menores de 2 años disminuida.	pp		2008	P A		2,00	4,00	4,00
Matrícula neta de preescolar incrementada.	pp		2008	P A		3,00		7,00
Matrícula neta de primaria incrementada.	pp		2008	P A		2,00		4,00
Matrícula neta de premedia incrementada.	pp		2008	P A		2,00		4,00
Asistencia regular a la escuela en primaria incrementada.	pp		2008	P A		4,00		7,00
Asistencia regular a la escuela en premedia incrementada.	pp		2008	P A		3,00		7,00
Hogares beneficiarios de los módulos de formación a través de un miembro adulto	Porcentaje	10,00	2008	P A	40,00 25,00	60,00 64,00	80,00	90,00
Inmunización completa para niños menores de un año, incrementada.	Porcentaje	59,00	2009	P A	90,00 59,00	90,00 80,00	94,00	94,00
Cobertura de controles prenatales y postnatales adecuados para mujeres embarazadas en las comarcas, aumentada.	Porcentaje	63,00	2009	P A	50,00 63,00	50,00 74,00	80,00	80,00

<b>Resultado:</b>	Procesos de gestión de la Red de Oportunidades efectivos.
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	Fin de Proyecto
Niños de 4 a 17 años de edad que forman parte de la Red de Oportunidades y cumplen con la co-responsabilidad de educación.	Porcentaje		2008	P A	70,00	80,00	85,00	90,00
Familias con cumplimiento de co-responsabilidades verificado.	Porcentaje de familias		2008	P A	25,00	40,00	55,00	75,00
Información sobre corresponsabilidades de miembros de hogares beneficiarios entregada por escuelas	Porcentaje de escuelas y proveedores de salud.		2008	P A	30,00	45,00	60,00	80,00
Costos administrativos como porcentaje del costo de las transferencias, disminuido.	Porcentaje	16,00	2008	P A	19,00 16,00	17,00 9,00	7,00	7,00
Cobertura de la Red de Oportunidades a nivel de corregimientos, expandida.	Número de corregimientos		2008	P A	621,00 591,00	621,00 586,00	621,00	621,00
Cobertura de la Red de Oportunidades a nivel de hogares, expandida.	Número de hogares	54.510,00	2008	P A	75.000,00 69.759,00	75.000,00 75.030,00	75.000,00	75.000,00
Transferencias de efectivo direccionadas hacia los más pobres.	Porcentaje de las	94,00	2008	P	80,00	80,00	80,00	80,00

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

PN-L1007 - Protección Social Fase I  
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo  
Última Actualización del PMR: 08/04/2011

	transferencias de efectivo que son recibidas por los hogares más pobres (quintiles 1 y 2, o el 40% más pobre)			A	83,00	60,00		
Familias recertificadas.	Porcentaje de hogares beneficiarios recertificados.		2008	P		60,00	80,00	100,00
				A				
Cobertura de las transferencias para hogares en las comarcas, incrementada.	Porcentaje de hogares en las comarcas que reciben transferencias (como porcentaje del número total de hogares en las comarcas)	50,00	2008	P	55,00	60,00	65,00	70,00
				A		70,00		
Sistema de información social con programas sociales y proyectos incluidos.	Proporción de los programas incluidos		2008	P		30,00	60,00	80,00
				A				
Información sobre corresponsabilidades de miembros de hogares beneficiarios entregada por proveedores de salud.	%		2008	P	30,00	45,00	60,00	80,00
				A		56,00		

**Resultado:** Inclusión social de los hogares de la Red de Oportunidades promovida.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	Fin de Proyecto
Beneficiarios que conocen la oferta de servicios y las corresponsabilidades de la Red de Oportunidades incrementado.	%	30,00	2008	P	70,00	90,00	95,00	95,00
				A	60,00	69,00		
Hogares que reciben una inducción a la Red de Oportunidades en las jurisdicciones cubiertas por la RdO, incrementado.	Número		2008	P	50.000,00	75.000,00		0,00
				A				
Jurisdicciones cubiertas por la Red de Oportunidades recibiendo apoyo de los equipos técnicos para el acompañamiento de los hogares.	Porcentaje		2008	P	30,00	60,00	100,00	100,00
				A				
Participación en los comités de familia de al menos un miembro de un hogar de las jurisdicciones (corregimientos y comarcas) incluidas en la Red de Oportunidades, aumentada.	Porcentaje		2008	P	30,00	50,00	100,00	100,00
				A		55,00		

**Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010**

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Componente 1: Gestión, monitoreo y evaluación de la Red de Oportunidades.</b>									
Sistema de Información para la Gestión (SIG) y seguimiento funcional, implementado.	Sistema	1,00			1,00	160.000,00	126.634,00		1.892.962,00
MIDES y entidades de la cadena que gestionan la Red de Oportunidades equipadas.	Entidades				17,00	1.367.583,00	1.135.615,00		4.744.814,00
Evaluaciones elaboradas (externa de impacto y operativa de procesos, procesos de verificación por muestreo del efectivo monitoreo de las corresponsabilidades).	Estudios				3,00	645.000,00			1.961.000,00
Auditorías realizadas	Informes	1,00	1,00		6,00	119.122,00	27.122,00		179.469,00
<b>Componente 2: Inclusión social</b>									
Familias beneficiarias con acompañamiento familiar	Familias	20.000,00			130.000,00	755.000,00			3.895.500,00
Personas registradas en la Encuesta de Vulnerabilidad Social pertenecientes a los corregimientos de la Red de Oportunidades, con tarjetas de identificación (cédulas de identidad/certificados de nacimiento) emitidas.	Persons					32.000,00	315,00		40.915,00
Estrategia de comunicación, educación e información de la Red de Oportunidades funcional	Estrategia				1,00	200.000,00	6.000,00		629.886,00
<b>Componente 3: Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud materno-infantil.</b>									
Personas con el Paquete de Atención de Servicios de Salud más AIN-C, beneficiadas	Personas	180.000,00	233.282,00		30.704.036,00	8.608.900,00	6.652.806,00		24.751.050,00
MINSA con mecanismo de supervisión y auditoría social del PAISS+N fortalecido y funcional.	Mecanismo	1,00	1,00		1,00	262.299,75	289.039,00		526.190,00
Sistema de monitoreo y evaluación de la provisión del PAISS+N funcional	Sistema		1,00		1,00	316.000,00	380.322,00		833.130,00
<b>Componente 4: Fortalecimiento de la capacidad del GOP de diseñar, implementar y monitorear políticas y programas sociales.</b>									
Estrategia de Protección Social del MIDES funcional	Estrategia				1,00	55.000,00	89.809,00		281.246,00
Estructura organizacional del MIDES funcional (incluye contar con un reglamento de administración que defina claros mandatos y programas de trabajo).	Estructura	1,00			1,00	450.520,00	11.000,00		1.142.106,00
<b>TOTAL</b>						<b>12.971.424,75</b>	<b>8.718.662,00</b>		<b>40.878.268,00</b>
