
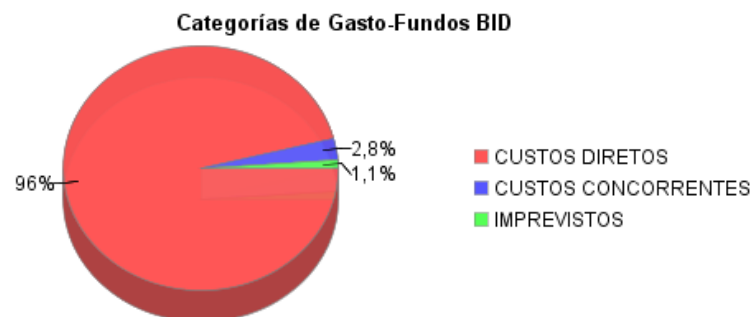
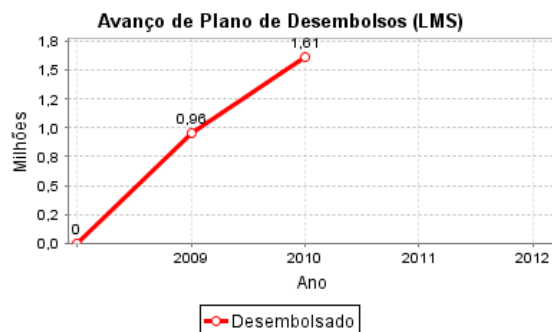



Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: Ministério do Desenvolvimento Agrário		
Sector: AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-LAND ADMINISTRATION AND REGULATION		
Número da Operação: 1633/OC-BR	Atual: 10.800.000,00	Original BID: 10.800.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 1.608.430,24	Corrente BID: 10.800.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 14,89	Pari-passu: 71,39
Operação Relacionada:	Saldo: 9.191.569,76	Cofinanciamento/País: 7.200.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 18.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 198

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 25, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 24, 2011

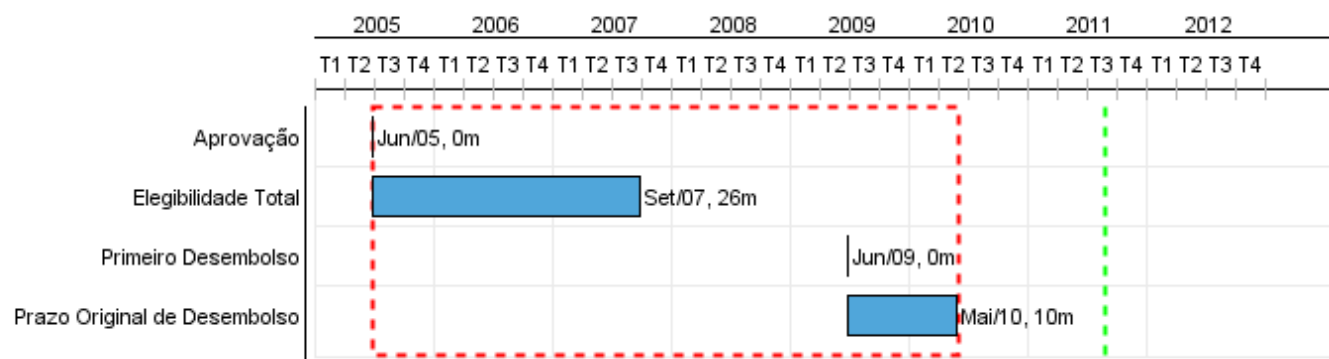

Progresso Acumulado até 2010

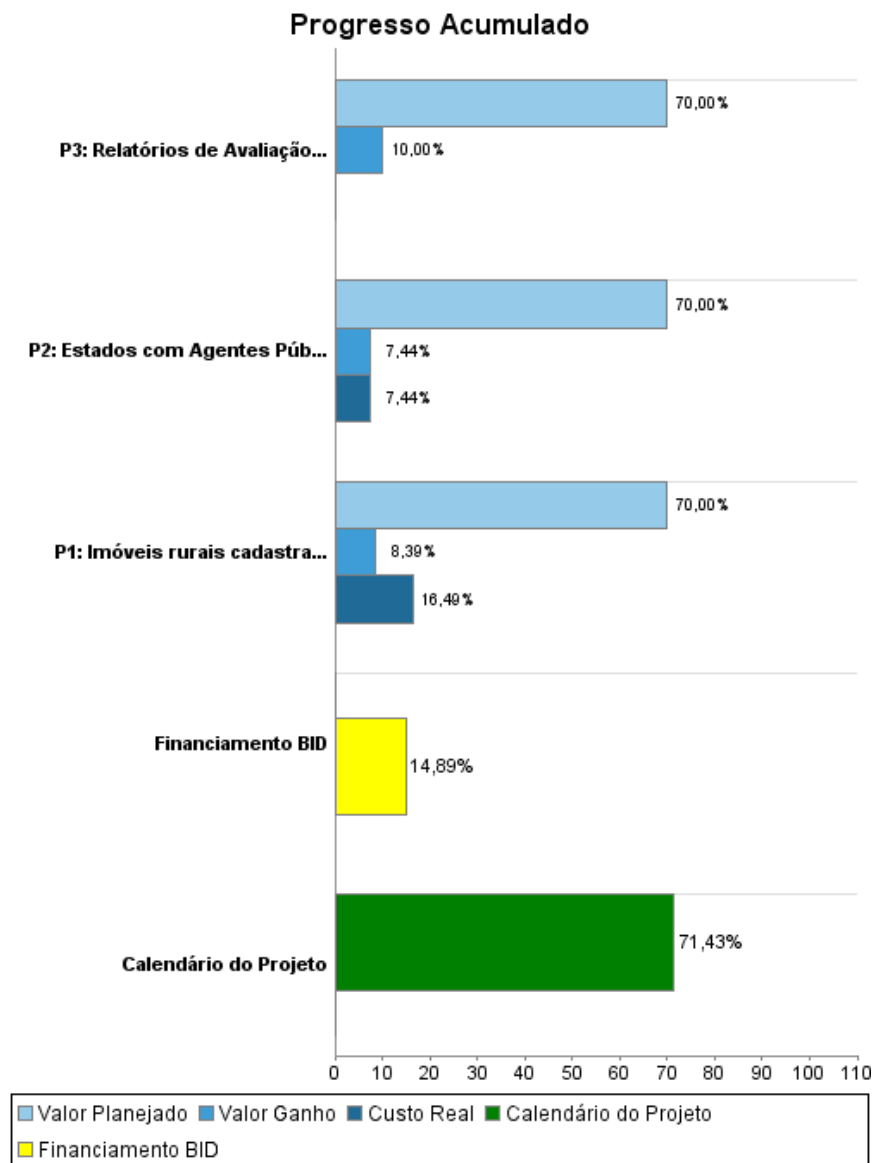

Resultados

Resultado: Processo de regularização de Terras do Governo do Brasil modernizado.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Malha fundiária por município implantada.	Município		2007	P A	80,00
Imóveis rurais de pequenos produtores atendidos no programa regularizados.	%		2007	P A	100,00

Resultado: Sistema de Regularização de Terras Nacional viabilizado.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Informações da malha fundiária detalhada por estado sistematizada	%		2007	P A	100,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
COMPONENTE 01: Cadastro de Terras e Regularização Fundiária									
P1: Imóveis rurais cadastrados com técnicas de geoprocessamento.	Imóveis Cadastrados	62.607,00	10.811,00		144.000,00	4.214.100,00	1.225.350,70		14.047.000,00
COMPONENTE 02: Fortalecimento Institucional									
P2: Estados com Agentes Públicos da área de cadatro de terras, fortalecido	Estados				5,00	568.800,00			1.896.000,00
COMPONENTE 03: Sistema de Gestão e Avaliações Intermediária e Final									
P3: Relatórios de Avaliação E Linha de Base elaborados	Relatórios	1,00			3,00	72.000,00			240.000,00
COMPONENTE 04: Outros									
TOTAL						4.854.900,00	1.225.350,70		16.183.000,00
