
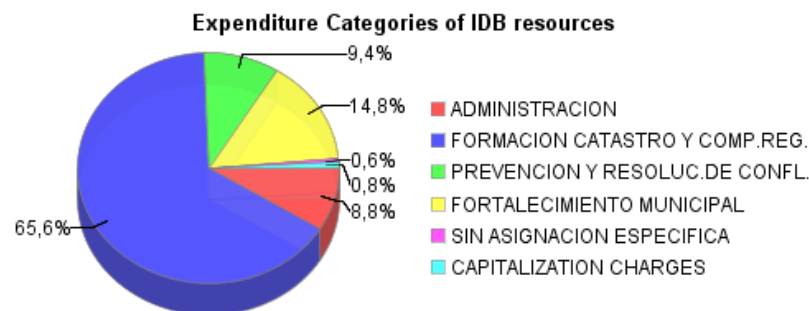
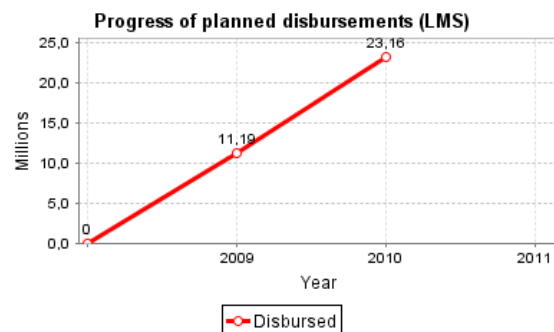


Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE HACIENDA				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT				
Loan Number(s):	1284/OC-CR	Current Approved Amount:	65.000.000,00	Original IDB:	65.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	45.304.278,24	Current IDB:	65.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	69,70	Pari-passu:	85,72
Related Operation(s):	TC9811151	Balance:	19.695.721,76	Co-Financing/Country:	27.000.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	92.000.000,00
				Amortization Period (months):	162

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Apr 15, 2011 Validated by Country Representative: Apr 20, 2011

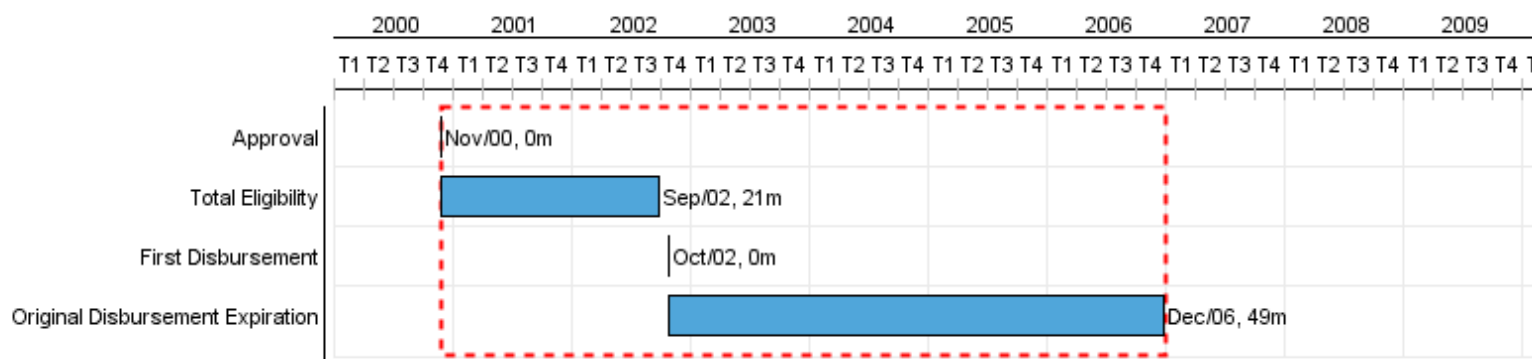

Accumulated Progress as of 2010



Outcomes

Outcome: Seguridad jurídica de la propiedad inmueble en Costa Rica mejorada.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	End of project
predios con expediente catastral/registraral unificado respecto al universo predial	%		2002	P A	16,40	40,00 40,60	53,00		100,00

Outcome: El Estado inicia regularización de Areas Bajo Regímenes Especiales (ABRE)

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	End of project
Territorios ABRE con propuestas de regularización catastral/registraral	territorios		2002	P A		40,00 53,00	50,00	55,00	0,00

Outcome: Gobiernos locales cuentan con instrumentos para mejorar su gestión

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	End of project
Plataformas de valores actualizadas e implementadas	plataformas		2002	P A		24,00	6,00	51,00	81,00

Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente II: Sistema de Resolución Alternativa de Conflictos (RAC) en Operación y Áreas bajo Regímenes Especiales debidamente Registradas y Catastradas.									
Levantamientos situacionales completados	territorios		44,00		56,00				
Levantamiento catastral completado	territorios				9,00				
Zona Marítimo Terrestre demarcada	unidades de territorio				24,00				
Centros de resolución de conflictos instalados	centros				3,00				
PLanes de ordenamiento costero entregados a municipalidades	propuestas				16,00				
Componente I: Formación del Catastro Nacional de la Propiedad Inmueble y su Compatibilización con el Registro.									
Producción cartográfica escala 1:5000 y 1:100 completadas	km2	10.150,00	3.923,00		46.270,00				
Levantamiento catastral completado	expedientes	420.000,00	209.000,00		850.000,00				
Diseño del Sistema de Registro Inmobiliario concluido	sistema				1,00				
Implementación del Sistema de Registro Inmobiliario concluido	sistema				1,00				
Diseño e implementación del Sistema Nacional de Información Territorial	sistema				1,00				
Instalación de estaciones de georeferenciación concluida	estaciones				8,00				
Componente III: Municipalidades Fortalecidas en las Áreas de Recaudo Fiscal, Planificación de las Inversiones y Ordenamiento Territorial.									
Plataformas de valores actualizadas	plataforma de valores				81,00				
Sistema Tributario Municipal instalado y en funcionamiento	municipalidades				40,00				
Planes reguladores elaborados y/o actualizados	propuestas				12,00				
Sistema de interconexión municipal concluido	municipalidades				61,00				
Funcionarios municipales capacitados en administración catastral	funcionarios municipales				890,00				
TOTAL									
