
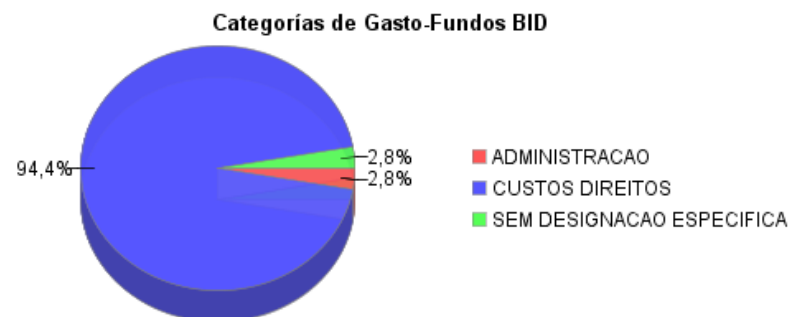
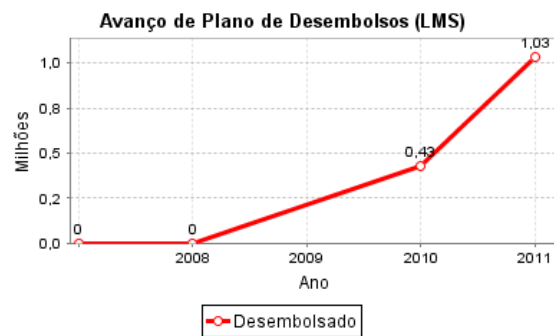



Relatório Resumido

| Dados Gerais | Fundos Disponíveis (US\$) | Custo Total e Fonte |
|-----------------------|---|-------------------------------------|
| Executor: | INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS APLICASAS | |
| Sector: | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-PLANNING AND STATE REFORM | |
| Número da Operação: | 1841/OC-BR | Atual: 7.150.000,00 |
| Estágio: | Approved | Desembolsado: 1.028.926,19 |
| Tipo Operação: | INV - Investimento | % Desembolsado: 14,39 |
| Operação Relacionada: | | Saldo: 6.121.073,81 |
| Subtipo de Operação: | TCR - Technical Cooperation Loan | Original BID: 7.150.000,00 |
| | | Corrente BID: 7.150.000,00 |
| | | Pari-passu: 81,00 |
| | | Cofinanciamento/País: 1.650.000,00 |
| | | Original Estimado: 8.800.000,00 |
| | | Período de Amortização (meses): 174 |

| Categoria do impacto social | Reformulação | Validação |
|------------------------------|---|---|
| Categoria do impacto social: | C () Os objetivos do projeto foram reformulados? | Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 26, 2011 Validado pelo Representante do País: Sep 27, 2011 |

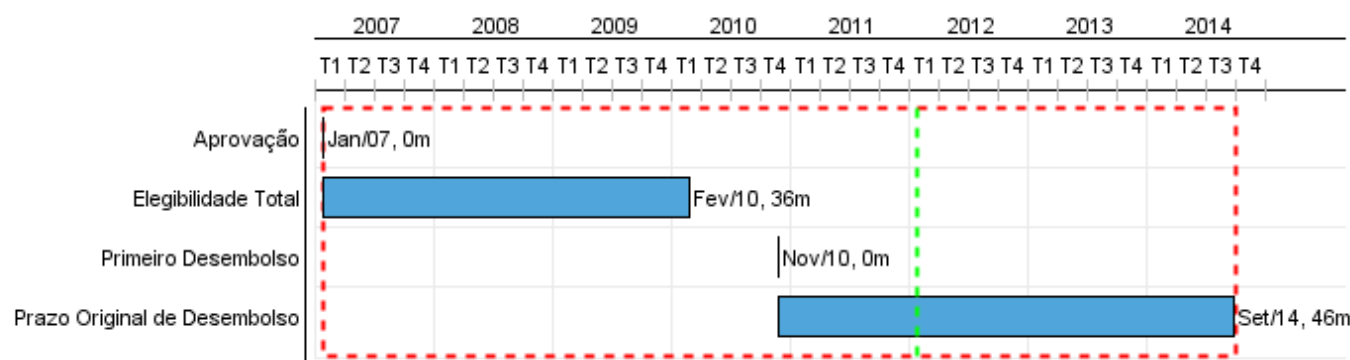

Progresso Acumulado até 2011

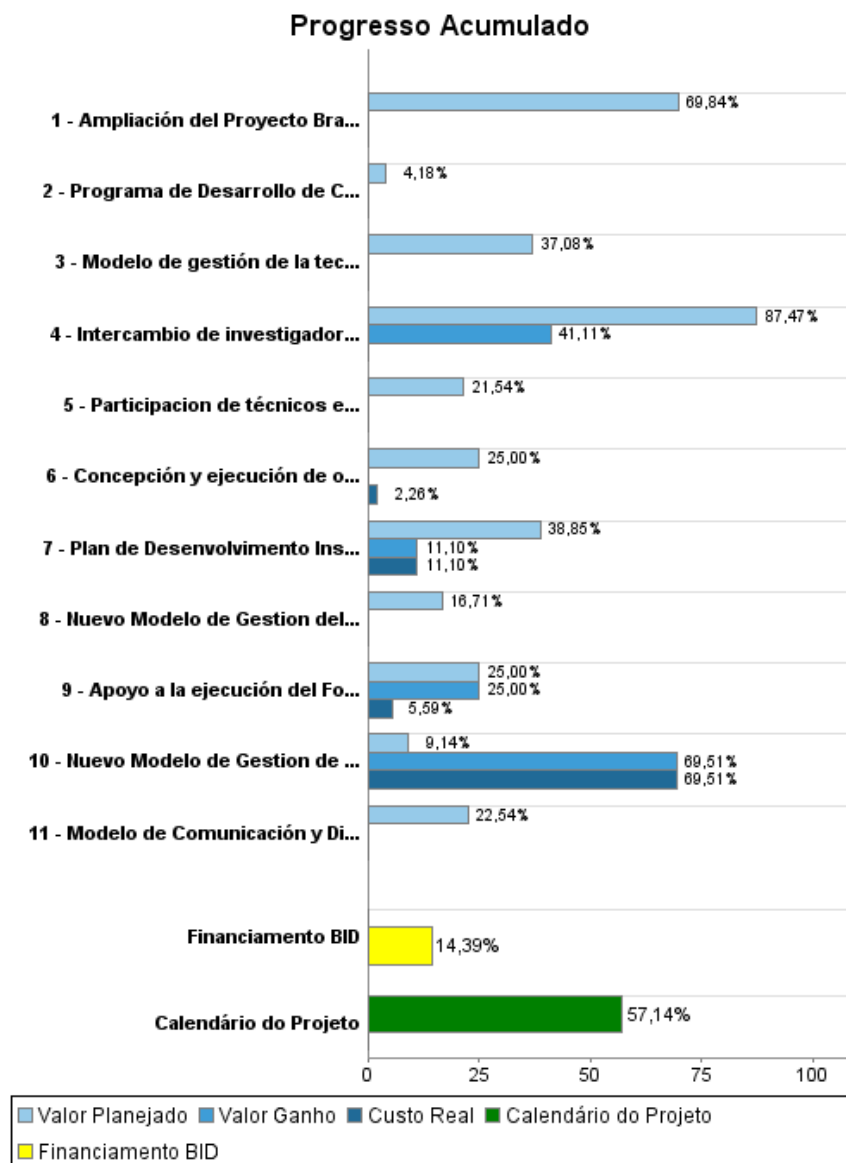

Resultados

| | |
|-------------------|---|
| Resultado: | Proyectos que fortalezcan la capacidad de investigación, la formulación, el acompañamiento y la evaluación de las políticas públicas desarrollados. |
|-------------------|---|

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2014 | Final do Projeto |
|---|----------------|------------|----------------|--------|-------|------------------|
| Proyectos estructuradores realizados y publicados | Proyectos | | 2009 | P A | 25,00 | 25,00 |

| | |
|-------------------|--|
| Resultado: | Cooperación con investigadores y entidades nacionales e internacionales fortalecidos |
|-------------------|--|

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2014 | Final do Projeto |
|--|----------------|------------|----------------|--------|-------|------------------|
| Número de estudios realizados en coautoría o orientados. | Estudios | | 2009 | P A | 20,00 | 20,00 |

| | |
|-------------------|--|
| Resultado: | Desempeño del programa conforme a lo planeado y con buena ejecución tanto financiera como de consecución de los objetivos del programa |
|-------------------|--|

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

| Descrição | Unidade de medida | Físico | | | | Financeiro | | | |
|--|----------------------|-----------|-------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Planejado | Atual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planejado | Atual | Custos Acumulados | Custos FDP |
| Desarrollo de Proyectos Estructuradores | | | | | | | | | |
| Ampliación del Proyecto Brasil: El Estado de una Nación | Proyectos realizados | | | | 2,00 | | | | 1.507.500,00 |
| Concepción y ejecución de otros proyectos estructuradores | Proyectos | 5,00 | | | 20,00 | 875.550,00 | 79.236,00 | | 3.502.200,00 |
| Cooperación e intercambio nacional e internacional | | | | | | | | | |
| Intercambio de investigadores visitantes y especialistas. | Intercambios | 2,00 | | | 10,00 | 25.000,00 | | | 476.548,62 |
| Participación de técnicos en congresos y eventos científicos | Técnicos | 5,00 | | | 20,00 | 20.000,00 | | | 92.862,00 |
| Apoyo a la ejecución del Foro Nacional | Evento | 1,00 | 1,00 | | 4,00 | 189.281,09 | 42.309,00 | | 757.124,38 |
| Desarrollo institucional | | | | | | | | | |
| Plan de Desarrollo Institucional implantado | Modelo | | | | 1,00 | 50.000,00 | | | 180.195,00 |
| Programa de Desarrollo de Competencias en conformidad con la planificación estratégica de IPEA | Programa | | | | 1,00 | 13.075,00 | | | 313.075,00 |
| Nuevo Modelo de Gestión del Conocimiento | Modelo | | | | 1,00 | 30.000,00 | | | 179.550,00 |
| Nuevo Modelo de Gestión de Proyectos de Investigación | Modelo | | | | 1,00 | 20.000,00 | 152.062,00 | | 218.750,00 |
| Modelo de gestión de la tecnología de información (TI) y adquisición de equipos y software para la modernización del aparato tecnológico | Modelo | | | | 1,00 | 200.000,00 | | | 539.430,00 |
| Modelo de Comunicación y Disseminación de la Producción para el gran público | Modelo | | | | 1,00 | 20.000,00 | | | 88.750,00 |
| Administración general y gastos indirectos | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.442.906,09 | 273.607,00 | | 7.855.985,00 |
