
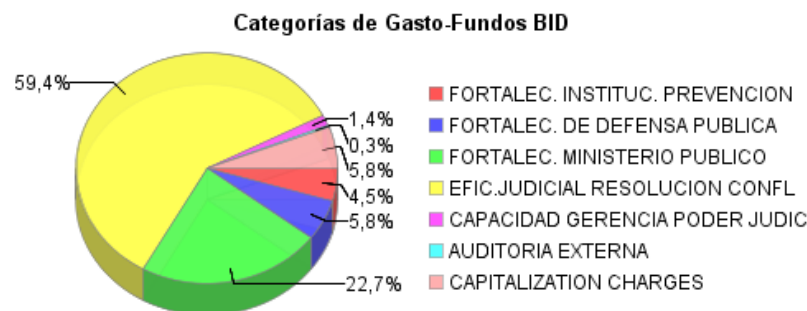
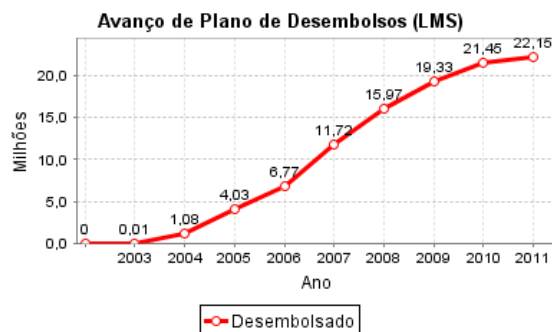



## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA		
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE		
Número da Operação: 1377/OC-CR	Atual: 22.400.000,00	Original BID: 22.400.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 22.148.987,90	Corrente BID: 22.400.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 98,88	Pari-passu: 70,00
Operação Relacionada:	Saldo: 251.012,10	Cofinanciamento/País: 9.600.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 32.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 228

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B13(R)	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 26, 2011 Validado pelo Representante do País: Nov 7, 2011

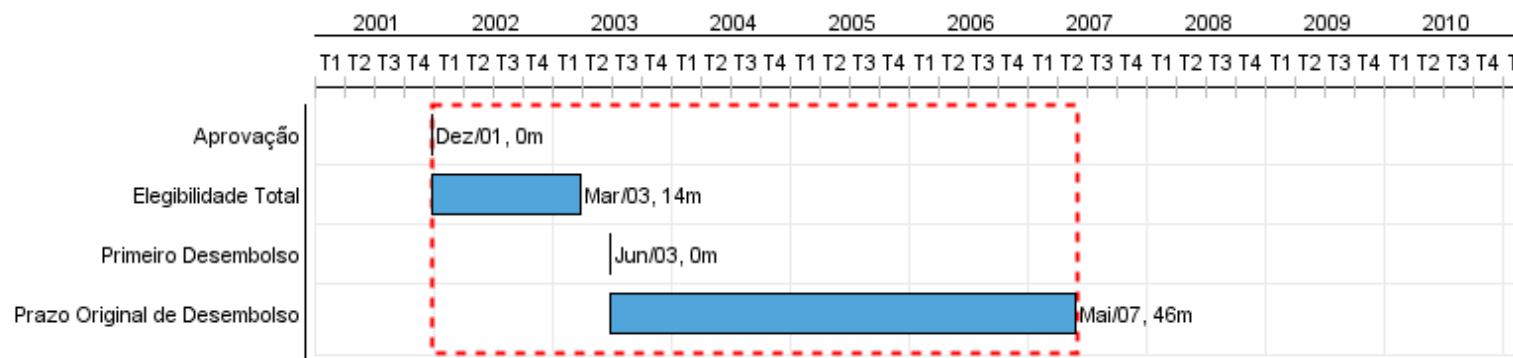

## Progresso Acumulado até 2011

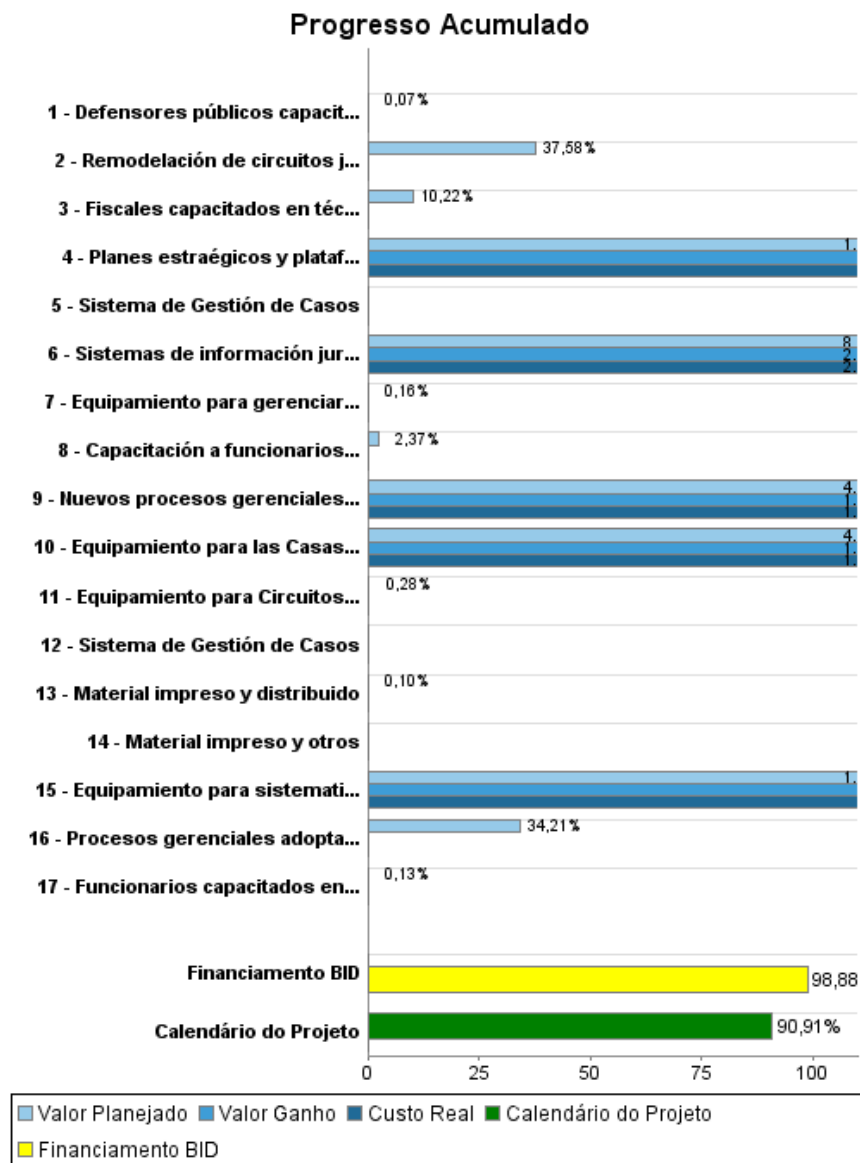

## Resultados

**Resultado:** Eficiencia de la Administración de justicia mejorada.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2003	2005	2008	2009	Final do Projeto
Tasa de congestión global.	casos registrados	1,58	2002	P					0,00
				A	1,63	2,02	2,14	2,31	
Tasa de resolución de casos ingresados	casos registrados	61,20	2001	P					0,00
				A	61,40	49,40	46,80	43,30	
Costo medio de caso terminado (US\$)	USA dolar	401,00	2001	P					0,00
				A	436,30	425,00	529,20	539,70	

**Resultado:** Transparencia de la Administración de la Justicia mejorada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2003	2005	2008	2009	Final do Projeto
Encuesta anual de percepción ciudadana.	Escala de 1 a 5 (1 muy bajo, 5 muy alto)	3,00	2003	P	3,29		4,00		4,00
				A					

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>CAPACIDAD DE GERENCIA DEL PODER JUDICIAL (Proyecto E)</b>									
Nuevos procesos gerenciales adoptados y en funcionamiento	estudios	3,00				80,00			219.000,00
Equipamiento para gerenciar sistemas de información adquiridos y en funcionamiento	unidades	3,00				160,00			100.000,00
<b>FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO PUBLICO (Proyecto C)</b>									
Planes estratégicos y plataformas tecnológicas adoptados y en funcionamiento	estudios					1.287.700,00			2.325.000,00
Equipo informático para sistemas de información adquirido y en funcionamiento	unidades								2.250.000,00
Fiscales capacitados en técnicas de gestión	fiscales				150,00	53.150,00			520.000,00
Sistema de Gestión de Casos	sistema				1,00				
Material impreso y otros	unidades					6.000,00			
<b>Fortalecimiento institucional para la prevención del Delito. (PROYECTO A)</b>									
Equipamiento para las Casas de Justicia adquirido y en funcionamiento	estudios				6,00				189.000,00
Funcionarios capacitados en materia de prevención del delito	funcionarios					420,00			311.300,00
Políticas nacionales de prevención del delito adoptadas y en funcionamiento	estudios								426.300,00
Material impreso y distribuido	unidades					90,00			92.500,00
<b>FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA PUBLICA. (Proyecto B)</b>									
Equipamiento para sistematización de gestión de casos adquirido y en funcionamiento	unidades								700.000,00
Procesos gerenciales adoptados y en funcionamiento	estudios					171.710,00			502.000,00
Defensores públicos capacitados en gestión integral de casos	defensores públicos					70,00			97.000,00
Sistema de Gestión de Casos	sistema				1,00				
<b>Eficiencia Judicial en la resolución de conflictos (PROYECTO D)</b>									
Sistemas de información jurídica adoptados y en funcionamiento	estudios					7.560,00			894.800,00
Equipamiento para Circuitos Judiciales adquirido y en funcionamiento	unidades					21.650,00			7.686.111,00
Remodelación de circuitos judiciales concluida	m2					1.658.250,00			4.412.890,00

## RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

CR0141 - Judiciary Modernization Program II  
2011 1º período com fechamento em (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 05/09/2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Capacitación a funcionarios judiciales concluida	funcionarios judiciales					7.240,00			306.088,00
<b>ADMINISTRACION, AUTORIA EXTERNA, IMPREVISTOS Y GASTOS FINANCIEROS</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>3.214.080,00</b>			<b>21.031.989,00</b>
