
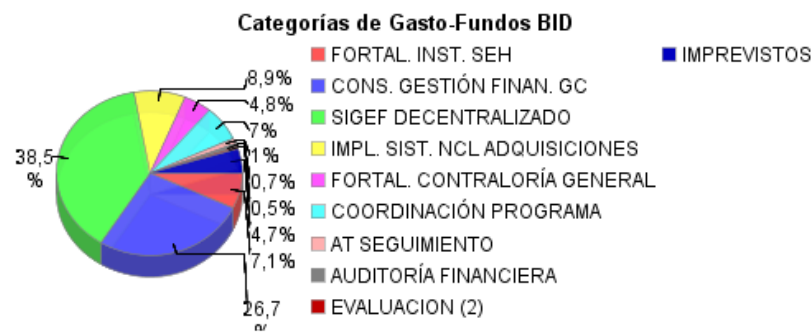
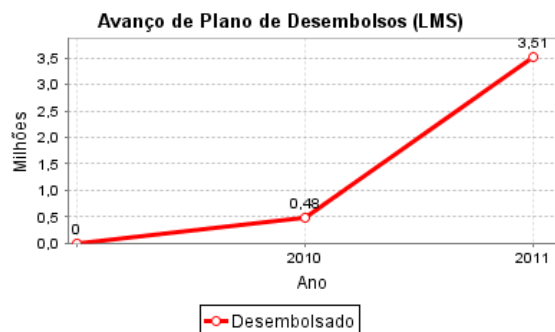



Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA		
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FINANCIAL MANAGEMENT REFORM & MODER		
Número da Operação: 1809/OC-DR	Atual: 21.000.000,00	Original BID: 21.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 3.117.152,01	Corrente BID: 21.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 14,84	Pari-passu: 90,00
Operação Relacionada:	Saldo: 17.882.847,99	Cofinanciamento/País: 2.400.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 23.400.000,00
		Período de Amortização (meses): 204

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B13(R)	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 26, 2011 Validado pelo Representante do País: Sep 29, 2011

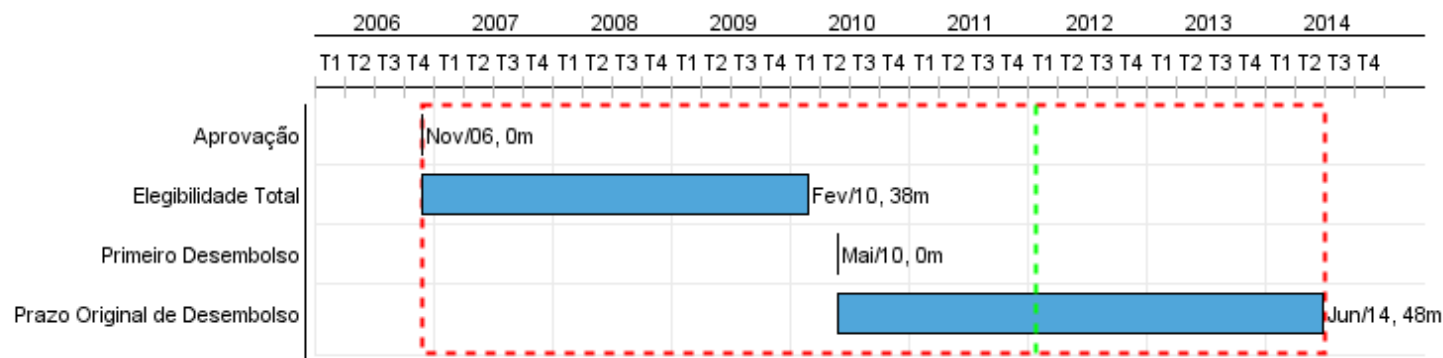

Progresso Acumulado até 2011

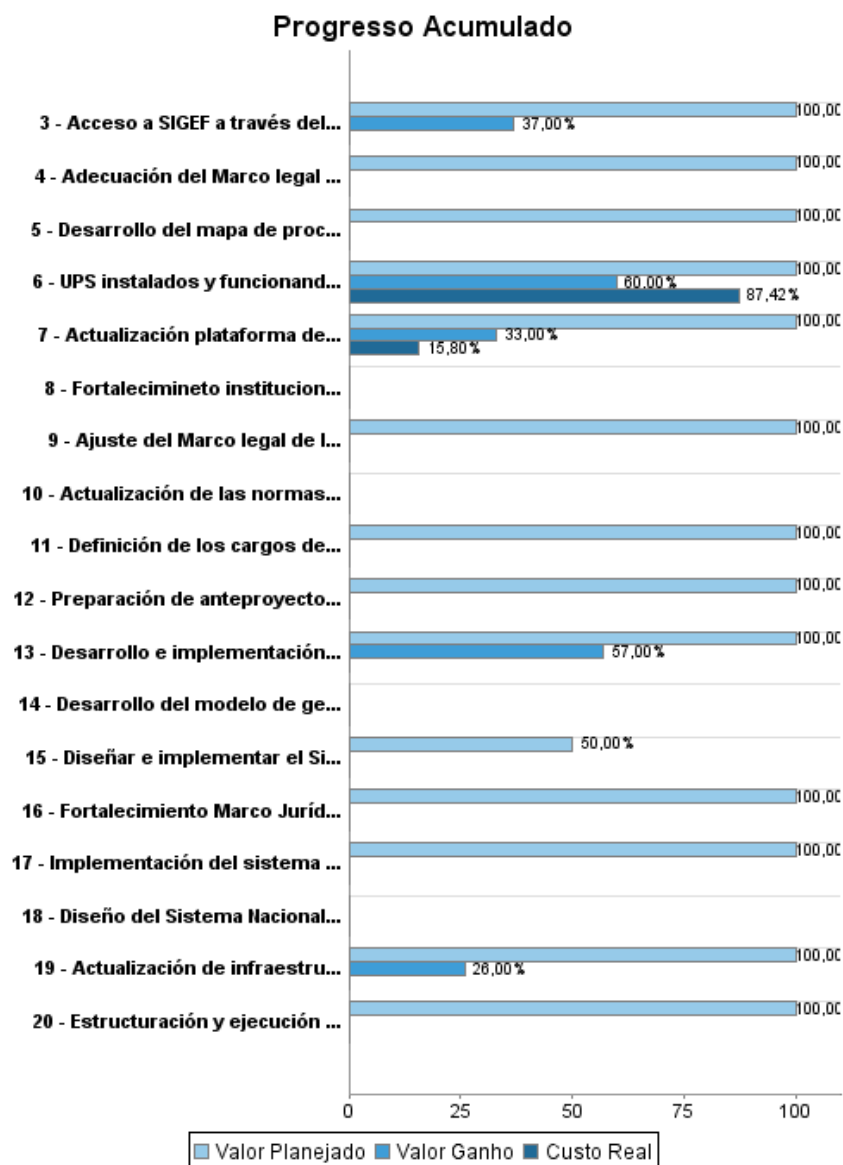

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

DR-L1005 - Modernization of Administration's Public Resources


2011 1º período com fechamento em (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 26/09/2011

Progresso Acumulado

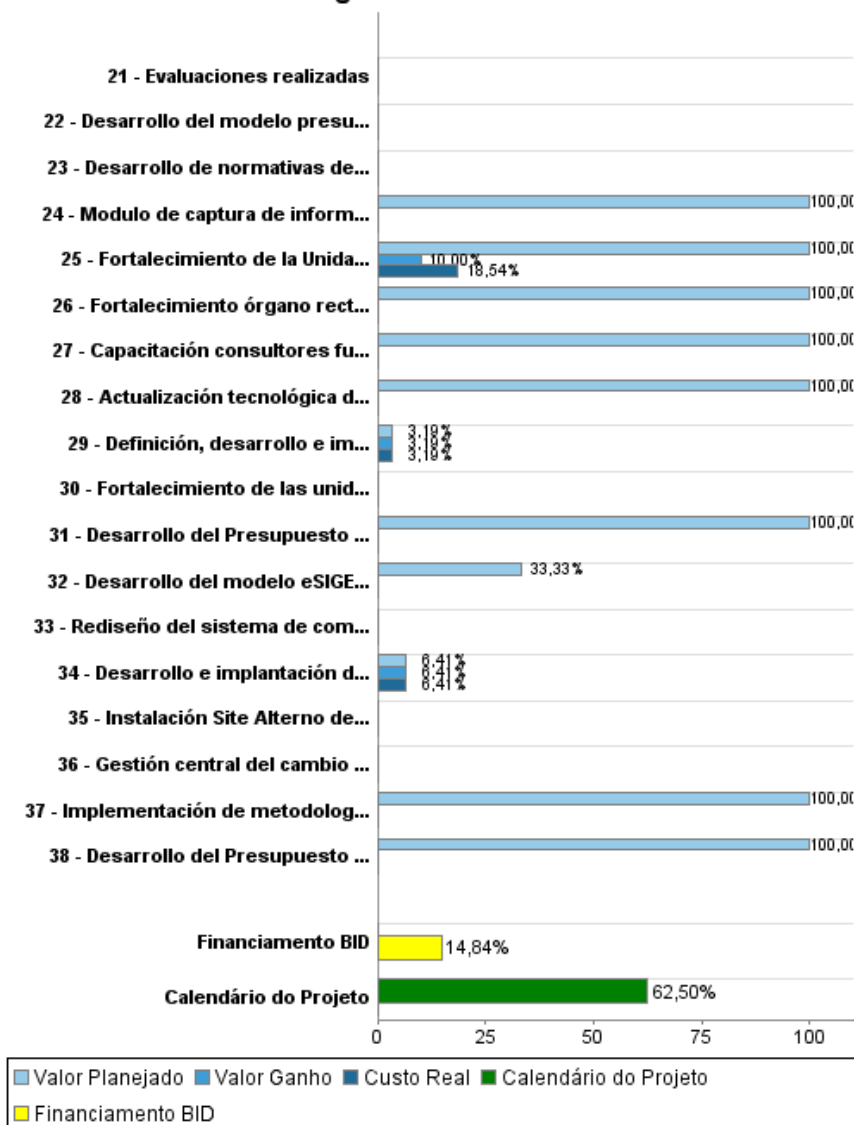

Resultados

Resultado: Información para la toma de decisiones en la política fiscal aumentada.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	Final do Projeto
Ingresos de financiamiento del Gobierno Central captados automáticamente por el SIGEF	porcentaje ingresos	30,00		P A	75,00	100,00
Las compras y contrataciones del gobierno central se llevan a cabo a través de los nuevos módulos de compras y contrataciones y contabilidad del SIGEF.	porcentaje compras			P A	15,00	25,00
Las instituciones que manejan fondos públicos son auditados anualmente.	porcentaje instituciones			P A	25,00	70,00
Gastos de financiamiento del Gobierno Central captados automáticamente por el SIGEF	porcentaje gastos	30,00		P A	75,00	100,00
Operaciones de financiamiento del Gobierno Central captados automáticamente por el SIGEF	porcentaje operaciones	40,00		P A	80,00	100,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Estado de Finanzas (SEF)									
Adecuación del Marco legal de la administración financiera a la constitución vigente	anteproyecto de ley	4,00			4,00	91.900,00			91.900,00
Preparación de anteproyecto de ley del "Sistema de Administración de Bienes Nacionales"	anteproyecto de ley	1,00			1,00	36.300,00			36.300,00
Fortalecimiento de la Unidad de Análisis Política Y Fiscal	unidad política fiscal	1,00	0,10		1,00	216.750,00	40.175,78		216.750,00
Estructuración y ejecución de la oferta académica en adm. financiera	oferta académica	1,00			1,00	96.780,00			96.780,00
Implementación del sistema de educación a distancia (via internet)	convenio de coop. e-learning	1,00			1,00	20,00			20,00
Definición de los cargos de la carrera especializada en Finanzas Publicas y socialización de la carrera	carrera en Finanzas Pub.	1,00			1,00	43.950,00			43.950,00
Fortalecimiento institucional de órganos rectores	manuales de organización y funciones				2,00				35.000,00
Consolidación de la Reforma de la Gestión Financiera del Gobierno Central									
Capacitación consultores funcionales e informáticos del PAFI	consultores	49,00			49,00	72.250,00			72.250,00
UPS instalados y funcionando para centro de datos	UPS	1,00	0,60		1,00	80.781,00	70.617,21		80.781,00
Implementación de metodología y herramientas para el desarrollo y documentación del SIGEF	metodologías y herramientas	3,00			3,00	57.870,00			57.870,00
Actualización plataforma desarrollo del SIGEF	Sistemas	1,00	0,33		1,00	179.450,00	28.350,00		179.450,00
Desarrollo del mapa de procesos de la administración financiera	mapas de procesos	6,00			6,00	67.425,00			67.425,00
Desarrollo del Presupuesto Orientado a Resultados (POR)	POR	1,00			1,00	126.850,00			126.850,00
Desarrollo del Presupuesto Plurianual	Presupuesto Plurianual	1,00			1,00	63.600,00			63.600,00
Definición, desarrollo e implementación de la cuenta única (CUT)	Cuenta única				1,00		15.000,00		469.817,00
Desarrollo de normativas de Contabilidad Gubernamental	Normativa desarrollada				1,00				127.850,00

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Desarrollo e implantación del módulo de gestión financiera de la nómina del SIGEF	Módulo nómina				1,00		16.200,00		252.850,00
Modulo de captura de información financiera del SPNF implementado y ampliada la base de datos del SIGEF	Modulo	1,00			1,00	121.600,00			121.600,00
Evaluación Informática del SIGEF	Evaluación SIGEF				1,00				71.062,00
Desarrollo del Sistema de Administración Financiera en las Instituciones Descentralizadas y Autónomas.									
Desarrollo e implementación de un datawarehouse y consulta del ciudadano	Datawarehouse	1,00	0,57		1,00	156.550,00			156.550,00
Acceso a SIGEF a través del internet	acceso a internet	1,00	0,37		1,00	1.273.000,00			1.273.000,00
Actualización de infraestructura tecnológica del SIGEF	Infraestructura	1,00	0,26		1,00	2.560.000,00			2.560.000,00
Instalación Site Alterno del SIGEF	Site alternativo				1,00				539.000,00
Desarrollo del modelo eSIGEF para 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social	Sistemas				34,00	50.400,00			151.200,00
Desarrollo del modelo presupuesto eSIGEF para 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social	Sistemas				34,00				98.000,00
Desarrollo del modelo de gestión financiera y contable del eSIGEF para 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social	Sistemas				34,00				1.087.700,00
Gestión central del cambio en la implantación del eSIGEF en 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social	Instituciones				34,00				504.000,00
Fortalecimiento órgano rector de compras y contrataciones	Institución	1,00			1,00	293.650,00			293.650,00
Fortalecimiento de la Gestión de Compras y Contrataciones.									
Fortalecimiento Marco Jurídico de compras y contrataciones	anteproyecto ley modificación adquisiciones públicas	1,00			1,00	115.200,00			115.200,00

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Rediseño del sistema de compras y contrataciones y portal único de adquisiciones	Sistema compras y contrataciones				1,00				450.200,00
Actualización tecnológica de infraestructura del sistema de compras	Infraestructura	1,00			1,00	657.580,00			657.580,00
Fortalecimiento de las unidades gestoras de compras y contrataciones	Unidades				1,00				127.850,00
Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General e implementación del sistema de control interno									
Ajuste del Marco legal de la CGR	Anteproyecto ley SINACI	1,00			1,00	42.950,00			42.950,00
Actualización de las normas básicas de Control Interno	Normas Control Interno				1,00				124.800,00
Diseño del Sistema Nacional de Control Interno (SINACI)	Sistema				1,00				251.800,00
Diseñar e implementar el Sistema de Auditoría Interna Gubernamental	Sistema				1,00	310.700,00			621.400,00
Componentes no inversión									
Auditorías financieras ejecutadas	auditoría	1,00	0,11		4,00	24.500,00	18.953,75		98.000,00
Evaluaciones realizadas	evaluación				2,00				35.000,00
Costos financieros									
TOTAL						6.740.056,00	189.296,74		11.399.985,00
