
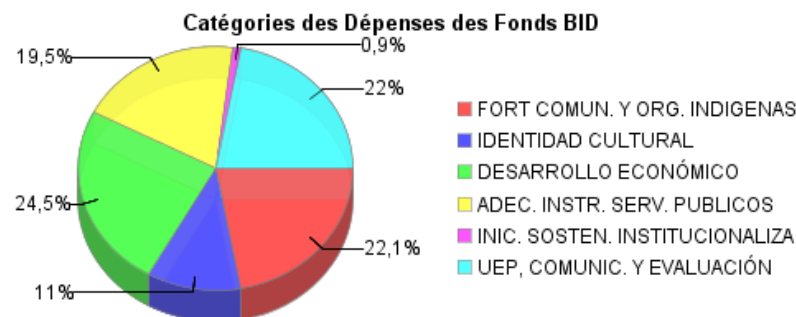
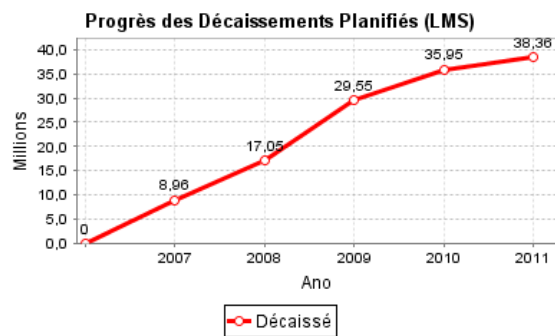



## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA				
Secteur:	SOCIAL INVESTMENT-INDIGENOUS GROUPS SUPPORT				
Numéro(s) de Prêt(s):	1784/OC-CH	Montant Courant Approuvé:	45.200.000,00	Initial BID:	45.200.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	38.356.072,42	Courant BID:	45.200.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	84,86	Pari Passu:	41,00
Opération(s) Connexe(s):	CH-T1026, CH-T1110	Solde:	6.843.927,58	Cofinancement/Pays:	64.700.000,00
Sous-Type de l'Opération:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Estimation Initiale:	109.900.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	108

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: C	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Sep 29, 2011 Validé par le Représentant: Sep 30, 2011

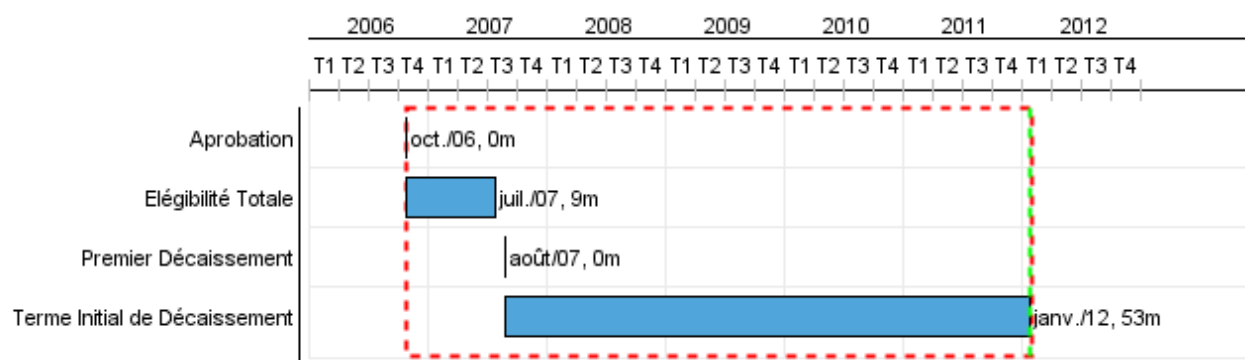

## Progrès Cumulé à 2011

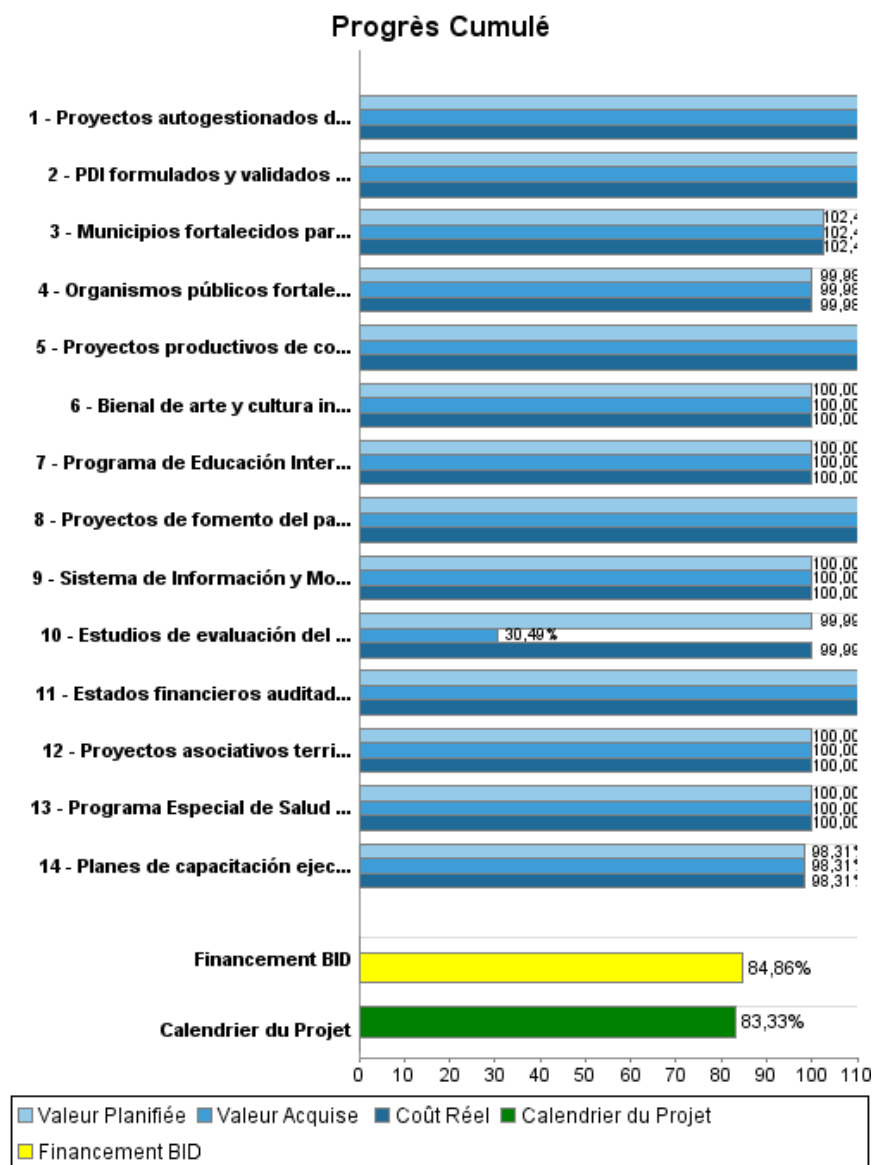

## Résultats

<b>Résultat:</b>	DESARROLLO CON IDENTIDAD DE COMUNIDADES INDÍGENAS RURALES de CHILE FORTALECIDO.
<b>Suposições:</b>	Se mantiene el compromiso de las instituciones públicas asociadas al Programa como organismos subejecutores, de continuar brindando servicios con pertinencia cultural a las comunidades indígenas rurales.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Familias indígenas beneficiarias aumentan sus activos y su capacidad de generar ingresos autónomos	% familias		2006	P		60,00
				A	72,30	
Nivel de satisfacción de comunidades indígenas beneficiarias como usuarios de los instrumentos y prácticas de atención de los servicios públicos asociados al Programa.	Nivel de satisfacción		2006	P		50,00
				A	50,40	
Patrimonio cultural de comunidades indígenas fortalecido	% Comunidades		2006	P		60,00
				A	30,10	

<b>Résultat:</b>	CALIDAD DE VIDA MEJORADA DE COMUNIDADES RURALES AYMARA, QUECHUA, ATACAMEÑO Y MAPUCHE
------------------	--

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES INDIGENAS</b>									
PDI formulados y validados por las propias comunidades	PDI		49,00		202,00		1.956.264,00		10.000.000,00
Planes de capacitación ejecutados con Unidades de Planificación y dirigentes indígenas	Planes Capacitación		4,00		202,00		353.074,00		1.574.074,00
Proyectos autogestionados de sedes comunitarias financiados y rendidos en su totalidad.	Sedes comunitarias		721,00		913,00		7.639.877,00		6.639.877,00
<b>IDENTIDAD CULTURAL</b>									
Proyectos de fomento del patrimonio cultural ( conocimientos de sistemas de vida tradicionales, apoyo a las expresiones de arte y promoción y difusión cultural) seleccionados en los PDI, ejecutados y rendidos.	Proyectos		785,00		948,00		3.211.414,00		9.088.515,00
<b>DESARROLLO ECONOMICO DE FAMILIAS Y COMUNIDADES</b>									
Proyectos asociativos territoriales financiados y en ejecución	proyectos		2,00		20,00		5.966.704,00		6.203.704,00
Proyectos productivos de comunidades indígenas financiados por el FDL, ejecutados y rendidos	proyectos		3.255,00		6.091,00		39.064.236,00		31.809.802,00
<b>ADECUACION DE INSTRUMENTOS Y PRACTICAS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS</b>									
Programa de Educación Intercultural Bilingue ( PEIB) fortalecido en nuevas escuelas rurales.	Escuelas		78,00		120,00		1.568.000,00		8.000.000,00
Programa Especial de Salud para Pueblos Indígenas (PESPI) fortalecido mediante nuevos modelos de salud intercultural en redes asistenciales de salud.	Modelos de salud				3,00		1.265.226,00		6.467.226,00
Organismos públicos fortalecidos para incorporar la pertinencia cultural de sus instrumentos de acción, mediante convenios ejecutados y rendidos en su totalidad.	Convenios		5,00		9,00		1.222.111,00		1.611.111,00
<b>APOYO A INICIATIVAS DE INSTITUCIONALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DEL MODELO DE INTERVENCIÓN ORIGENES</b>									

## RAPPORT DE SUIVI

CH-L1014 - Integrated Development Indigenous Peoples, Phase II  
2011 1º período com fechamento em (30-Jun-2011)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement  
Dernière Mise à Jour: 13/09/2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Municipios fortalecidos para adecuar su gestión a las necesidades de las comunidades mediante convenios financiados y rendidos en su totalidad.	Convenios		18,00		20,00		2.157.239,00		2.777.778,00
<b>UNIDAD EJECUTORA, COMUNICACION SOCIAL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>									
Sistema de Información y Monitoreo (SIIM) diseñado y en operación.	SIIM				1,00		129.532,00		2.879.532,00
Estudios de evaluación del Programa completados	Estudios	2,00			4,00		945.502,00		1.360.502,00
Bienal de arte y cultura indígena realizada	Bienal				1,00		1.002.852,00		1.851.852,00
Estados financieros auditados presentados oportunamente.	EFAs		4,00		5,00		13.798.161,00		12.047.577,00
<b>TOTAL</b>							<b>80.280.192,00</b>		<b>102.311.550,00</b>
