
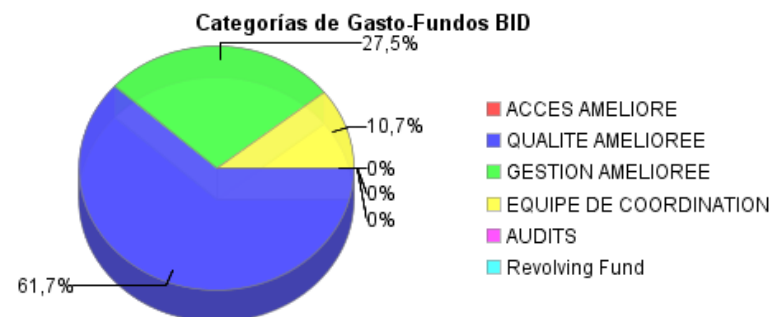
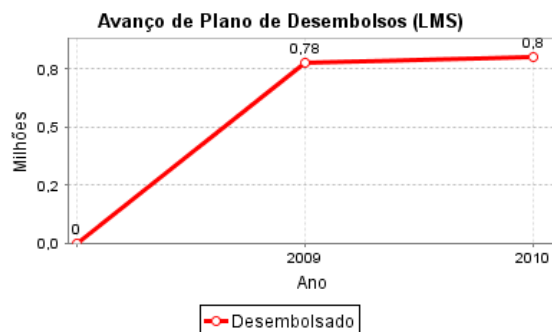


Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DU SPORT		
Sector:	EDUCATION-PRIMARY EDUCATION		
Número da Operação:	2382/GR-HA;1016/SF-HA	Atual: 19.386.091,93	Original BID: 19.490.848,58
Estágio:	Approved	Desembolsado: 19.305.423,16	Corrente BID: 19.386.091,93
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado: 99,58	Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada:	HA-T1063	Saldo: 80.668,77	Cofinanciamento/País: 5.130.000,00
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 24.620.848,58
			Período de Amortização (meses): 354

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 15, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 27, 2011

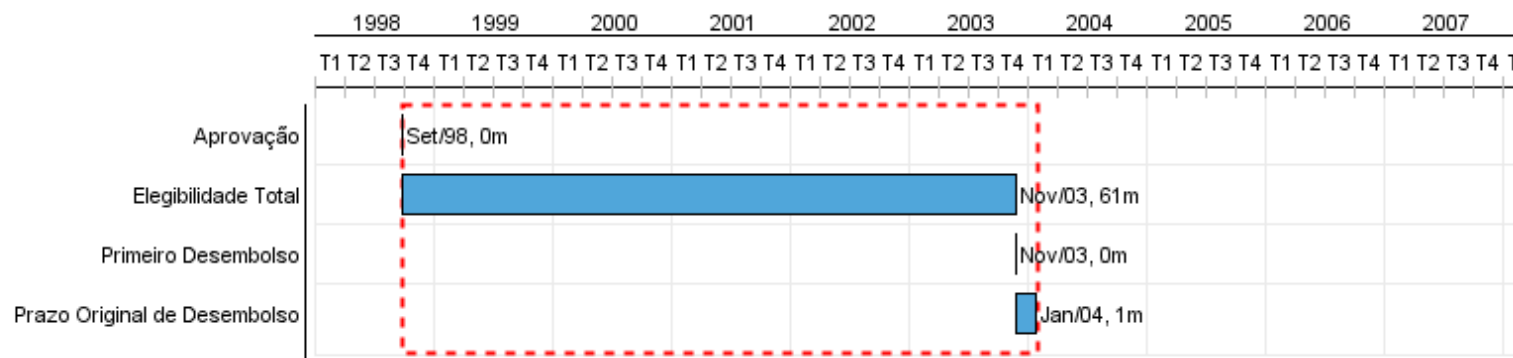

Progresso Acumulado até 2010



Resultados

Resultado:	Rendre les deux premiers cycle de l'école fondamentale plus équitables, efficaces et efficients, en (i) maintenant et améliorant l'accès aux installations scolaires du primaire dans des zones ciblées; (ii) améliorant la qualité de l'éducation primai
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2006	2009	Final do Projeto
Le nombre d'inscription dans les écoles. Il n'y a pas de système de suivi malgré l'insistance de la Banque. Il est donc pas possible d'avoir les données de cet indicateur. Il avait été décidé en septembre 2006, d'inclure cette tâche dans les terme	Taux d'inscription net aux 2 premiers cycles de l'École fondamentale			P A			0,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ									
EFACAP construites, équipées et fonctionnelles à la fin de l'exécution du projet	EFACAP				10,00				
Directeurs des écoles associées et des 10 EFACAP ayant suivis les formations relatives au fonctionnement des EFACAP	Diirecteurs				200,00				
Enseignants ayant suivi l'ensemble des formations offert dans le cadre du Projet	Enseignants				1.200,00				
Les écoles ont reçu des kits didactiques dont le contenu a été accepté par le ministère	Ecoles				200,00				
Les écoles ont reçu au moins un contrat pédagogique qui a été exécuté et évalué	Ecoles				300,00				
Les élèves ont reçu des kits pédagogiques dont le contenu a été accepté par le ministère	Elèves				2.000,00				
AMÉLIORATION DE L'ACCÈS									
Un plan d'entretien conçu selon la stratégie du MENJS approuvé et mise en vigueur	Plan d'entretien				1,00				
Salles de classes avec infrastructures améliorées et équipées selon les normes du MENJS	Salles de classe				304,00				
AMÉLIORATION DE LA CAPACITÉ DE GESTION									
Les bureaux de districts scolaires sont construits et équipés selon les normes du MENJS	Bureaux District Scolaire				25,00				
50 inspecteurs principaux et 240 inspecteurs de zone ont acquis les compétences établies dans le plan de formation des inspecteurs du ministère	Inspecteurs				290,00				
Des comités d'écoles sont mis en place et fonctionnent suivant les normes étalbies par le ministère	Comités d'écoles				150,00				
Le ministère dispose au niveau central, départemental et local d'un système d'information permettant d'enregistrer les données de base du système éducatif haïtien.	Système d'information				1,00				
TOTAL									
