

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE
Número(s) de Préstamo: 1377/OC-CR
Etapa: Approved
Tipo de Operación: INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):
Subtipo de Operación: ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 22.400.000,00
Monto Desembolsado a la fecha: 22.148.987,90
% Desembolsado: 98,88
Saldo: 251.012,10

Costo total y Fuente

BID Original: 22.400.000,00
Actual BID: 22.400.000,00
Pari-passu: 70,00
Co-financiamiento/País: 9.600.000,00
Estimado Original: 32.000.000,00
Período de Amortización (meses): 228

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B13(R)

Reformulación


() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: Sep 26, 2011
Validado por Representante de País: Nov 7, 2011

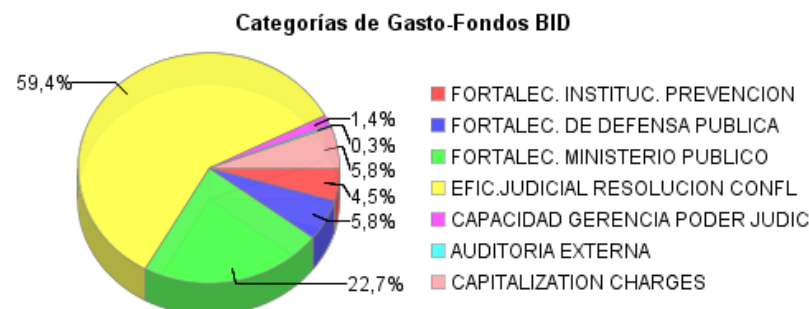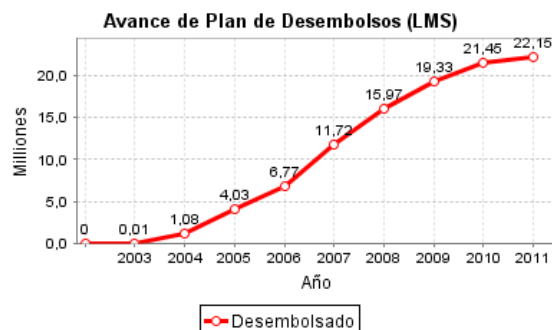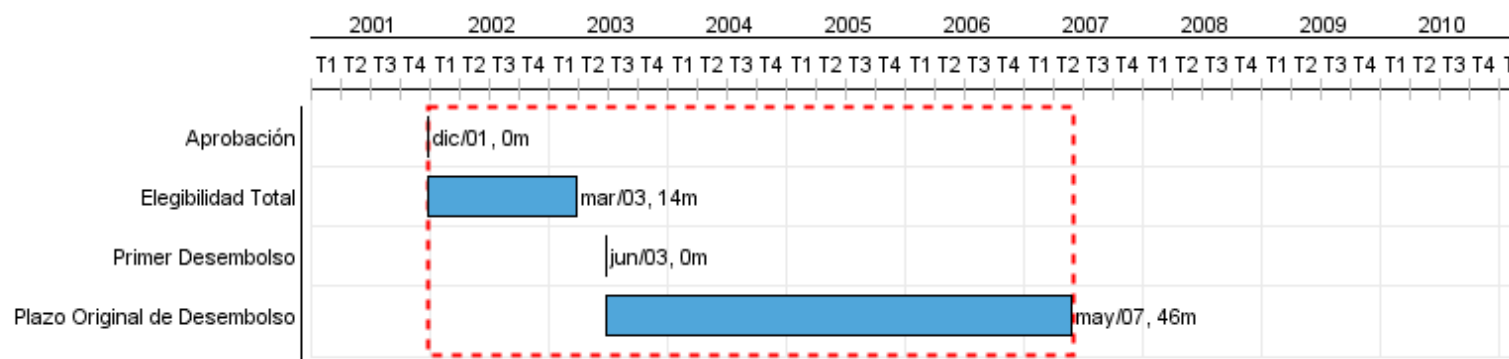

Progreso Acumulado al 2011

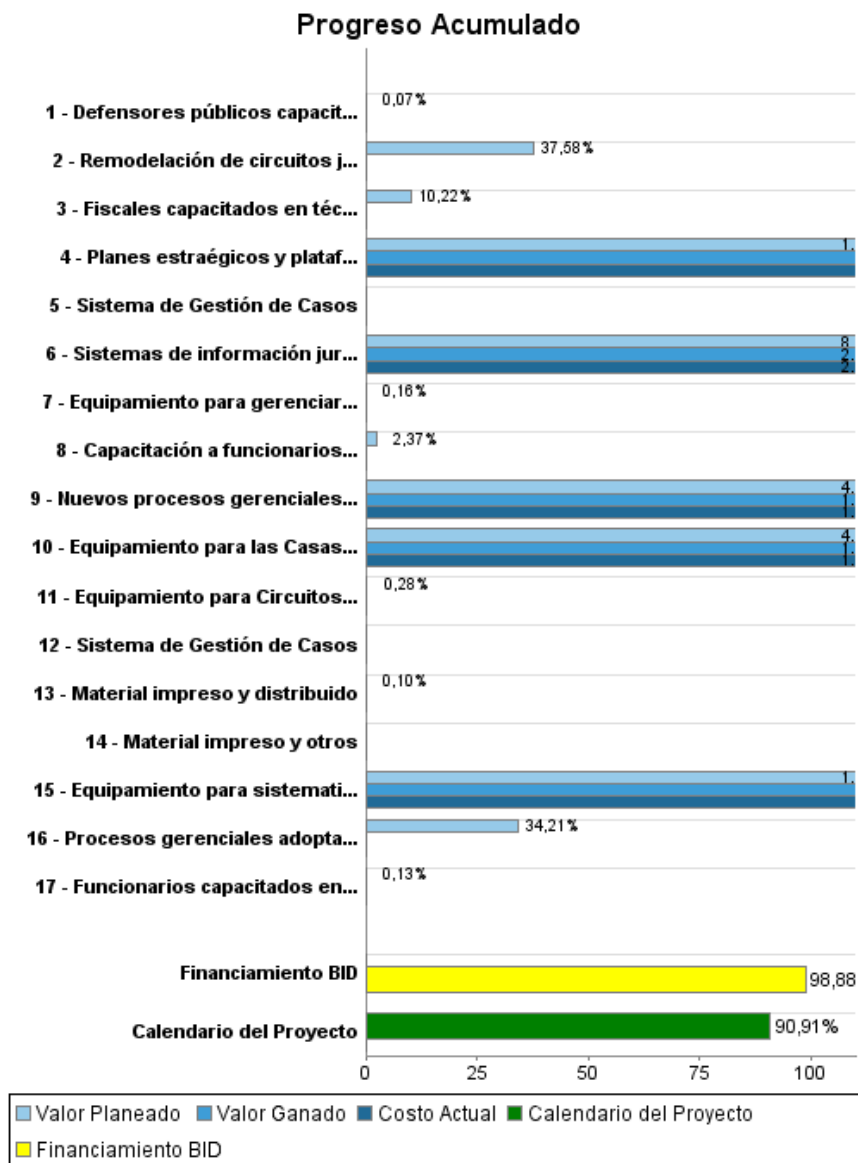

Resultados

Resultado: Eficiencia de la Administración de justicia mejorada.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2003	2005	2008	2009	Fin de Proyecto
Tasa de congestión global.	casos registrados	1,58	2002	P					0,00
				A	1,63	2,02	2,14	2,31	
Tasa de resolución de casos ingresados	casos registrados	61,20	2001	P					0,00
				A	61,40	49,40	46,80	43,30	
Costo medio de caso terminado (US\$)	USA dolar	401,00	2001	P					0,00
				A	436,30	425,00	529,20	539,70	

Resultado: Transparencia de la Administración de la Justicia mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2003	2005	2008	2009	Fin de Proyecto
Encuesta anual de percepción ciudadana.	Escala de 1 a 5 (1 muy bajo, 5 muy alto)	3,00	2003	P	3,29		4,00		4,00
				A					

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
CAPACIDAD DE GERENCIA DEL PODER JUDICIAL (Proyecto E)									
Nuevos procesos gerenciales adoptados y en funcionamiento	estudios	3,00				80,00			219.000,00
Equipamiento para gerenciar sistemas de información adquiridos y en funcionamiento	unidades	3,00				160,00			100.000,00
FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO PUBLICO (Proyecto C)									
Planes estratégicos y plataformas tecnológicas adoptados y en funcionamiento	estudios					1.287.700,00			2.325.000,00
Equipo informático para sistemas de información adquirido y en funcionamiento	unidades								2.250.000,00
Fiscales capacitados en técnicas de gestión	fiscales				150,00	53.150,00			520.000,00
Sistema de Gestión de Casos	sistema				1,00				
Material impreso y otros	unidades					6.000,00			
Fortalecimiento institucional para la prevención del Delito. (PROYECTO A)									
Equipamiento para las Casas de Justicia adquirido y en funcionamiento	estudios				6,00				189.000,00
Funcionarios capacitados en materia de prevención del delito	funcionarios					420,00			311.300,00
Políticas nacionales de prevención del delito adoptadas y en funcionamiento	estudios								426.300,00
Material impreso y distribuido	unidades					90,00			92.500,00
FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA PUBLICA. (Proyecto B)									
Equipamiento para sistematización de gestión de casos adquirido y en funcionamiento	unidades								700.000,00
Procesos gerenciales adoptados y en funcionamiento	estudios					171.710,00			502.000,00
Defensores públicos capacitados en gestión integral de casos	defensores públicos					70,00			97.000,00
Sistema de Gestión de Casos	sistema				1,00				
Eficiencia Judicial en la resolución de conflictos (PROYECTO D)									
Sistemas de información jurídica adoptados y en funcionamiento	estudios					7.560,00			894.800,00
Equipamiento para Circuitos Judiciales adquirido y en funcionamiento	unidades					21.650,00			7.686.111,00
Remodelación de circuitos judiciales concluida	m2					1.658.250,00			4.412.890,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

CR0141 - Programa Mejoramiento Administración Justicia II
2011 1º período con cierre al (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 05/09/2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Capacitación a funcionarios judiciales concluida	funcionarios judiciales					7.240,00			306.088,00
ADMINISTRACION, AUTORIA EXTERNA, IMPREVISTOS Y GASTOS FINANCIEROS									
TOTAL						3.214.080,00			21.031.989,00
