

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE
Número(s) de Préstamo:	1545/SF-NI
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	7.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	4.127.504,71
% Desembolsado:	58,96
Saldo:	2.872.495,29

Costo total y Fuente

BID Original:	7.000.000,00
Actual BID:	7.000.000,00
Pari-passu:	90,00
Co-financiamiento/País:	777.780,00
Estimado Original:	7.777.780,00
Período de Amortización (meses):	354

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Reformulación

Validación


Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: C(R)

() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validado por el Jefe de División: Sep 26, 2011
Validado por Representante de País: Sep 28, 2011

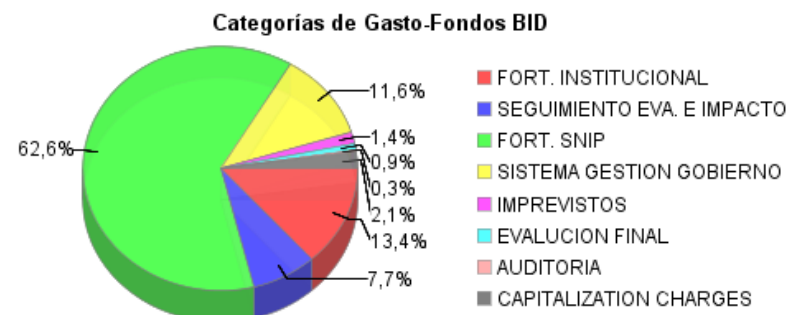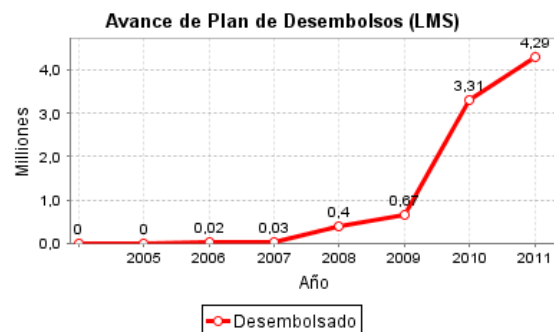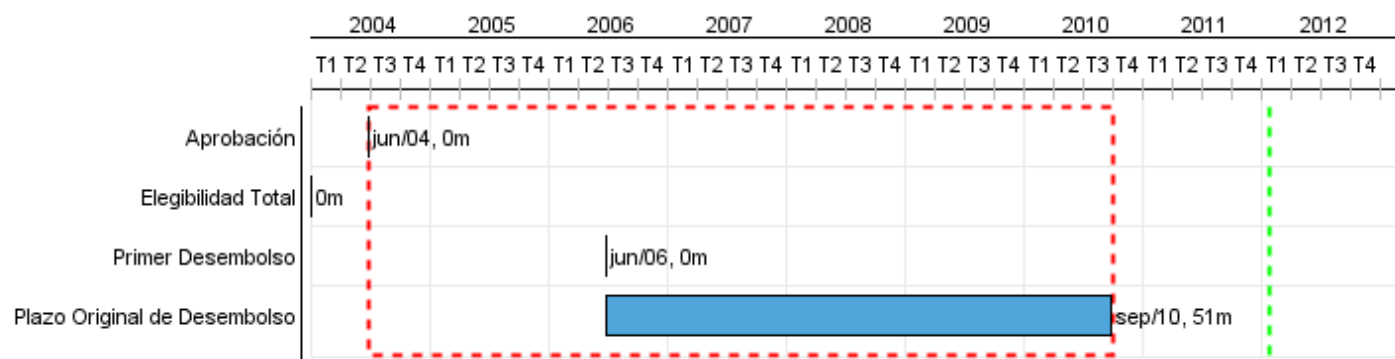

Progreso Acumulado al 2011

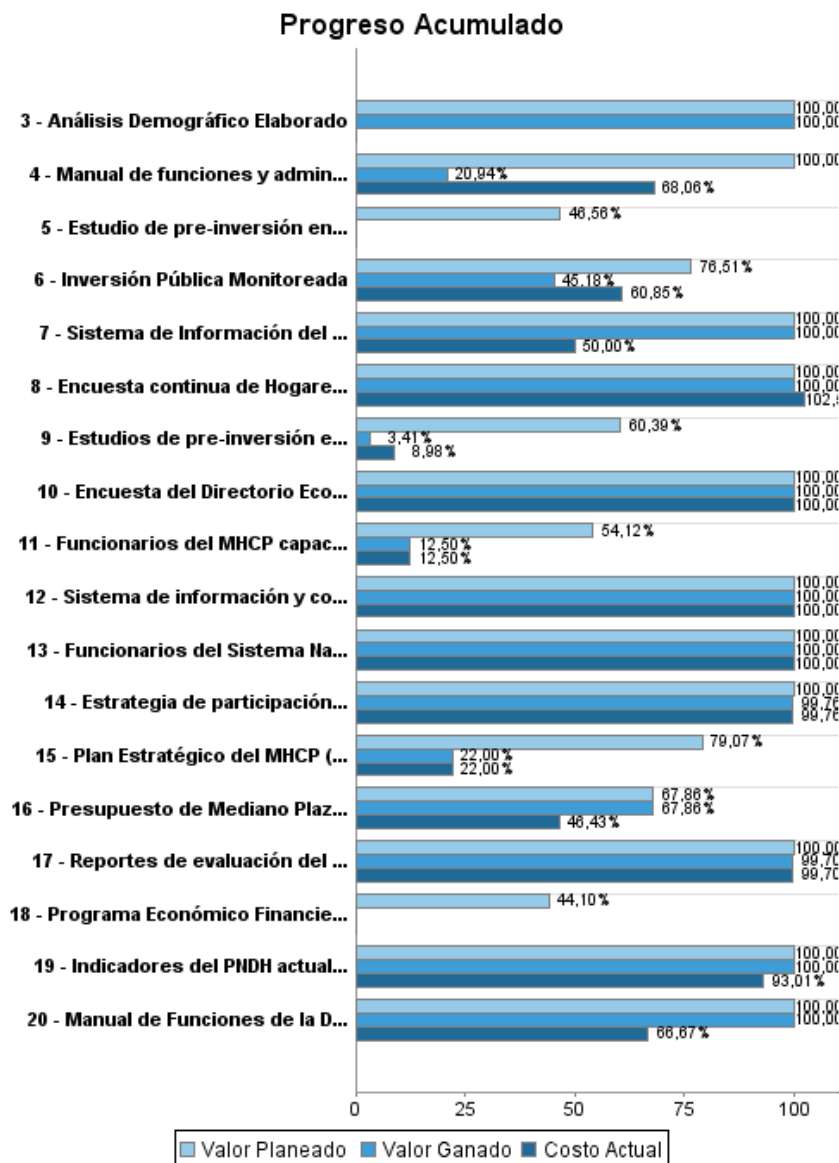


INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

NI0181 - Apoyo Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de la Presidencia
2011 1º período con cierre al (30-Sep-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 12/09/2011

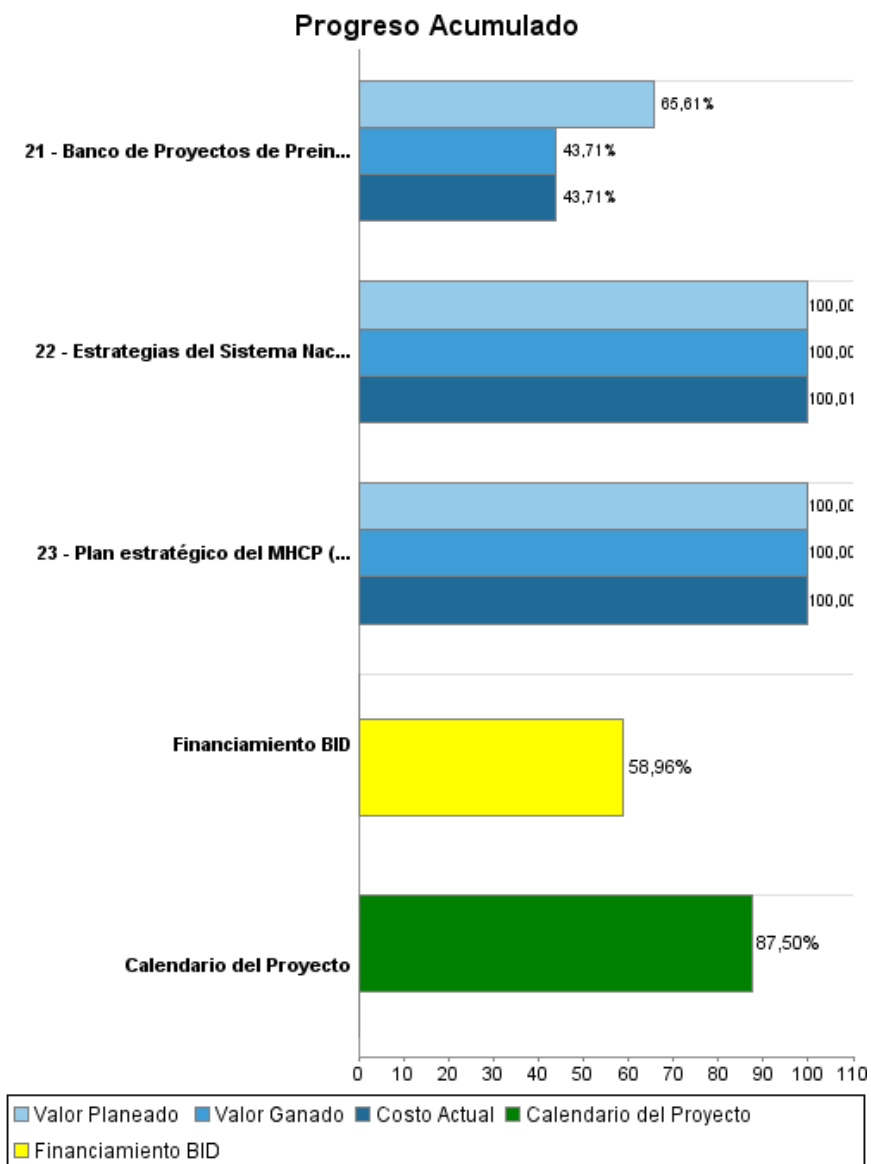

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

NI0181 - Apoyo Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de la Presidencia
2011 1º período con cierre al (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 12/09/2011

Resultados

Resultado:	Capacidad del Gobierno de Nicaragua para el seguimiento a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Humano fortalecida.
Observaciones:	Indicadores Sociales: (i) Partos Institucionales, (ii) Controles de vigilancia y promoción del crecimiento y desarrollo en menores de 1 año, (iii) Gasto Total en Relación al PIB para la Educación Pública; Indicadores Productivos: (i) Viviendas Rurales Electrificadas, (ii) Caminos y Carreteras con mantenimiento y Reparación, (iii) Cobertura de Agua Potable Urbana.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	Fin de Proyecto
Indicadores Sociales y productivos del PNDH varían positivamente en términos de porcentaje al final de la ejecución del programa.	Indicadores		2008	P	6,00	6,00	6,00
				A	1,00	5,00	

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y SEPRES									
Plan estratégico del MHCP (2011 - 2015) aprobado.	Plan Estratégico	1,00	1,00		1,00	3.500,00	3.500,00		50.000,00
Plan Estratégico del MHCP (2011-2015) implementado	Plan Estratégico				1,00	39.533,33	11.000,00		50.000,00
Presupuesto de Mediano Plazo actualizado	Presupuesto de Mediano Plazo	1,00	1,00		3,00	72.000,00	36.000,00		168.000,00
Funcionarios del MHCP capacitados en temas de Gestión Pública	Funcionarios	10,00			70,00	82.861,01			199.091,00
Manual de Funciones de la División de Planificación del MHCP actualizado.	Manual de Funciones	1,00	1,00		1,00	14.400,00	7.200,00		21.600,00
Banco de Proyectos de Preinversión del MHCP elaborado	Banco de proyectos				1,00	63.535,63	30.288,00		151.800,00
Manual de funciones y administrativo financiero de la coordinación de proyectos BID-MHCP elaborado	Manuales	2,00			2,00	10.872,00	6.480,00		13.752,00
Programa Económico Financiero 2011-2012 analizado	Programa				1,00	17.728,65			40.204,00
Estrategia de participación ciudadana elaborada	Estrategia				1,00				5.600,00
Reportes de evaluación del cumplimiento de los indicadores del PNDH en los sectores elaborados.	Reportes				2,00				2.400,00
Seguimiento y Evaluación de impacto del PNDH									
Indicadores del PNDH actualizados.	Sistema de Indicadores	1,00	1,00		1,00	5.680,54	1.412,56		61.081,44
Encuesta nacional de Hogares sobre Medición de Nivel de Vida 2009 realizada	Encuesta				1,00				270.387,87
Encuesta del Directorio Económico Nacional realizada	Encuesta				1,00				223.890,00
Encuesta continua de Hogares para la medición del empleo realizada	Encuesta	1,00	1,00		1,00	13.322,05	17.037,15		148.215,00
Sistema de Información del Programa AMOR desarrollado	Sistema	1,00	1,00		1,00	6.000,00	2.000,00		8.000,00
Análisis Demográfico Elaborado	Análisis Demográfico	1,00	1,00		1,00	5.325,00			5.325,00
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)									

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

NI0181 - Apoyo Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de la Presidencia
2011 1º período con cierre al (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 12/09/2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Inversión Pública Monitoreada	Monitoreo	1,00			3,00	69.768,00	34.884,00		222.731,58
Estudios de pre-inversión en transporte realizados	Estudios	1,00			7,00	817.175,90	79.871,25		1.433.968,93
Estudios de pre-inversión en Agua potable y Saneamiento realizados	Estudios				2,00	219.013,43			1.765.537,12
Estudio de pre-inversión en Energía Eólica realizado	Estudio				1,00	140.961,07			302.723,03
Funcionarios del Sistema Nacional de Inversión Pública capacitados en materia de formulación y evaluación de proyectos de inversión pública.	Funcionarios				240,00				147.885,00
Sistema de información y coordinación de la Gestión de Gobiernos (SEPRES)									
Sistema de información y coordinación de la gestión de Gobierno (SIGRUN) implementado.	SICOGG (SIGRUN)	1,00	1,00		1,00	88.351,29	88.351,29		512.364,89
Estrategias del Sistema Nacional de Planificación Evaluadas	Estrategias	1,00	1,00		3,00	85.171,81	85.205,24		362.550,00
Gestión del Programa									
TOTAL						1.755.199,71	403.229,49		6.167.106,86
