
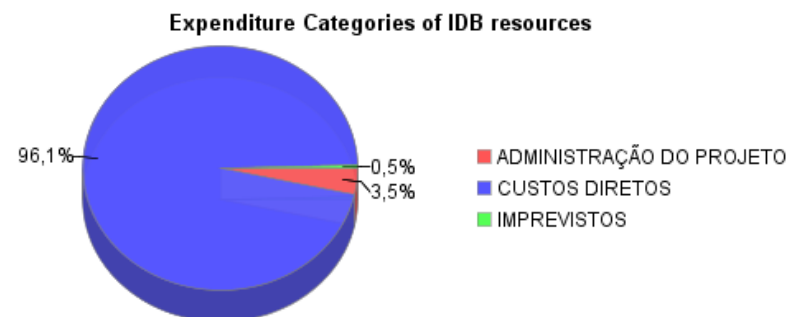
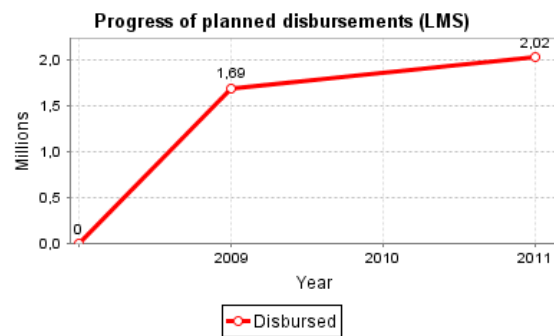



## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	ESTADO DO PARA				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT				
Loan Number(s):	2078/OC-BR	Current Approved Amount:	10.000.000,00	Original IDB:	10.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	1.691.919,98	Current IDB:	10.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	16,92	Pari-passu:	71,00
Related Operation(s):	BR-X1005, BR-L1174	Balance:	8.308.080,02	Co-Financing/Country:	4.000.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	14.000.000,00
				Amortization Period (months):	186

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category:	C ( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Sep 26, 2011 Validated by Country Representative: Sep 27, 2011

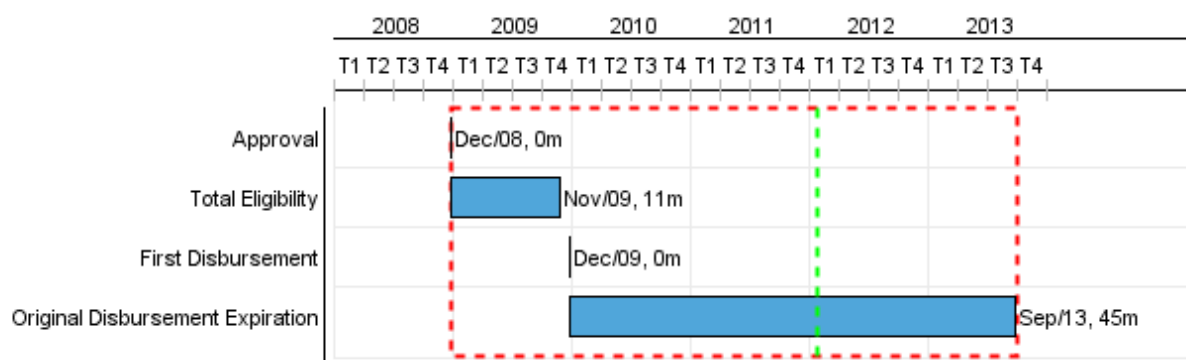


## Accumulated Progress as of 2011

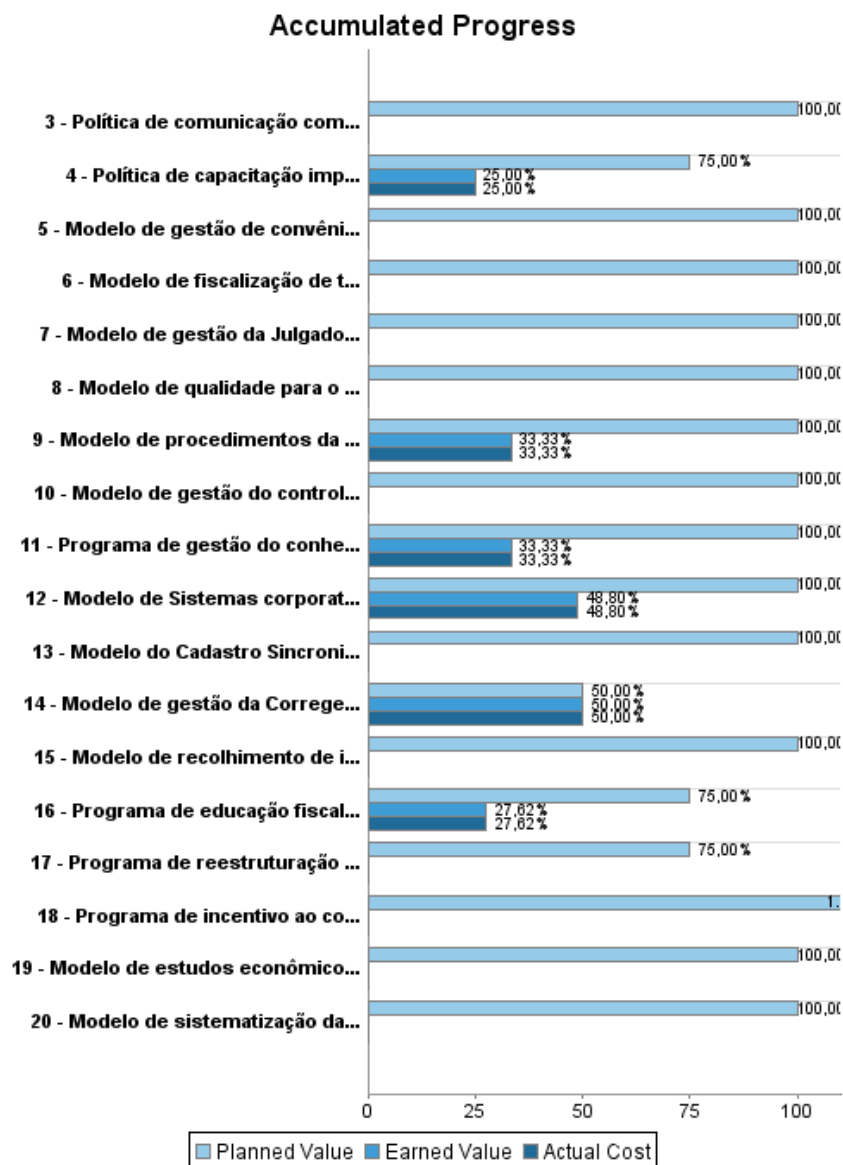

## PROGRESS MONITORING REPORT

BR-L1093 - Program Support Fiscal Management Modernization Transparency State Pará  
-PROGEFAZ  
2011 1st period with closure up to (30-Sep-2011)

### Accumulated Progress

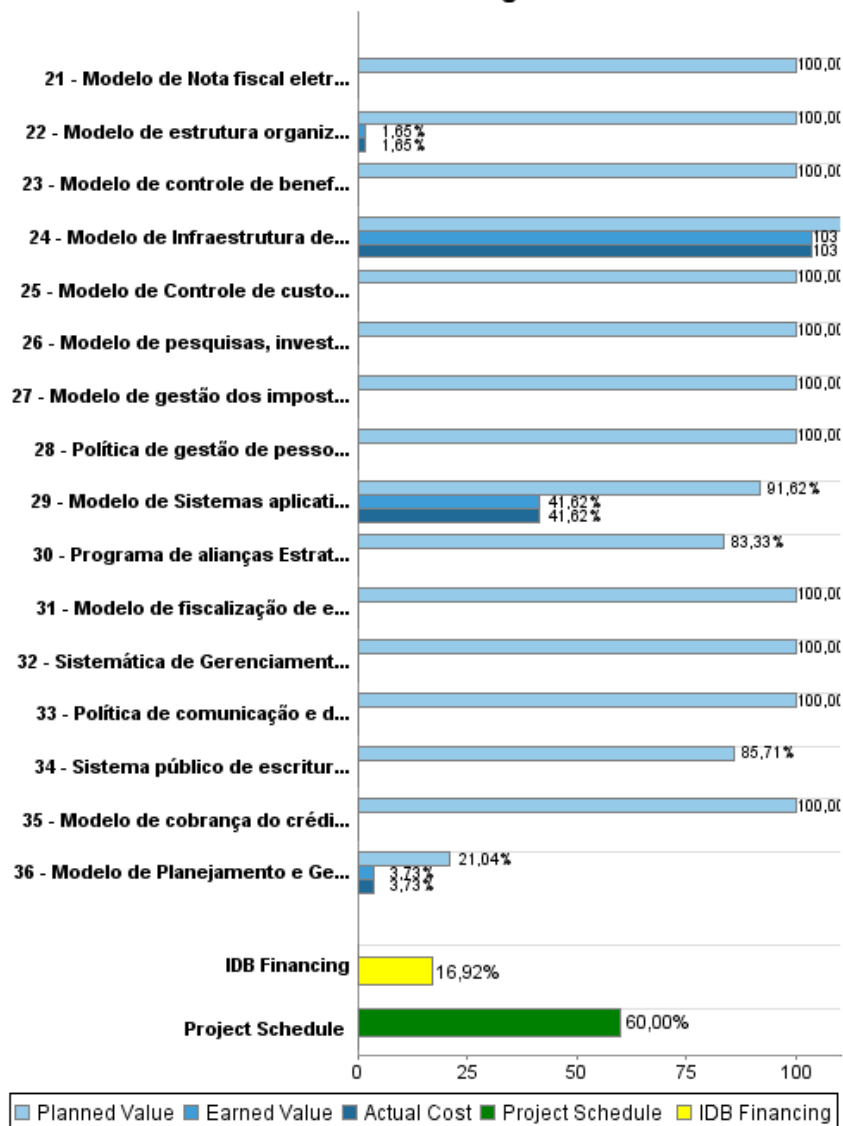

## Outcomes

**Outcome:** 1 - Custo da administração fazendária em relação à arrecadação própria reduzido

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Custo da administração fazendária / arrecadação própria	%	4,00	2006	P				3,50		3,50
Gobierno de Para	Governments		2006	P					1,00	1,00
				A						

**Outcome:** 2 - Consumo de energia elétrica das unidades reformadas e do Órgão Central reduzido

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Consumo total de energia elétrica das unidades fazendárias (kWh)	kWh	5.104.376,00	2006	P			4.900.201,00	4.849.157,00		4.849.157,00
				A						

**Outcome:** 3 - Número de micro empresas e empresas de pequeno porte cadastradas incrementado

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
micro empresas e empresas de pequeno porte	Empresas	10.583,00	2006	P		11.083,00	12.583,00	14.800,00		14.800,00
				A						

**Outcome:** 4 - Arrecadação proveniente do segmento de comércio atacadista incrementada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Arrecadação proveniente do segmento de comércio atacadista em 2006 (7%-2011 e 8%-2012)	R\$	947.955.415,00	2006	P			1.014.321,00	1.095.457,00		1.095.457,00
				A						

**Outcome:** 5 - Índice de inadimplência do IPVA reduzido

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Número de guias do IPVA pagas / Total de guias do IPVA emitidas	%	25,00	2006	P			20,00	15,00		15,00
				A						

**Outcome:** 6 - Arrecadação do ITCD incrementada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Arrecadação do ITCD	R\$	2.493.905,00	2006	P				3.740.858,00		3.740.858,00
				A						

# PROGRESS MONITORING REPORT

BR-L1093 - Program Support Fiscal Management Modernization Transparency State Pará  
-PROGEFAZ  
2011 1st period with closure up to (30-Sep-2011)

Inter-American Development Bank - IDB  
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 22/09/2011

**Outcome:** 7 - Arrecadação proveniente de micro empresas e empresas de pequeno porte incrementada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Arrecadação das micro empresas e empresas de pequeno porte cadastradas / Arrecadação do ICMS	%	5,70	2006	P A				1,00		1,00

**Outcome:** 8 - Custo anual de digitação da nota fiscal para o Estado reduzido

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Custo anual da digitação da nota fiscal na SEFA com redução de 60%	R\$	4.176.000,00	2006	P A				1.670.400,00		1.670.400,00

**Outcome:** 9 - Tempo de tramitação processual no Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários (TARF) reduzido

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Tempo médio de tramitação processual no TARF	Dias	45,00	2006	P A			30,00			0,00

**Outcome:** 10 - Níveis de recuperação de crédito administrativos incrementados

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Arrecadação da recuperação de créditos administrativos	R\$Milhões	17,20	2006	P A			17,60	18,00	19,00	19,00

**Outcome:** 11 - Erros e inconsistências do retorno diário do movimento bancário reduzidos

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Número de erros de retorno do movimento bancário	Erros por dia	10,00	2006	P A						0,00

**Outcome:** 12 - Tempo de análise de processos licitatórios Fazendários (TARF) reduzido

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Tempo médio de análise de processos licitatórios	Dias	4,00	2006	P A				2,00		2,00

**Outcome:** 13 - Ressalvas nos processos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial reduzidas

# PROGRESS MONITORING REPORT

BR-L1093 - Program Support Fiscal Management Modernization Transparency State Pará  
-PROGEFAZ  
2011 1st period with closure up to (30-Sep-2011)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 22/09/2011

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Número de ressalvas nos processos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da SEFA	Restrições	413,00	2006	P A				206,00		206,00

**Outcome:** 14 - Acessos ao portal da SEFA incrementados

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Número de acessos/ano ao Portal	Acessos	600.000,00	2006	P A			650,00	720,00	800,00	800.000,00

**Outcome:** 15 - Nível de satisfação dos usuários dos serviços da SEFA incrementado

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Nível de satisfação dos usuários dos serviços da SEFA: atendimento dos funcionários	%	81,80	2006	P A				90,00		90,00
Nível de satisfação dos usuários dos serviços da SEFA: facilidade para conseguir o serviço	%	85,40	2006	P A				90,00		90,00

**Outcome:** 16 - Custos de comunicação reduzidos

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Custos de comunicação da SEFA	R\$	1.690.548,00	2006	P A				1.400.000,00		1.400.000,00

**Outcome:** 17 - Oferta de capacitação aos servidores fazendários incrementada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Servidores estáveis e contratados capacitados por ano	Servidores	478,00	2006	P A		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00

**Outcome:** 18 - Índice de satisfação do cliente interno incrementado

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Índice de satisfação do cliente interno	%	70,00	2004	P A				80,00		80,00

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente I - Gestão Estratégica Integrada									
Modelo de Planejamento e Gestão das Políticas de Fazenda implantado	Modelo				1,00	25.000,00			190.100,00
Modelo de estrutura organizacional e processos administrativos implementados.	Modelo								65.908,00
Programa de reestruturação física implementado.	Programa					373.864,00			1.495.455,00
Programa de alianças Estratégicas firmadas	Programa					62.605,00			187.816,00
Componente II: Administração Tributária e Contencioso Fiscal									
Modelo de sistematização das normas tributárias e não tributárias implementado.	Modelo				1,00	35.272,00			70.544,00
Modelo de controle de benefícios fiscais concedidos implementado.	Modelo				1,00				50.078,00
Modelo de estudos econômicos tributários e não tributários realizados.	Modelo				1,00	57.857,00			115.714,00
Modelo de gestão dos impostos sobre propriedade de veículo automotor (IPVA) e de transmissão causa mortis e doação (ITCD) implementado.	Modelo				1,00				93.809,00
Modelo integrado de fiscalização implantado.	Modelo				1,00				196.587,00
Modelo de fiscalização de trânsito implantado.	Modelo				1,00				202.424,00
Modelo de fiscalização de estabelecimentos implantado.	Modelo				1,00				175.819,00
Modelo de procedimentos da SEFA (Secretaria de Estado da Fazenda) adaptados à Lei de Micro Empresa LC123.	Modelo				1,00	54.096,00			162.288,00
Modelo de recolhimento de impostos por meios alternativos implantado	Modelo				1,00				70.414,00
Modelo de pesquisas, investigações e análises de ilícitos fiscais implantado	Modelo				1,00				92.182,00
Modelo do Cadastro Sincronizado implementado.	Modelo				1,00				91.248,00
Modelo de Nota fiscal eletrônica implantada.	Modelo				1,00				173.394,00
Sistema público de escrituração digital - SPED implantado.	Systems				1,00	78.725,00			137.769,00
Modelo de gestão da Julgatoria e do Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários implementado.	Modelo				1,00	105.381,00			158.071,00

# PROGRESS MONITORING REPORT

BR-L1093 - Program Support Fiscal Management Modernization Transparency State Pará  
-PROGEFAZ  
2011 1st period with closure up to (30-Sep-2011)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 22/09/2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Modelo de cobrança do crédito tributário implementado.	Modelo				1,00				288.108,00
<b>Componente III: Administração Financeira, Patrimônio e Controle Interno</b>									
Modelo de Sistemas corporativos do Estado integrados aos sistemas de gestão do Tesouro Estadual.	Modelo				1,00				872.904,00
Modelo de gestão de convênios implantado.	Modelo				1,00	63.661,00			127.322,00
Modelo de Controle de custos das unidades fazendárias implantado.	Modelo				1,00	27.457,00			54.914,00
Modelo de gestão do controle interno implantado.	Modelo				1,00	29.729,00			59.458,00
<b>Componente IV: Gestão de Produtos Estratégicos.</b>									
Programa de incentivo ao controle social do gasto público implantado	programa				1,00	428.370,00			64.255,00
Portal SEFA (Secretaria de Estado da Fazenda ) implementado.	portal				1,00				52.378,00
Modelo de gestão da Corregedoria e da Ouvidoria implementados.	Modelo				1,00				86.944,00
Política de comunicação com a sociedade implementada.	política				1,00				156.738,00
Modelo de qualidade para o atendimento ao contribuinte implementado.	Modelo				1,00				205.219,00
Sistemática de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) implantada	Sistemática				1,00				851.977,00
Modelo de Sistemas aplicativos de apoio à gestão administrativa e tributária implantado	modelo				1,00	1.628.860,50			3.257.721,00
Política de comunicação e de segurança da informação definida e implantada	política				1,00				106.134,00
Modelo de Infraestrutura de tecnologia para suporte e apoio à gestão fiscal implementada ( Ressarcimento)	modelo				1,00				1.150.734,00
Política de gestão de pessoas implementada.	política				1,00	40.842,00			122.526,00
Política de capacitação implementada.	política				1,00	364.101,00			1.456.404,00
Programa de educação fiscal implementado.	programa				1,00	90.956,00			363.824,00
Programa de gestão do conhecimento implementado.	programa				1,00	52.617,00			157.851,00
<b>Outros.</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>3.519.393,50</b>			<b>13.165.031,00</b>
