
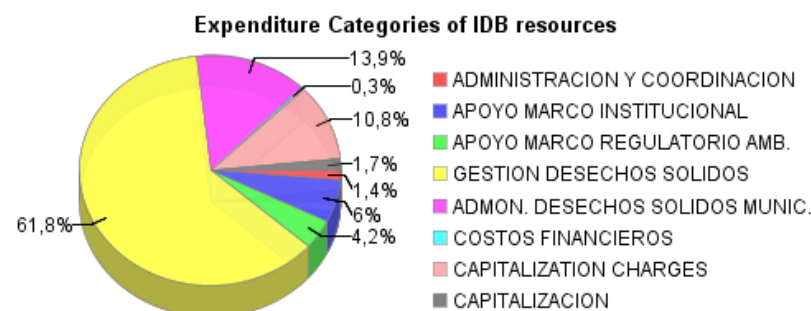
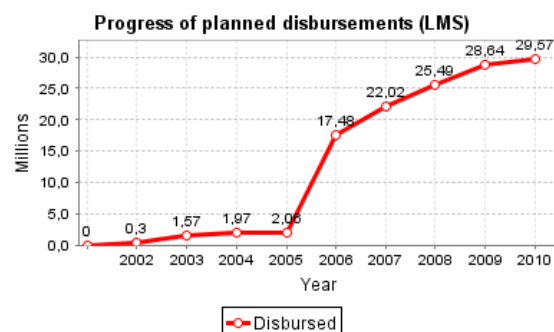



## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				
Sector:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL PROGRAMS				
Loan Number(s):	1209/OC-ES	Current Approved Amount:	29.567.349,15	Original IDB:	29.847.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	29.567.349,15	Current IDB:	29.567.349,15
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	100,00	Pari-passu:	97,00
Related Operation(s):	TC9411464, TC9811037	Balance:		Co-Financing/Country:	10.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	29.857.000,00
				Amortization Period (months):	162

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B(R)	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Sep 22, 2011 Validated by Country Representative: Sep 30, 2011

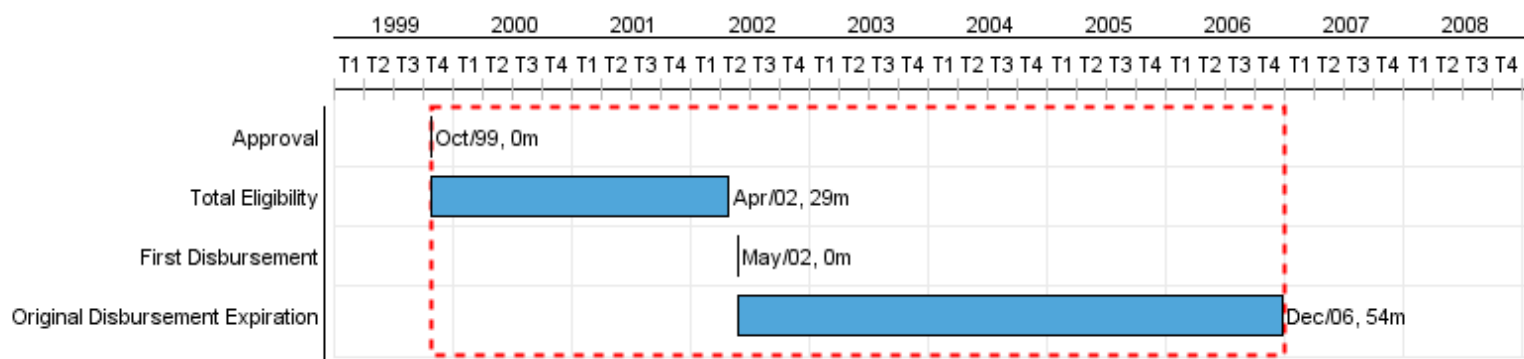

## Accumulated Progress as of 2011

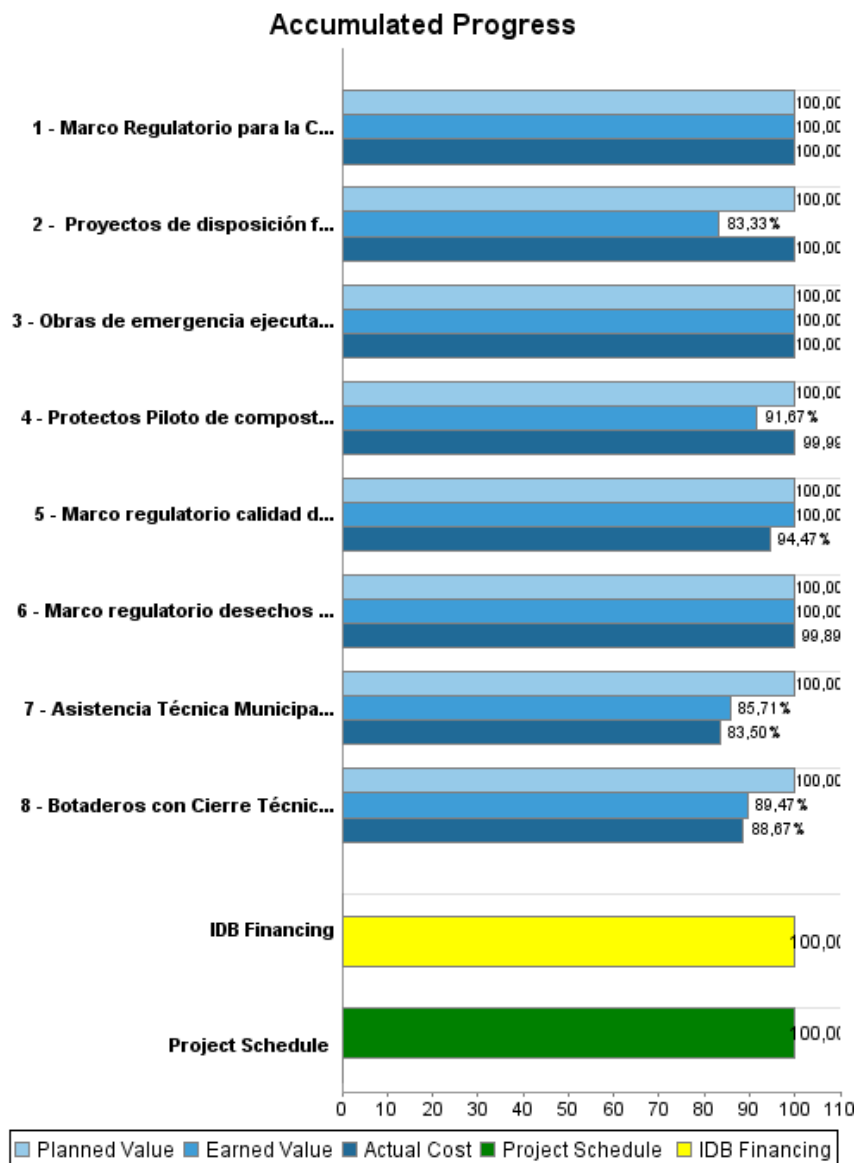

## Outcomes

<b>Outcome:</b>	Marco Regulatorio ambiental fortalecido al final del proyecto.
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	End of project
Los índices de calidad ambiental en los sectores críticos agua, aire, Desechos Peligrosos y Desechos Sólidos Municipales, establecidos y mejorados en un 20% al final de la ejecución del Proyecto en relación con la línea base levantada al inicio del mismo	%		2001	P A	20,00 5,00	20,00	20,00

<b>Outcome:</b>	Gestión Integral de Desechos Sólidos municipales mejorada
<b>Suppositions:</b>	Municipalidades y comunidades participaran activamente en el desarrollo del Programa

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	End of project
Cobertura de recolección y disposición final adecuada de desechos de los municipios beneficiados con el proyecto	%		2001	P A	80,00 80,00	80,00	80,00

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>I. Apoyo al Marco Regulatorio Ambiental</b>									
Marco Regulatorio para la Calidad del Aire elaborado	Marco regulatorio				1,00				768.000,00
Marco regulatorio calidad del agua elaborado	Marco regulatorio				1,00				950.143,00
Marco regulatorio desechos sólidos peligrosos y municipales elaborado	Marco regulatorio				1,00				442.934,00
<b>II. Apoyo a la Gestión de Desechos Sólidos Municipales</b>									
Asistencia Técnica Municipal, Educación y Fortalecimiento Institucional, desarrollada e implementada	consultorias		1,00		21,00				1.341.033,00
Proyectos de disposición final de desechos sólidos municipales construidos o mejorados	Proyectos		1,00		6,00				4.184.340,00
Proyectos Piloto de compostaje ejecutados	Proyectos		9,00		12,00				952.157,00
Botaderos con Cierre Técnico implementado al final del programa	Botaderos		1,00		19,00				2.122.588,00
Obras de emergencia ejecutadas	Proyectos				2,00				13.828.000,00
<b>Administración y Coordinación</b>									
<b>Costos Financieros</b>									
<b>TOTAL</b>									<b>24.589.195,00</b>
