

## Relatório Resumido

### Dados Gerais

Executor:	MINISTRY OF ENVIRONMENT
Sector:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND GOVERNANCE
Número da Operação:	2391/GR-HA;1668/SF-HA
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	INV - Investimento
Operação Relacionada:	
Subtipo de Operação:	SEF - Sector Facility

### Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	5.150.000,00
Desembolsado:	4.214.724,41
% Desembolsado:	81,84
Saldo:	935.275,59

### Custo Total e Fonte

Original BID:	7.663.513,21
Corrente BID:	5.150.000,00
Pari-passu:	99,00
Cofinanciamento/País:	45.000,00
Original Estimado:	7.708.513,21
Período de Amortização (meses):	354

### Categoria do impacto social

Categoria do impacto social:

C(R)

### Reformulação

( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?




### Validação

Validado pelo Chefe de Divisão:


26-abr-2012

Validado pelo Representante do País:

30-abr-2012

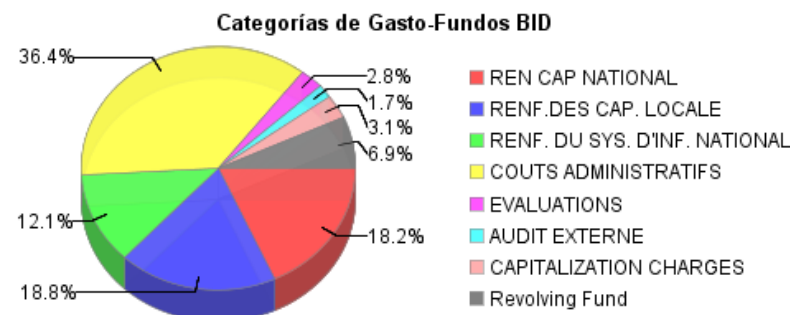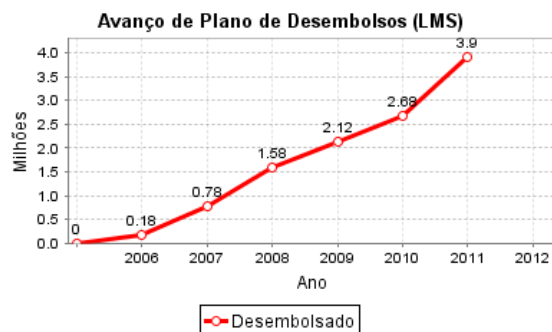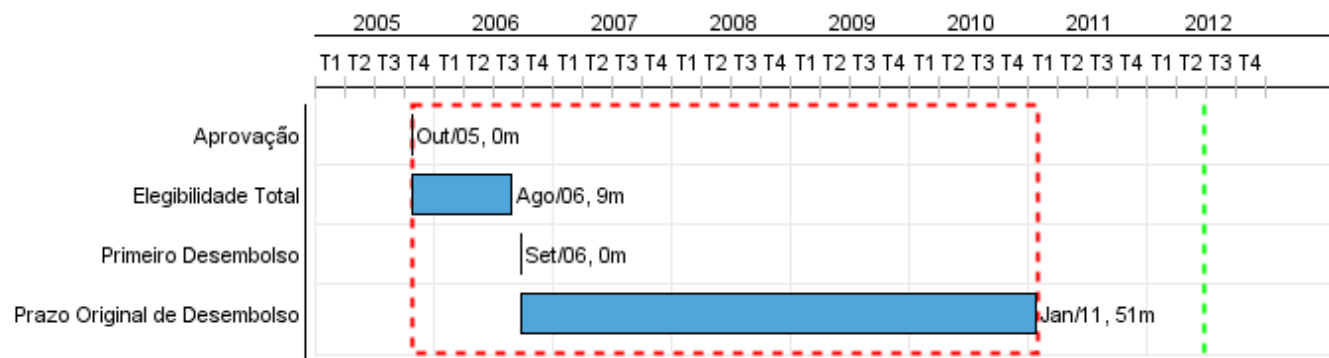

## Progresso Acumulado até 2011

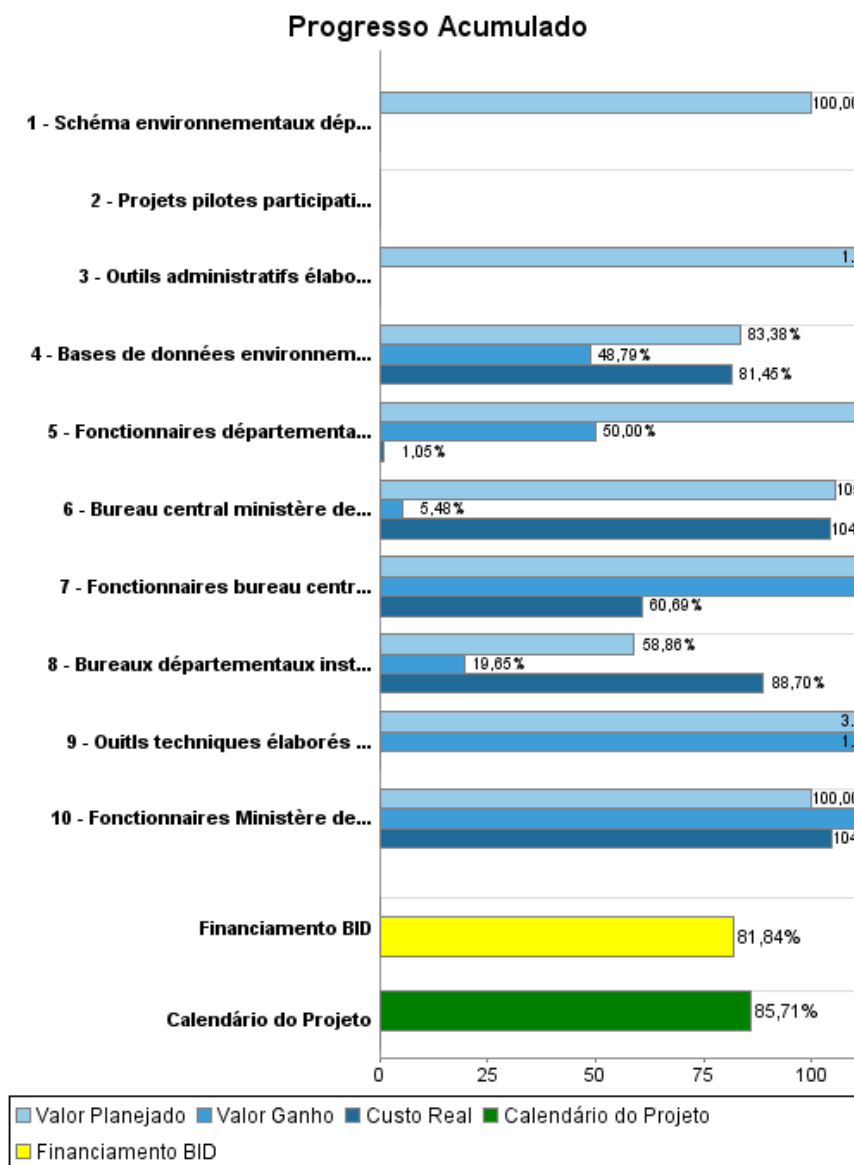

## Resultados

**Resultado:** Gestion de l'environnement national et coordination interinstitutionnelle améliorées

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2011	Final do Projeto
Les analyses de l'impact environnemental des projets d'infrastructure qui ont été révisé et fait l'objet d'un monitoring par le MDE.	%		2005	P A	10.00	40.00	40,00

**Resultado:** Monitoring environnemental systématique est mis en place dans deux régions, à la fin de 2010

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2011	Final do Projeto
Les analyses d'impact environnementales révisées et faisant l'objet d'un monitoring spécifique dans les deux départements	%		2005	P A	50.00	100.00	100,00

**Resultado:** Le système d'information environnemental est utilisé

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2011	Final do Projeto
Visites annuelles du site internet	Visites		2005	P A		10,000.00	10.000,00

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>1. Renforcement institutionnel au niveau national</b>									
Bureau central ministère de l'environnement aménagé et équipé	Bureaux				1,00				800.000,00
Fonctionnaires bureau central formés	Fonctionnaires	15,00	20,00		30,00	55.000,00	5.345,00		50.000,00
Outils administratifs élaborés (GRH, notes de dossier pour le conseil de direction, projet de loi organique)	Outils administratifs	1,00			3,00	25.000,00			20.000,00
Outils techniques élaborés (manuel de procédures d'évaluation environnementales)	Outils techniques	1,00			2,00	100.000,00			20.000,00
<b>2. Renforcement des capacités pour la gestion de l'environnement local</b>									
Bureaux départementaux installés	Bureaux				10,00	158.000,00			658.000,00
Fonctionnaires départementaux formés	Fonctionnaires	10,00	10,00		20,00	25.000,00	523,00		50.000,00
Schéma environnementaux départementaux élaborés	Schéma environnementaux				2,00				300.000,00
Projets pilotes participatifs environnementaux mis en oeuvre	Projets pilotes								
<b>3. Appui au Système National d'Information sur l'Environnement</b>									
Bases de données environnementales créées	Bases de données	2,00	2,00		2,00	711.000,00	767.200,00		1.850.000,00
Fonctionnaires Ministère de l'Environnement / ONEV formés	Fonctionnaires	10,00	15,00		15,00	55.000,00	74.000,00		85.000,00
<b>Frais administratifs, audit, évaluations</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>1.129.000,00</b>	<b>847.068,00</b>		<b>3.833.000,00</b>
