
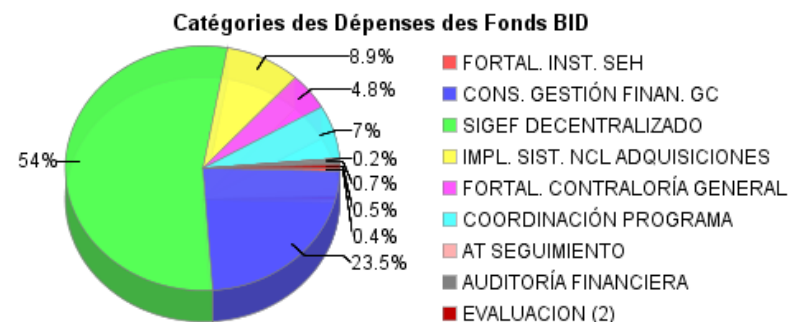



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA		
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FINANCIAL MANAGEMENT REFORM & MODER		
Numéro(s) de Prêt(s):	1809/OC-DR	Montant Courant Approuvé:	21.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	8.182.771,49
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	38,97
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	12.817.228,51
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		
		Initial BID:	21.000.000,00
		Courant BID:	21.000.000,00
		Pari Passu:	90,00
		Cofinancement/Pays:	2.400.000,00
		Estimation Initiale:	23.400.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	204


Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B13(R)	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 22-abr-2012 Validé par le Représentant: 23-abr-2012

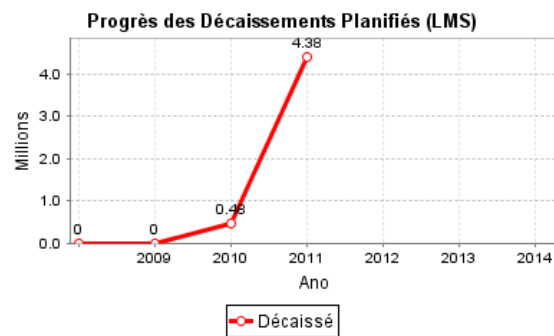

Progrès Cumulé à 2011

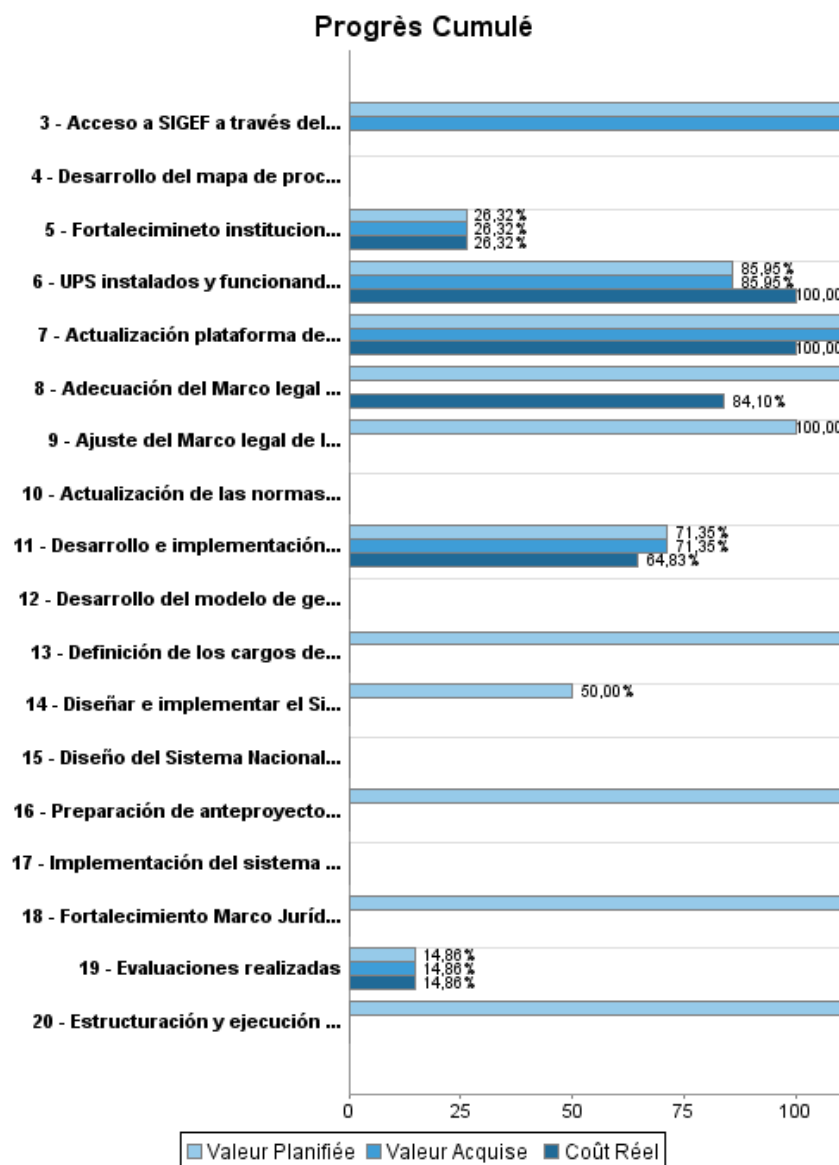

Progrès Cumulé

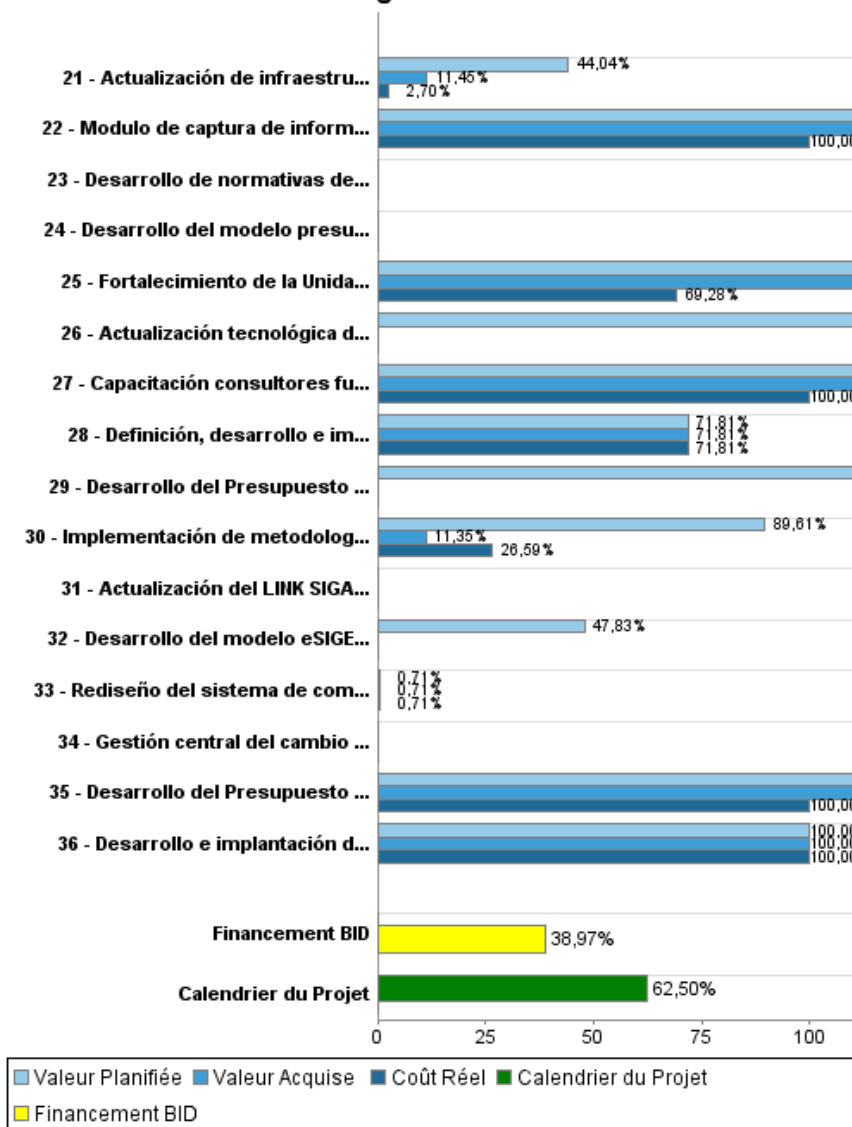

Résultats

Résultat:	Información para la toma de decisiones en la política fiscal aumentada.
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Ingresos de financiamiento del Gobierno Central captados automáticamente por el SIGEF	porcentaje ingresos	30.00		P A	75.00	100,00
Las compras y contrataciones del gobierno central se llevan a cabo a través de los nuevos módulos de compras y contrataciones y contabilidad del SIGEF.	porcentaje compras			P A	15.00	25,00
Las instituciones que manejan fondos públicos son auditados anualmente.	porcentaje instituciones			P A	25.00	70,00
Gastos de financiamiento del Gobierno Central captados automáticamente por el SIGEF	porcentaje gastos	30.00		P A	75.00	100,00
Operaciones de financiamiento del Gobierno Central captados automáticamente por el SIGEF	porcentaje operaciones	40.00		P A	80.00	100,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Estado de Finanzas (SEF)									
Adecuación del Marco legal de la administración financiera a la constitución vigente	anteproyecto de ley	4,00			4,00	91.900,00	50.000,00		59.450,00
Preparación de anteproyecto de ley del "Sistema de Administración de Bienes Nacionales"	anteproyecto de ley	1,00			1,00	36.300,00			15.250,00
Fortalecimiento de la Unidad de Análisis Política Y Fiscal	unidad política fiscal	1,00	0,50		1,00	216.750,00	64.491,15		93.088,25
Estructuración y ejecución de la oferta académica en adm. financiera	oferta académica	1,00			1,00	96.780,00			75.930,00
Implementación del sistema de educación a distancia (via internet)	convenio de coop. e-learning	1,00			1,00	20,00			
Definición de los cargos de la carrera especializada en Finanzas Publicas y socialización de la carrera	carrera en Finanzas Pub.	1,00			1,00	43.950,00			15.750,00
Fortalecimiento institucional de órganos rectores	manuales de organización y funciones		0,17		2,00		12.500,00		47.500,00
Consolidación de la Reforma de la Gestión Financiera del Gobierno Central									
Evaluación Informática del SIGEF	Evaluación SIGEF		1,00		1,00		52.245,00		52.245,00
Capacitación consultores funcionales e informáticos del PAFI	consultores	49,00	49,00		49,00	72.250,00	62.250,00		62.250,00
UPS instalados y funcionando para centro de datos	UPS	1,00	1,00		1,00	80.781,00	93.982,24		93.982,24
Implementación de metodología y herramientas para el desarrollo y documentación del SIGEF	metodologías y herramientas	3,00	0,38		3,00	57.870,00	17.175,00		64.581,25
Actualización plataforma desarrollo del SIGEF	Sistemas	1,00	0,50		1,00	179.450,00	56.700,00		56.700,00
Desarrollo del mapa de procesos de la administración financiera	mapas de procesos	6,00				67.425,00			
Desarrollo del Presupuesto Orientado a Resultados (POR)	POR	1,00			1,00	126.850,00			33.075,00
Desarrollo del Presupuesto Plurianual	Presupuesto Plurianual	1,00	0,50		1,00	63.600,00	23.450,00		23.450,00
Definición, desarrollo e implementación de la cuenta única (CUT)	Cuenta única		0,40		1,00		85.000,00		118.363,81

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Desarrollo de normativas de Contabilidad Gubernamental	Normativa desarrollada				1,00				37.800,00
Desarrollo e implantación del módulo de gestión financiera de la nómina del SIGEF	Módulo nómina		0,50		1,00		27.000,00		27.000,00
Modulo de captura de información financiera del SPNF implementado y ampliada la base de datos del SIGEF	Modulo	1,00	0,50		1,00	121.600,00	26.000,00		26.000,00
Actualización del LINK SIGADE-SIGEF	LINK actualizado		1,00		1,00				12.700,00
Desarrollo del Sistema de Administración Financiera en las Instituciones Descentralizadas y Autónomas.									
Desarrollo e implementación de un datawarehouse y consulta del ciudadano	Datawarehouse	1,00	1,00		1,00	156.550,00	142.260,64		219.420,35
Acceso a SIGEF a través del internet	acceso a internet	1,00	1,00		1,00	1.273.000,00			1.148.823,59
Actualización de infraestructura tecnológica del SIGEF	Infraestructura	1,00	0,26		1,00	2.560.000,00	156.689,78		5.812.400,18
Desarrollo del modelo eSIGEF para 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social	Sistemas				34,00	50.400,00			105.375,00
Desarrollo del modelo presupuesto eSIGEF para 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social	Sistemas				34,00				105.175,00
Desarrollo del modelo de gestión financiera y contable del eSIGEF para 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social	Sistemas				34,00				1.065.647,81
Gestión central del cambio en la implantación del eSIGEF en 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social	Instituciones				34,00				330.000,00
Fortalecimiento de la Gestión de Compras y Contrataciones.									
Fortalecimiento Marco Jurídico de compras y contrataciones	anteproyecto ley modificación adquisiciones públicas	1,00			1,00	115.200,00			37.012,50
Rediseño del sistema de compras y contrataciones y portal único de adquisiciones	Sistema compras y contrataciones		0,14		1,00		7.500,00		1.060.948,81

RAPPORT DE SUIVI

DR-L1005 - Modernization of Administration's Public Resources
2011 2e período con cierre al (31-mars-2012)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 19/04/2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Actualización tecnológica de infraestructura del sistema de compras	Infraestructura	1,00			1,00	657.580,00			300.000,00
Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General e implementación del sistema de control interno									
Ajuste del Marco legal de la CGR	Anteproyecto ley SINACI	1,00			1,00	42.950,00			42.950,00
Actualización de las normas básicas de Control Interno	Normas Control Interno				1,00				124.800,00
Diseño del Sistema Nacional de Control Interno (SINACI)	Sistema				1,00				251.800,00
Diseñar e implementar el Sistema de Auditoría Interna Gubernamental	Sistema				1,00	310.700,00			621.400,00
Componentes no inversión									
Auditorías financieras ejecutadas	auditoría	1,00	1,00		4,00	24.500,00	23.775,71		98.000,00
Evaluaciones realizadas	evaluación				2,00		5.200,00		35.000,00
Costos financieros									
TOTAL						6.446.406,00	906.219,52		12.273.868,79
