

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): MINISTRY OF ENVIRONMENT
Secteur: ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND GOVERNANCE
Numéro(s) de Prêt(s): 2391/GR-HA;1668/SF-HA
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):
Sous-Type de l'Opération: SEF - Sector Facility

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 5.150.000,00
Montant Décaissé à ce Jour: 4.214.724,41
% Décaissé: 81,84
Solde: 935.275,59

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 7.663.513,21
Courant BID: 5.150.000,00
Pari Passu: 99,00
Cofinancement/Pays: 45.000,00
Estimation Initiale: 7.708.513,21
Période d'Amortissement (mois): 354

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Reformulation




Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: C(R)


() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: 26-abr-2012

Validé par le Représentant: 30-abr-2012

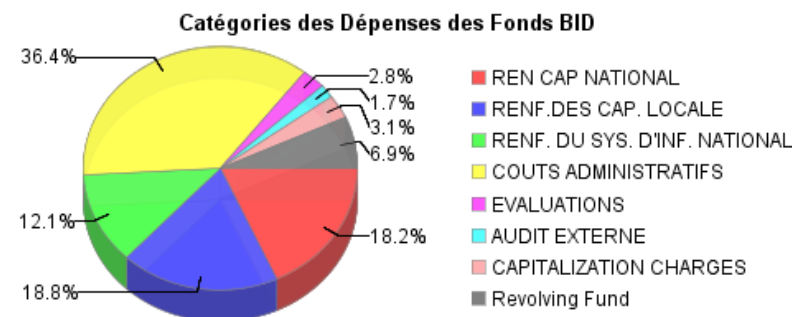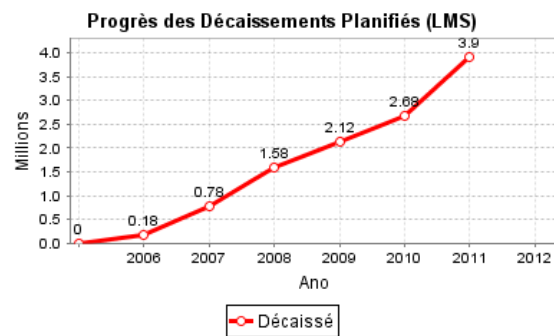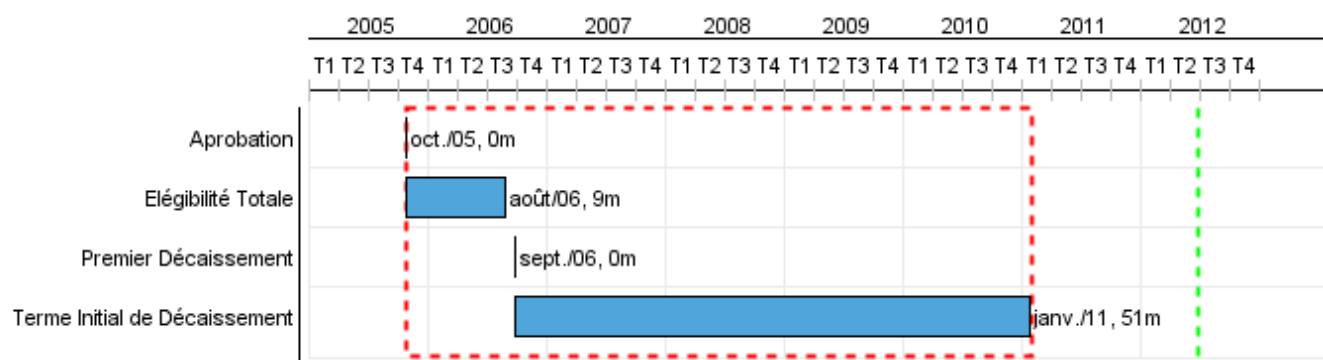

Progrès Cumulé à 2011

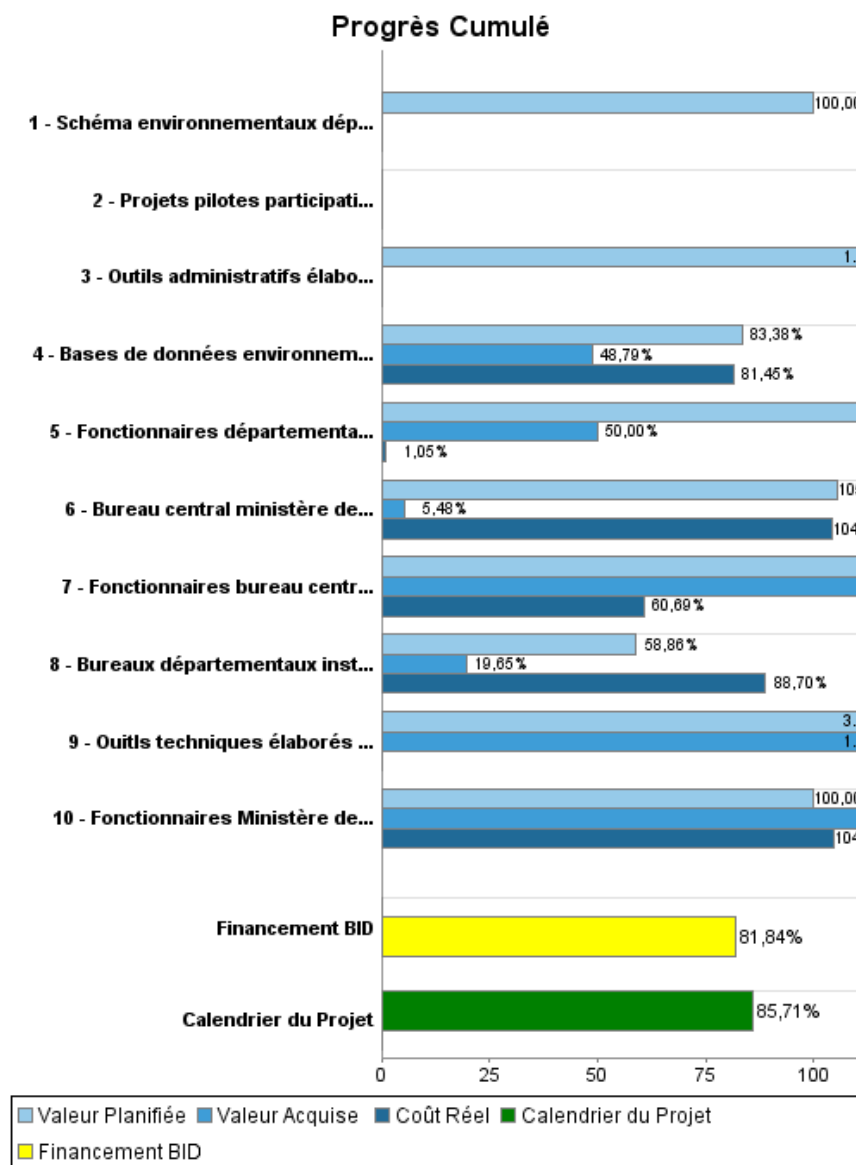

Résultats

Résultat: Gestion de l'environnement national et coordination interinstitutionnelle améliorées

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2011	Fin du Projet
Les analyses de l'impact environnemental des projets d'infrastructure qui ont été révisé et fait l'objet d'un monitoring par le MDE.	%		2005	P A	10.00	40.00	40,00

Résultat: Monitoring environnemental systématique est mis en place dans deux régions, à la fin de 2010

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2011	Fin du Projet
Les analyses d'impact environnementales révisées et faisant l'objet d'un monitoring spécifique dans les deux départements	%		2005	P A	50.00	100.00	100,00

Résultat: Le système d'information environnemental est utilisé

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2011	Fin du Projet
Visites annuelles du site internet	Visites		2005	P A		10,000.00	10.000,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
1. Renforcement institutionnel au niveau national									
Bureau central ministère de l'environnement aménagé et équipé	Bureaux				1,00				800.000,00
Fonctionnaires bureau central formés	Fonctionnaires	15,00	20,00		30,00	55.000,00	5.345,00		50.000,00
Outils administratifs élaborés (GRH, notes de dossier pour le conseil de direction, projet de loi organique)	Outils administratifs	1,00			3,00	25.000,00			20.000,00
Outils techniques élaborés (manuel de procédures d'évaluation environnementales)	Outils techniques	1,00			2,00	100.000,00			20.000,00
2. Renforcement des capacités pour la gestion de l'environnement local									
Bureaux départementaux installés	Bureaux				10,00	158.000,00			658.000,00
Fonctionnaires départementaux formés	Fonctionnaires	10,00	10,00		20,00	25.000,00	523,00		50.000,00
Schéma environnementaux départementaux élaborés	Schéma environnementaux				2,00				300.000,00
Projets pilotes participatifs environnementaux mis en oeuvre	Projets pilotes								
3. Appui au Système National d'Information sur l'Environnement									
Bases de données environnementales créées	Bases de données	2,00	2,00		2,00	711.000,00	767.200,00		1.850.000,00
Fonctionnaires Ministère de l'Environnement / ONEV formés	Fonctionnaires	10,00	15,00		15,00	55.000,00	74.000,00		85.000,00
Frais administratifs, audit, évaluations									
TOTAL						1.129.000,00	847.068,00		3.833.000,00
