

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Secteur: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & SUBNATIONAL GOVE
Numéro(s) de Prêt(s): 1591/OC-PE
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 12.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour: 10.016.187,68
% Décaissé: 83,47
Solde: 1.983.812,32

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 12.000.000,00
Courant BID: 12.000.000,00
Pari Passu: 70,00
Cofinancement/Pays: 5.143.000,00
Estimation Initiale: 17.143.000,00
Période d'Amortissement (mois): 168

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet




Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B13(R)

Reformulation


() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validation


Validé par le Chef de Division: 22-abr-2012
Validé par le Représentant: 26-abr-2012

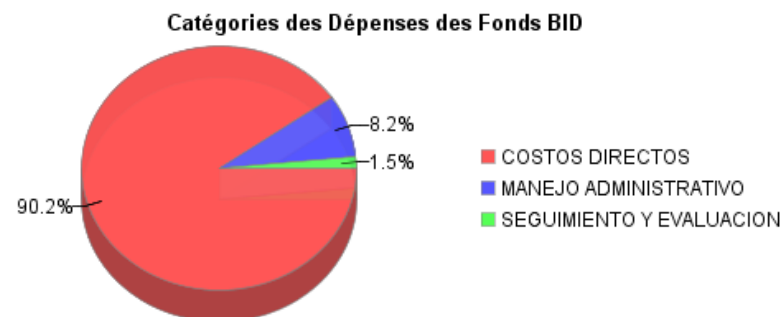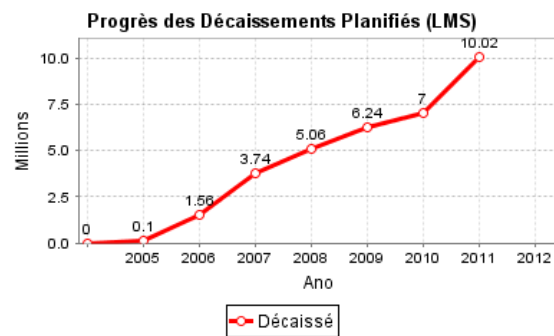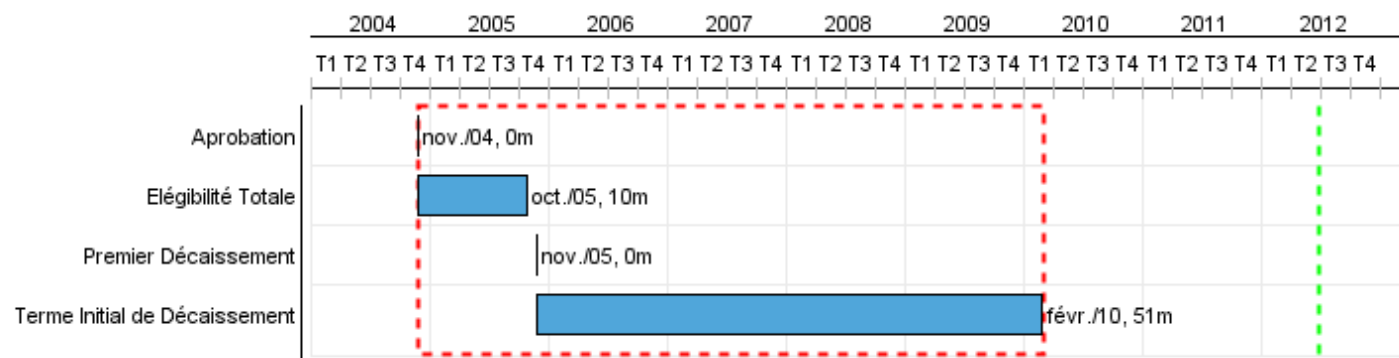

Progrès Cumulé à 2011

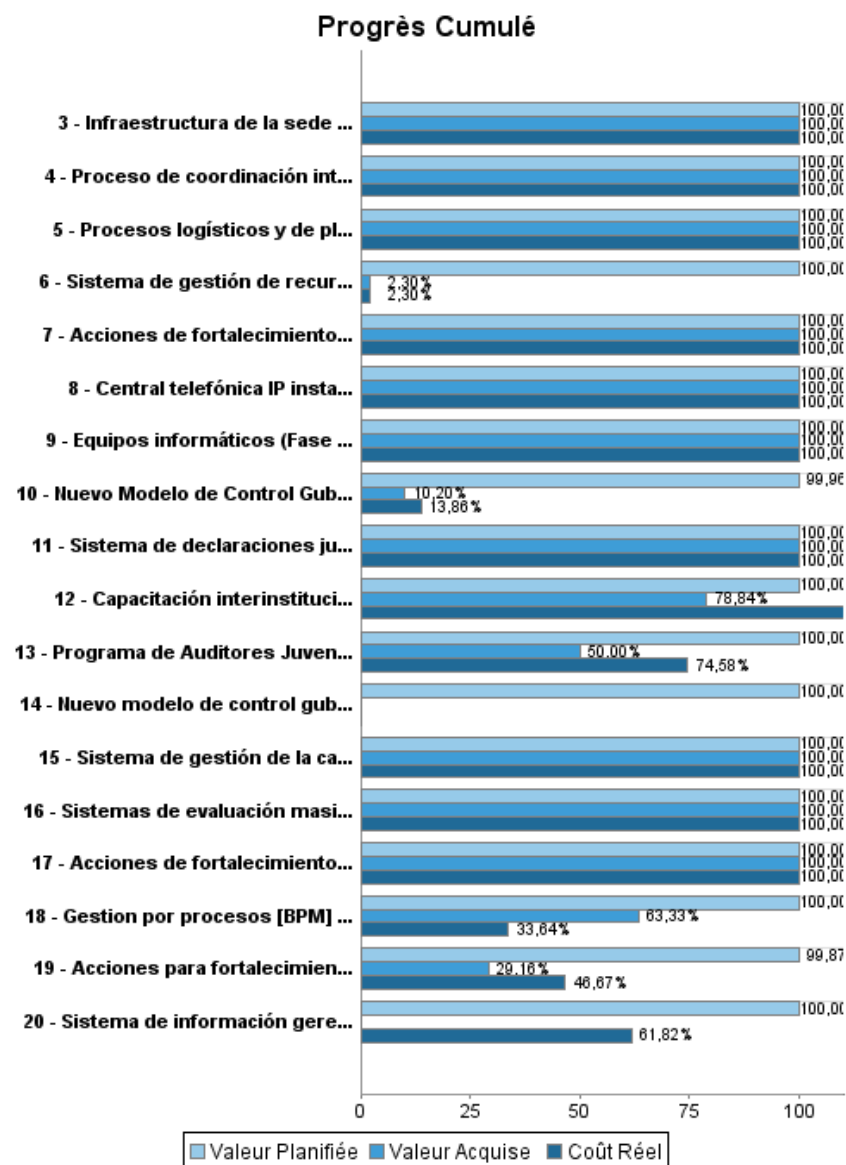

Progrès Cumulé

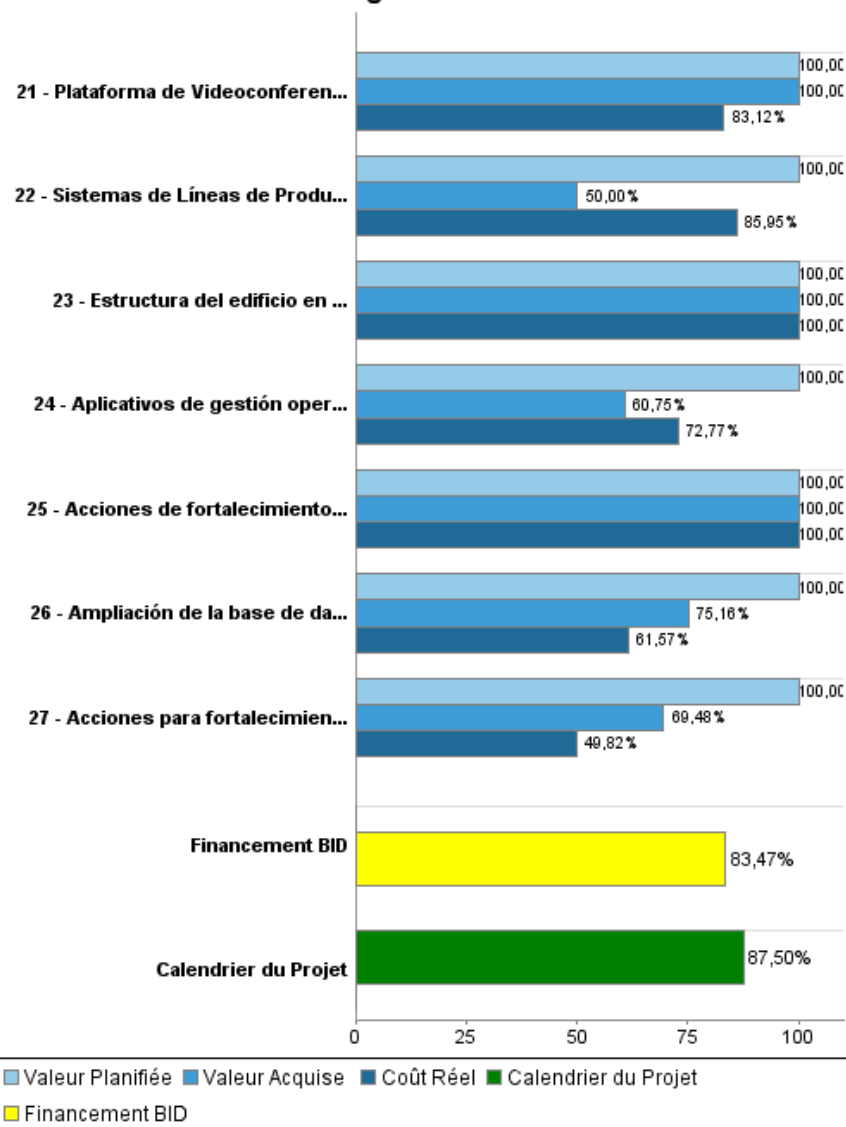

Résultats

Résultat:	Formas de intervención de la CGR diversificadas
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	Fin du Projet
Mayor participación de las nuevas acciones y actividades de control iniciadas del total de las realizadas por la CGR	%	37.00	2005	P A		45,00

Résultat:	Eficiencia de la labor de control incrementada
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	Fin du Projet
Costos directos promedio de los exámenes especiales concluidos realizados por la CGR reducidos.	US\$	23,709.00	2005	P A		18.967,00

Résultat:	Sistema Nacional de Control fortalecido de forma desconcentrada
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	Fin du Projet
Incremento de las Acciones de control concluidas por los Órganos de Control Institucional y las Oficinas Regionales de Control	Acciones	2,371.00	2005	P A		2.846,00
Sociedades de Auditoria (SOAs) con registro vigente al término del programa	SOAs	90.00	2005	P A		135,00

Résultat:	Procesos de Inicio de Acciones Legales y de atención de denuncias mejorados
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	Fin du Projet
Procesos iniciados por la Procuraduría de las acciones legales Civiles derivadas de las acciones de control con conclusión favorable a la CGR	acciones civiles	3.00	2005	P A		10,00
Procesos iniciados por la Procuraduría de las acciones legales Penales derivadas de las acciones de control con conclusión favorable a la CGR	acciones penales	7.00	2005	P A		14,00
Atenciones y Orientaciones Personalizadas a los Ciudadanos en el Servicio de Atención de Denuncias Ciudadanas en la sede central	atenciones/ orientaciones	1,326.00	2005	P A		1.724,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Modernización misional e institucional									
Nuevo Modelo de Control Gubernamental aprobado e implementado	Modelo	1,00			5,00	711.814,00	29.000,00		793.000,00
Aplicativos de gestión operativa implementados	sistema	5,00	3,00		6,00	209.000,00	151.000,00		213.000,00
Acciones para fortalecimiento de capacidad técnica en obras públicas implementadas	acciones	3,00	2,00		4,00	159.308,00	72.000,00		174.000,00
Acciones para fortalecimiento de la capacidad educativa de la Escuela Nacional de Control implementadas	acciones	4,00	1,00		4,00	202.000,00	88.000,00		214.250,00
Gestion por procesos [BPM] implementado	procesos	5,00	3,00		5,00	630.199,00	174.000,00		687.468,00
Sistema de información gerencial implementado	aplicativo informático	1,00			1,00	220.000,00	136.000,00		220.000,00
Talleres de fortalecimiento de habilidades gerenciales realizados	talleres	4,00	1,00		4,00	238.425,00	74.000,00		238.425,00
Sistema de gestión de recursos humanos implementados	aplicativo informático	1,00			1,00	439.653,00			450.000,00
Ampliación de la base de datos institucional implementada	equipo informático	4,00	3,00		4,00	688.217,00	422.000,00		692.786,00
Central telefónica IP instalada	central telefónica				1,00				119.458,00
Estructura del edificio en "L" construido	estructura				1,00				483.361,00
Sistema de gestión de la calidad (Fase I) implementado	sistema				1,00				230.927,00
Sistema de declaraciones juradas de funcionarios públicos (Fase I) implementado	sistema				1,00				169.144,00
Procesos logísticos y de planeamiento (Fase I) implementados	procesos				2,00				21.014,00
Acciones de fortalecimiento de capital humano de la CGR (Fase I) implementadas	talleres				3,00				310.958,00
Equipos informáticos (Fase I) adquiridos	lotes de equipos				3,00				3.279.767,00
Sistemas de evaluación masiva y workflow (Fase I) implementados	sistemas				6,00				1.663.097,00
Infraestructura de la sede central y ORC (Fase I) construida o rehabilitada	obras				4,00				2.122.709,00
Fortalecimiento y Desconcentración del SNC									
Nuevo modelo de control gubernamental regional aprobado e implementado.	Modelo	1,00			2,00	1.645.000,00			1.645.000,00
Sistemas de Líneas de Producción de Microformas implementado.	Sistema	2,00	1,00		3,00	631.754,00	543.000,00		631.754,00

RAPPORT DE SUIVI

PE-L1002 - Moderniz of Controller Gral Office & Deconcent of National Control System
2011 2e período con cierre al (31-mars-2012)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 09/04/2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Plataforma de Videoconferencia implementada.	Plataforma tecnologica	1,00	1,00		2,00	320.000,00	266.000,00		320.000,00
Acciones de fortalecimiento de la capacidad técnica y tecnológica de las ORC (Fase I) implementadas.	Acciones				3,00				765.248,00
Promoción de probidad, coordinación interinstitucional y atención de denuncias									
Capacitación interinstitucional realizada.	Cursos	4,00	3,00		6,00	59.246,00	70.000,00		70.000,00
Conferencias Internacionales Anuales - Anticorrupción ejecutadas.	Conferencias	1,00	1,00		2,00	65.000,00	74.000,00		138.399,00
Programa de Auditores Juveniles y Sistema de Procuraduría Publica, implementados	Sistema	2,00	1,00		2,00	118.000,00	88.000,00		118.000,00
Proceso de coordinación interinstitucional implementado.	Proceso				1,00				78.942,00
Acciones de fortalecimiento de la capacidad técnica en prensa y atención ciudadana (Fase I) implementadas.	Acciones				2,00				82.450,00
Gestión del Programa									
TOTAL						6.337.616,00	2.187.000,00		15.933.157,00
