
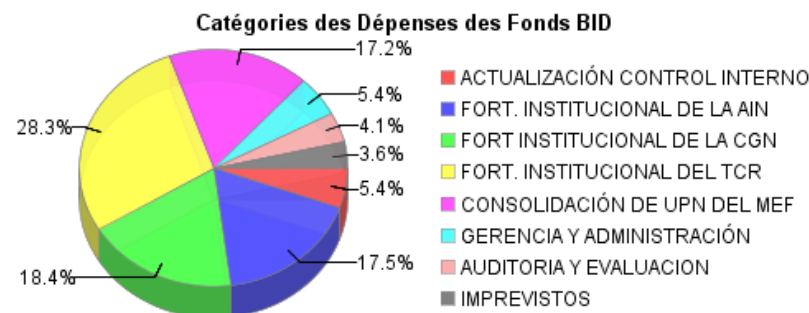
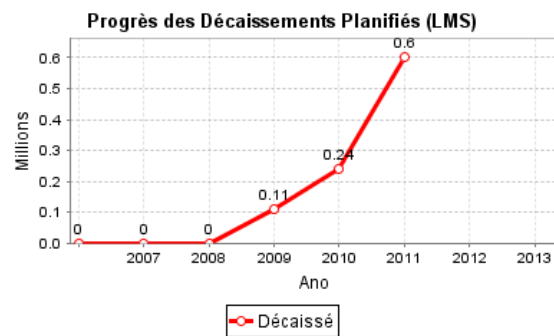


## Rapport Résumé


Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA): MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS					
Secteur:					
Numéro(s) de Prêt(s):	2085/OC-UR	Montant Courant Approuvé:	2.205.000,00	Initial BID:	2.205.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	680.520,20	Courant BID:	2.205.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	30,86	Pari Passu:	92,00
Opération(s) Connexe(s):	UR-T1074	Solde:	1.524.479,80	Cofinancement/Pays:	200.000,00
Sous-Type de l'Opération:	SEF - Sector Facility			Estimation Initiale:	2.405.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	246

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B13	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 22-abr-2012 Validé par le Représentant: 02-may-2012

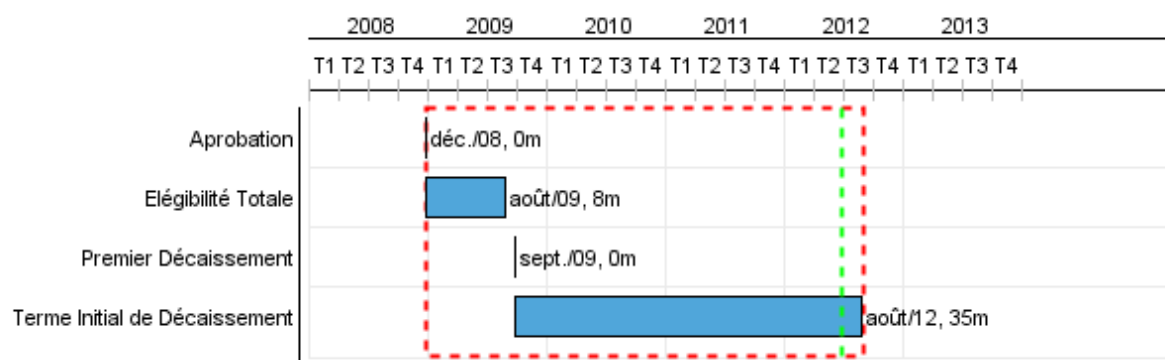


## Progrès Cumulé à 2011

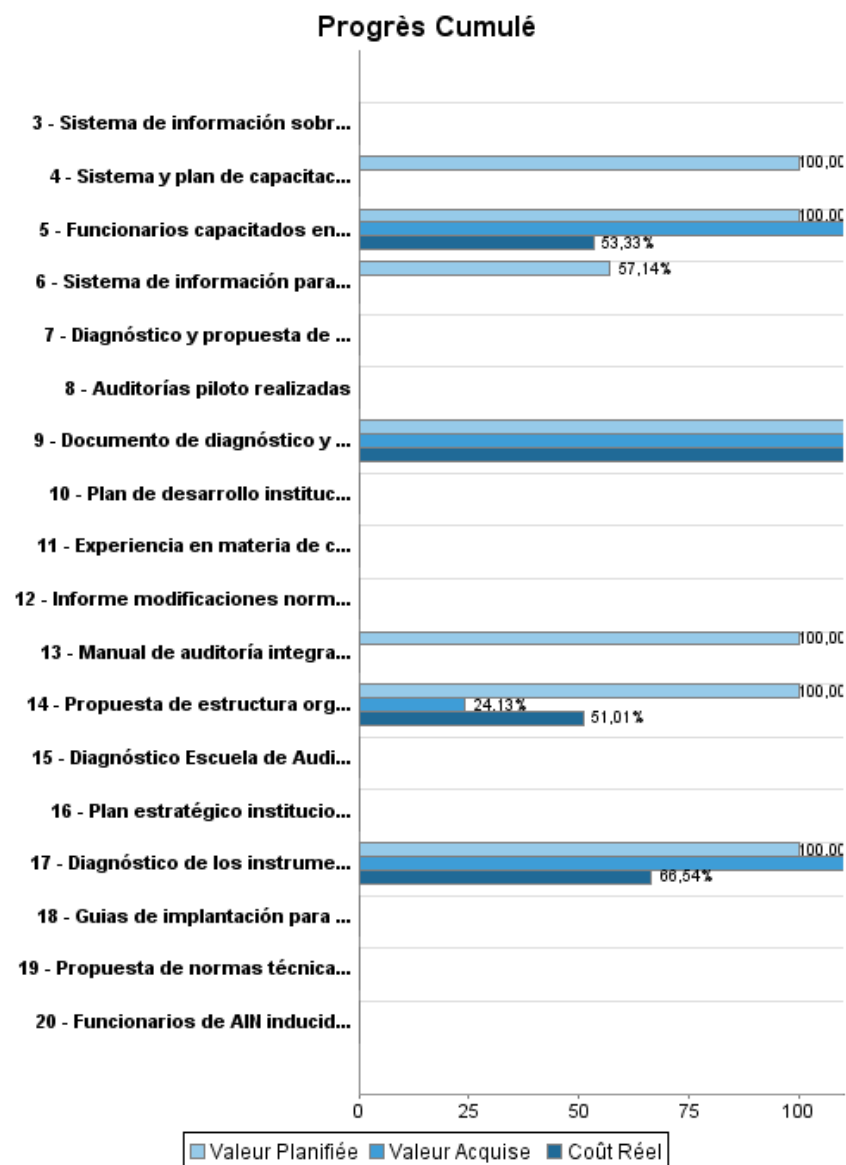

## RAPPORT DE SUIVI

UR-L1031 - Program to Strengthen the Control and Budget Management Units  
2011 2e période con cierre al (31-mars-2012)

### Progrès Cumulé

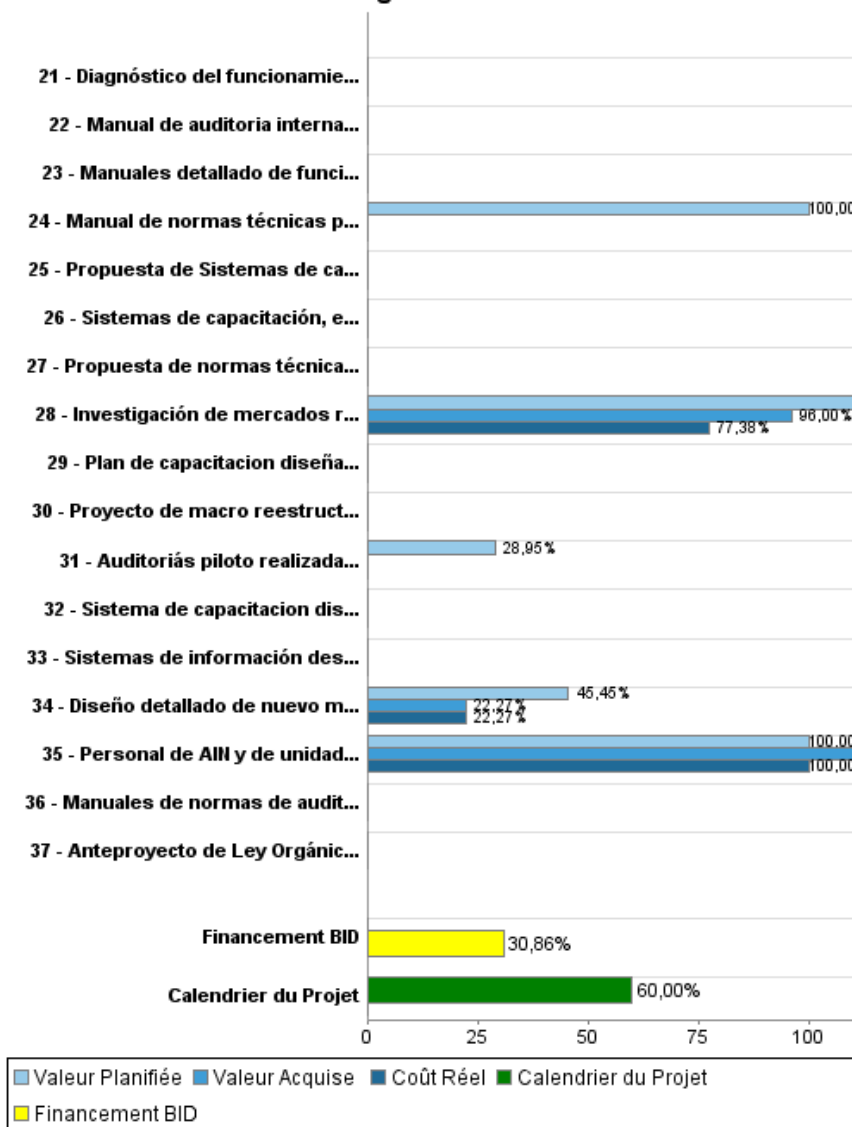

## Résultats

<b>Résultat:</b>	Eficiencia de las prácticas de administración pública mejorada.
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	Fin du Projet
Cantidad de entidades intervinientes en el Programa (TCR, AIN, CGN, UPN) que tienen iniciada la implementación de sus planes de desarrollo institucional y otros sistemas desarrollados en el marco del Programa.	Organismo		2008	P A			3,00
Cantidad de procedimientos de refuerzo de rubro gestionados y aprobados con el nuevo sistema racionalizado en el marco del Programa.	ajustes presupuestales		2008	P A			250,00

<b>Résultat:</b>	Confiabilidad de los sistemas de gestión y control de la administración pública mejorada.
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	Fin du Projet
Cantidad de organismos de control (TCR, AIN y CGN) que disponen de una estructura organizacional y procesos funcionales adecuados, así como personal profesional capacitado en el uso de herramientas técnicas y tecnologías de punta actualizados a los estándares internacionales.	Organismo		2008	P A			3,00
Cantidad de organismos de la Administración Central que tienen conocimiento de las normas de control y gestión adoptadas por los organismos de control en base a las recomendaciones consensuadas en el marco del Programa.	Organismo		2008	P A	18.00 18.00		18,00
Cantidad de organismos de contralor que consensúan un proyecto de normas de control interno para la Administración Central	Organismo		2008	P A	3.00 3.00		3,00

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Actualización del Control Interno.									
Diagnóstico de los instrumentos de control en uso	Sistemas	1,00	1,00		1,00	70.000,00	17.000,00		110.000,00
Funcionarios capacitados en nuevas normas de control interno	Funcionarios	200,00	250,00		300,00	60.000,00	32.000,00		60.000,00
Propuesta de normas técnicas de control elaborada y difundida	Normativa técnica	1,00	1,00		1,00		16.000,00		
Guías de implantación para nuevas normas de control interno elaboradas	Documento de Guías	1,00	1,00		1,00		16.000,00		
Fortalecimiento Institucional de la AIN.									
Plan estratégico institucional de la Auditoria Interna de la Nacion elaborado	Plan				1,00				110.000,00
Personal de AIN y de unidades de auditoría interna en ministerios capacitados	Funcionarios	50,00	140,00		50,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00
Sistema de información sobre la gestión diseñado, desarrollado e implementado	Software				1,00				100.000,00
Auditorías piloto realizadas	Auditorías				3,00				50.000,00
Sistema y plan de capacitación del personal elaborados	Sistema	1,00			1,00	55.000,00			55.000,00
Funcionarios de AIN inducidos en cuanto a la utilización de nuevas herramientas	Funcionarios				80,00				85.000,00
Propuesta de normas técnicas de auditoría interna elaborada	Documento de normas técnicas	1,00	1,00		1,00		46.000,00		
Manual de auditoria interna elaborado	Manual	1,00	1,00		1,00		20.000,00		
Experiencia en materia de control interno y auditoría en países de la región.	Intercambios		1,00		5,00		4.000,00		
Fortalecimiento Institucional de la CGN.									
Diagnóstico y propuesta de reorganización normativa, estructural y operativa de la CGN elaborado.	Diagnóstico y propuesta				1,00				100.000,00
Diseño detallado de nuevo modelo de sistema integrado de administración financiera	Sistemas				1,00	100.000,00	49.000,00		220.000,00
Manual de normas técnicas para División CPF de CGN elaborado y difundido	Manual				1,00	60.000,00			60.000,00
Sistema de capacitacion diseñado	Sistema				1,00				60.000,00
Plan de desarrollo institucional y POA de CGN elaborado	Plan	1,00			1,00				
Fortalecimiento Institucional del TCR.									
Documento de diagnóstico y propuesta de estructura organizativa elaborado	Diagnóstico y propuesta	1,00	1,00		1,00	70.000,00	40.000,00		70.000,00

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Anteproyecto de Ley Orgánica del TCR elaborado	Anteproyecto				1,00				65.000,00
Manual de auditoría integral y guías técnicas para su aplicación elaborado	Manual	1,00			1,00	25.000,00			25.000,00
Auditorías piloto realizadas con nuevas pautas y herramientas	Informes de auditoría	3,00			12,00	55.000,00			190.000,00
Sistema de información para el proceso de auditoría y contro de gestión desarrollado, con conexión a los sistemas de información del sector público	Software				1,00	40.000,00			70.000,00
Propuesta de Sistemas de capacitación, evaluación del desempeño y certificación de auditores diseñados	Documento de propuesta				1,00				50.000,00
Sistemas de capacitación, evaluación del desempeño y certificación desarrollados en detalle y apoyada su implementación	Documento de diseño				1,00				155.000,00
Plan de desarrollo institucional y POA de TCR elaborado	Documento de plan	1,00	1,00		1,00		40.000,00		
Informe modificaciones normativas que sean necesarias	Documento				1,00				40.000,00
Proyecto de macro reestructura: arquitectura organizacional, funciones a nivel de unidades y relacionamiento entre unidades	Documento				1,00				
Manuales detallado de funciones, cargos y perfiles, acorde a la propuesta de macro reestructura aprobada	Documento				1,00				
Diagnóstico del funcionamiento de la Unidad Informática, recomendaciones, necesidades de tecnología	Documento				1,00				
Manuales de normas de auditoría financiera, de cumplimiento y de gestión y guías técnicas para su aplicación	Documento				1,00				
Diagnóstico Escuela de Auditoría Gubernamental del TC, manual de procedimientos y de control de capacitación de los funcionarios del TC	Documento				1,00				
Capacitación funcionarios del TC para la utilización de las nuevas herramientas técnicas y tecnológicas.	Cursos				1,00				
<b>Consolidación de la UPN .</b>									
Propuesta de estructura organizacional y procesos e instrumentos de UPN diseñados	Documento de propuesta	1,00			1,00	178.000,00	68.000,00		253.000,00

## RAPPORT DE SUIVI

UR-L1031 - Program to Strengthen the Control and Budget Management Units  
2011 2e período con cierre al (31-mars-2012)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement  
Dernière Mise à Jour: 19/04/2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Sistemas de información desarrollados para los procesos diseñados, con difusión	Software				1,00				67.000,00
Plan de capacitación diseñado e implantado	Plan				1,00				50.000,00
Investigación de mercados realizada	Informe final				2,00		18.000,00		50.000,00
<b>Administración y costos financieros</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>733.000,00</b>	<b>386.000,00</b>		<b>2.115.000,00</b>
