



## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND HOUSING		
Sector:	SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT		
Número(s) de Préstamo:	2650/OC-SU	Monto Aprobado Actual:	15.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	
Operación(es) Relacionada(s):	RG-P1442	Saldo:	15.000.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		
		BID Original:	15.000.000,00
		Actual BID:	15.000.000,00
		Pari-passu:	100,00
		Co-financiamiento/País:	
		Estimado Original:	15.000.000,00
		Período de Amortización (meses):	174

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 24-abr-2012 Validado por Representante de País: 30-abr-2012

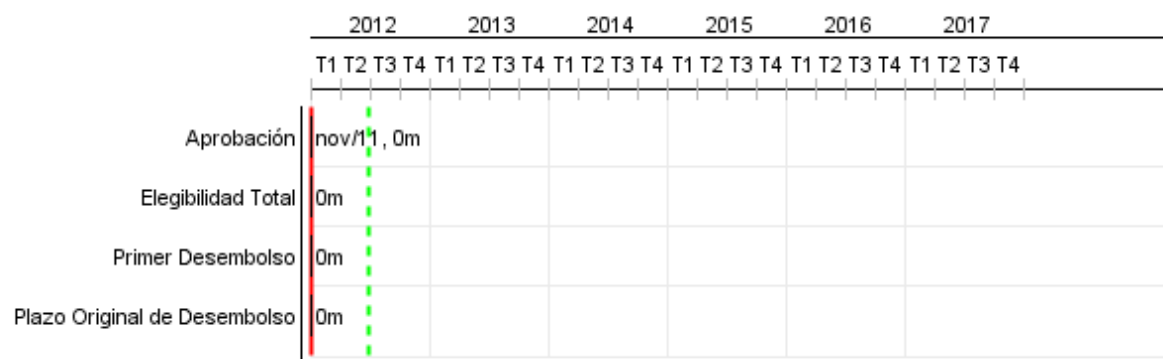

**Progreso Acumulado al 2011**

## Progreso Acumulado



## Resultados

**Resultado:** Leakage: percentage of households receiving targeted non-contributory cash transfers that belong to the top 3 quintiles of consumption distribution

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
20% (<= than baseline value)	%	20.00	2007	P A	19,00

**Resultado:** Primary school enrolment rate - National

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Enrollment Rate	%	90.00	2012	P A	95,00

**Resultado:** Primary school enrolment rate - Interior

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Enrolment Rate - Interior	%	71.00	2012	P A	80,00

**Resultado:** Junior secondary school enrolment rate - National

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Enrolment Rate	%	49.00	2012	P A	60,00

**Resultado:** Junior secondary school enrolment rate - Interior

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Enrolment Rate	%	17.00	2012	P A	30,00

**Resultado:** Senior secondary school enrolment rate - National

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Enrolment Rate	%	21.00	2012	P A	30,00

**Resultado:** Senior secondary school enrolment rate - Interior

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Enrolment Rate	%		2012	P A	15,00

**Resultado:** Attendance rates in children aged 6-18 in CCT beneficiary households

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
School Attendance Rates (6-18)	%		2012	P A	80,00

**Resultado:** Percentage of pregnant women receiving 4 or more prenatal care visits

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Prenatal Care Visits	%	66.00	2010	P A	90,00

**Resultado:** Measles immunization coverage (% of children aged 12-23 months receiving measles vaccine before 18 months of age)

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Meales Immunizations	%	88.00	2012	P A	98,00

**Resultado:** Percentage of pregnant women receiving their first prenatal control before the 14th week of their pregnancy

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Prenatal Control	%	17.00	2001	P A	30,00

**Resultado:** Percentage of teachers in the interior trained in teaching Language (Dutch) and Arithmetic utilize new teaching methods

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Teachers trained	%		2012	P A	80,00

**Resultado:** Decrease in the repetition rate in grades 1 -3 in the Interior

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Repetition Rate Grades 1-3	%	20.00	2012	P A	15,00

# INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

SU-L1013 - Protección Social del Programa de Apoyo  
2011 2º período con cierre al (31-mar-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo  
Última Actualización del PMR: 19/04/2012

<b>Resultado:</b>	% of health clinics reaching their agreed upon annual targets for preventive care
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Health Clinics Providing Preventive Care	%		2012	P A	80,00

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Component 1 - Strengthening Non-Contributory Social Protection Programs</b>									
Key qualified staff recruited	# of staff recruited				12,00				950.000,00
Staff trained	# of staff trained				20,00				125.000,00
Consolidation of programs into one CCT program- CCT Design and implementation	# of programs consolidated				1,00				1.200.000,00
Public Information campaign and material design	PIC implemented				1,00				175.000,00
Central and district offices rehabilitated	# of offices rehabilitated				6,00				200.000,00
Development of disability assessment mechanism	report completed				1,00				50.000,00
Social Care Assessment	# of reports				1,00				50.000,00
Administration and Operating cost	# dmin support				1,00				226.080,00
<b>Component 2 - Conditional Cash Grants</b>									
Eligible beneficiary households receiving cash transfers	# of households				15.500,00				8.500.000,00
<b>Strengthening Health and Education Services</b>									
Number of clinics with updated Growth and Development Tools	# of clinics				120,00				1.213.920,00
Number of health professionals trained/ retrained in the delivery of well-baby, toddler checkups and prenatal care with nutritional counseling	#of health professionals trained				120,00				200.000,00
teachers trained using newly developed training modules	#of teachers trained				150,00				300.000,00
Number of beneficiary students accessing school places due to school fee waivers	#of students				875,00				700.000,00
<b>Monitoring and Evaluation</b>									
Impact evaluation, Process Evaluations and Financial Audits	# of eval and audits				6,00				610.000,00
<b>Contingencies</b>									
contingency budget	#								500.000,00
<b>TOTAL</b>									<b>15.000.000,00</b>
