
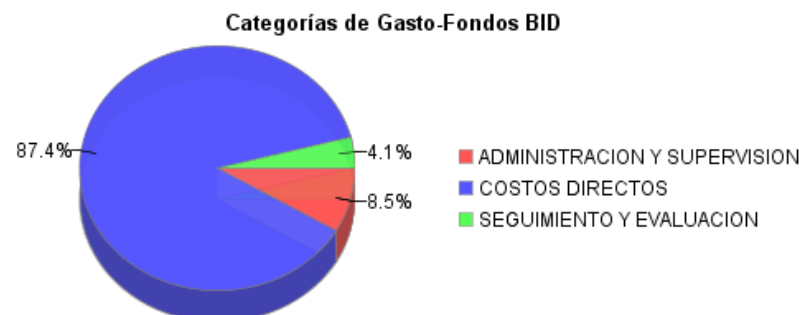
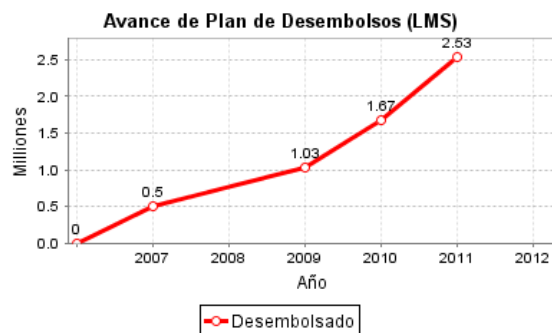



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE): MINISTERIO DE VIVIENDA ORDENAMIENTO TERRIT. Y MEDIO AMBIENTE					
Sector:					
Número(s) de Préstamo:	1866/OC-UR	Monto Aprobado Actual:	5.000.000,00	BID Original:	5.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	2.822.349,49	Actual BID:	5.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	56,45	Pari-passu:	71,00
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo:	2.177.650,51	Co-financiamiento/País:	2.000.000,00
Subtipo de Operación:	SEF - Facilidad Sectorial			Estimado Original:	7.000.000,00
				Período de Amortización (meses):	246

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 20-abr-2012 Validado por Representante de País: 02-may-2012

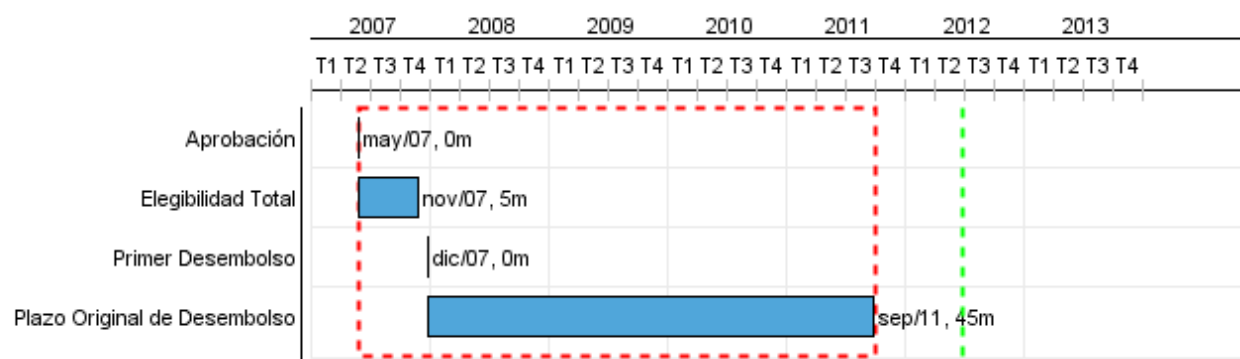

Progreso Acumulado al 2011

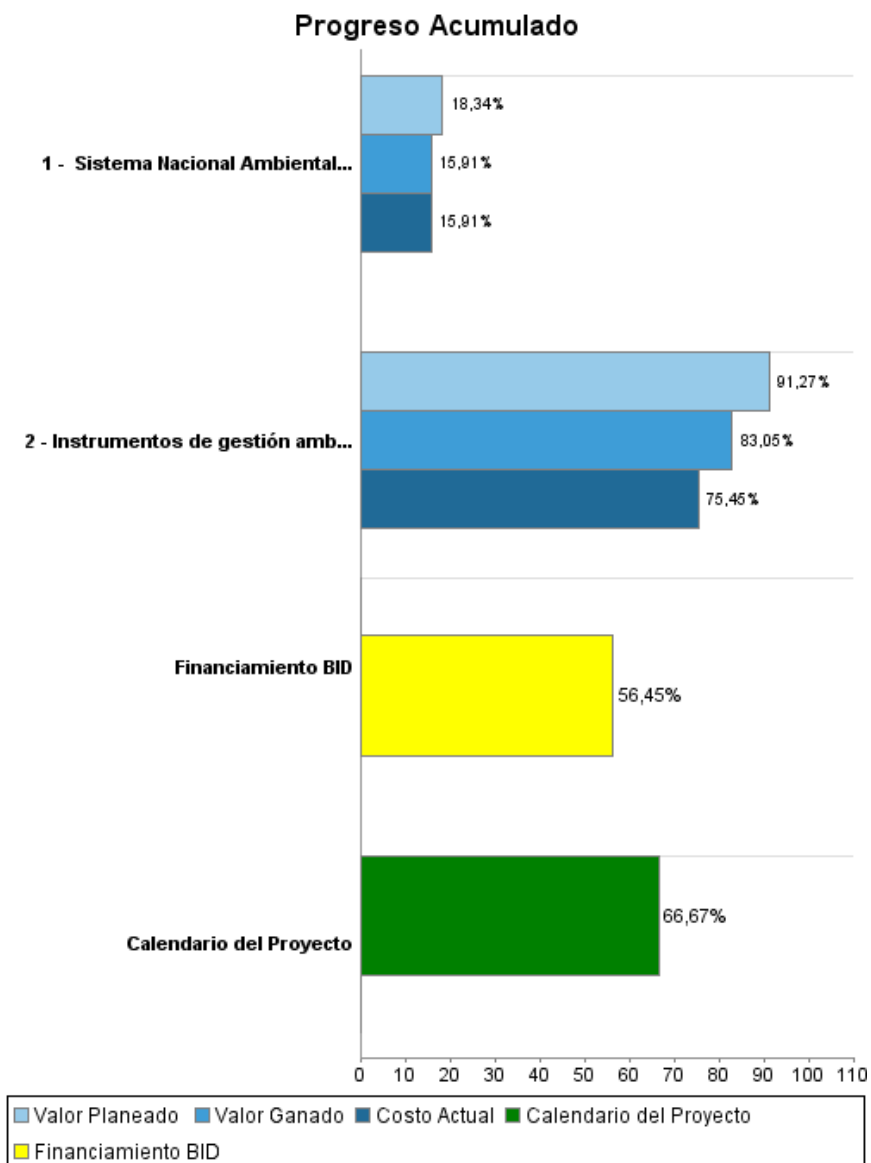

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

UR-L1033 - Modernización de la Institucionalidad para la Gestión y Planificación Ambiental
2011 2º período con cierre al (31-mar-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 18/04/2012

Resultados

Resultado:	Capacidad técnico-operativa de las principales instituciones a cargo de la gestión ambiental del país, fortalecida
Supuestos:	Existe voluntad política para modernizar y actualizar el sistema de gestión ambiental actual

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	Fin de Proyecto
Tiempo de procesamiento de Estudios de Impacto Ambiental en proyectos ambientalmente complejos a cargo de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, cumplen los requisitos de evaluación correspondientes	meses	18.00	2007	P A	14.40 16.00	11.00	11,00
Sistema Nacional Ambiental funcionando, con un organismo cabeza de sector e instituciones sectoriales y departamentales participantes.	Sistema	1.00	2007	P A		1.00	1,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Reingeniería de instrumentos de gestión ambiental prioritarios									
Instrumentos de gestión ambiental prioritarios finalizados	Instrumentos	2,00	0,90		8,00	818.100,00	723.208,00		3.168.700,00
Sistema Nacional Ambiental									
Sistema Nacional Ambiental desarrollado	Sistema				1,00	450.000,00	382.510,00		2.781.300,00
Costos Financieros Administración y Supervisión									
TOTAL						1.268.100,00	1.105.718,00		5.950.000,00
