
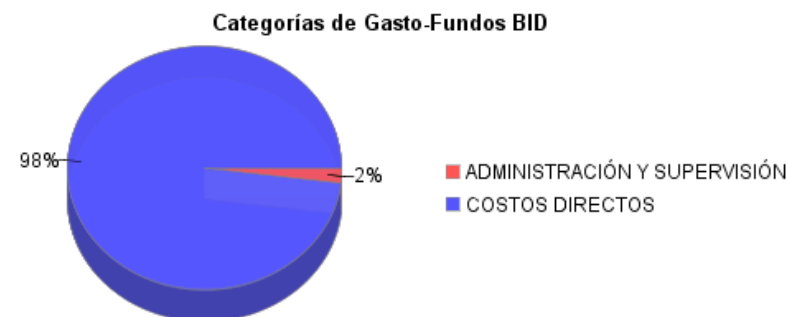
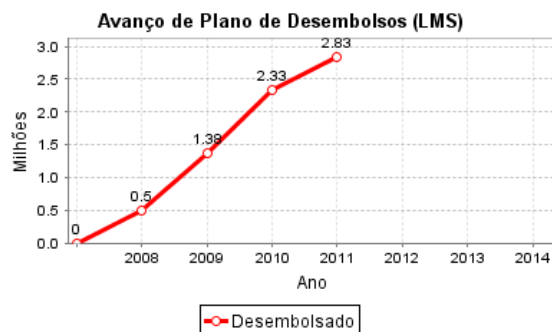



Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE		
Sector: ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND GOVERNANCE		
Número da Operação: 1912/OC-PN	Atual: 10.000.000,00	Original BID: 10.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 2.991.047,05	Corrente BID: 10.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 29,91	Pari-passu: 71,00
Operação Relacionada:	Saldo: 7.008.952,95	Cofinanciamento/País: 4.000.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 14.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 174


Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: C(R)	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 26-abr-2012 Validado pelo Representante do País: 27-abr-2012

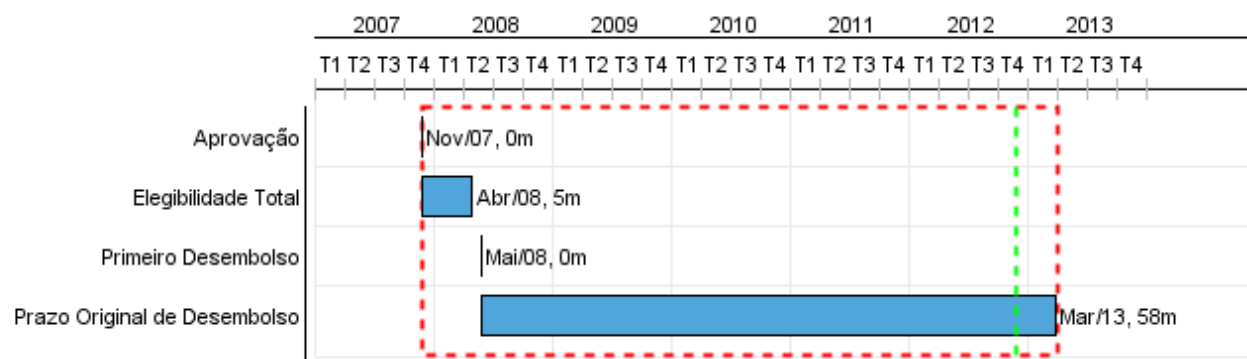

Progresso Acumulado até 2011

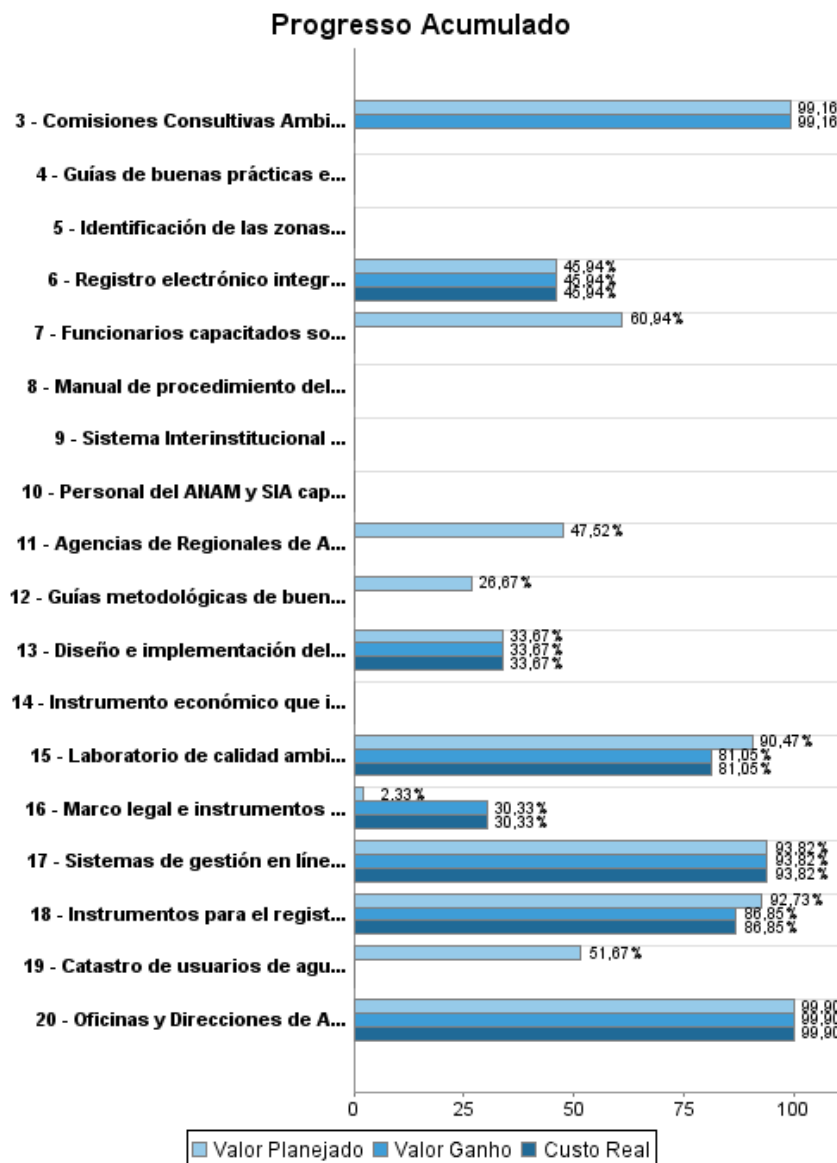

Progresso Acumulado

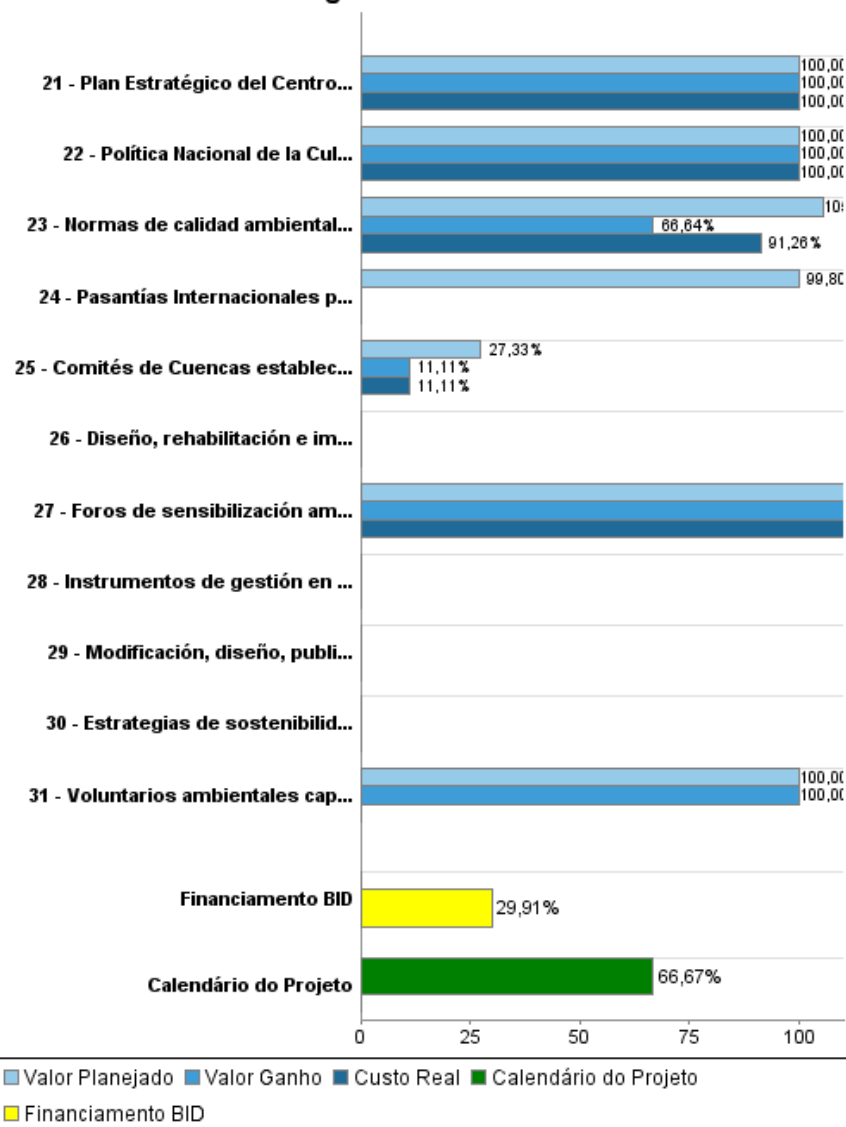

Resultados

Resultado:	Plazos para procesar un EIA según los plazos establecidos por la normativa nacional en la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) mejorados
Suposições:	Se mantiene la política de promover la descentralización de la gestión ambiental.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	Final do Projeto
Periodo para procesar un licenciamiento ambiental (EIA) según la normativa nacional para la categorías I	Días	20.50	2004	P A		10,00
Periodo para procesar un licenciamiento ambiental (EIA) según la normativa nacional para la categorías II	Días	60.60	2004	P A		45,00
Periodo para procesar un licenciamiento ambiental (EIA) según la normativa nacional para la categorías III	Días	86.92	2004	P A		65,00

Resultado:	Oficinas Regionales de ANAM han mejorado la eficiencia en la fiscalización a empresas respecto al cumplimiento de normativa ambiental.
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	Final do Projeto
Empresas que cumplen con la normativa ambiental (en base a EsIA aprobados)	%	31.00	2008	P A		75,00

Resultado:	ANAM cuenta con información hídrica de las cuencas priorizadas
Suposições:	no existe información de aguas subterráneas para la toma de decisiones

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	Final do Projeto
Cuencas priorizadas estudiadas	Cuenca		2005	P A	10,00	10,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Consolidación del Marco de Gestión Ambiental									
Marco legal e instrumentos de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) establecidos	Evaluación		1,00		2,00	7.000,00	91.000,00		300.000,00
Guías metodológicas de buenas prácticas para los EIA (Proyectos mineros, energéticos, urbanísticos, turísticos, rellenos sanitarios, porcinos, avícolas, infraestructura portuaria, entre otros)	Guía				3,00				375.000,00
Pasantías Internacionales para los funcionarios de la ANAM sobre EAE y Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) realizadas.	Funcionario	6,00			6,00	50.000,00			50.100,00
Modificación, diseño, publicación y divulgación del nuevo Decreto Ejecutivo de EIA	Decreto (documento)				1,00				110.000,00
Manual de procedimiento del proceso de evaluación de EIA para el Decreto Ejecutivo 123 elaborado.	Manual				1,00				30.000,00
Funcionarios capacitados sobre Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)	funcionario				180,00	39.000,00			64.000,00
Revisores de EIA en ANAM y Administraciones Regionales, certificados y capacitados	Personas				90,00				100.000,00
Guías de buenas prácticas en EIA (Divulgadas, capacitadas y publicadas)	Guia				7,00				78.000,00
Normas de calidad ambiental elaborados	Documento	1,00			2,00	224.000,00	165.447,00		672.230,00
Sistemas de gestión en línea elaborados e implementados	Sistema		1,00		3,00		48.996,00		176.925,00
Laboratorio de calidad ambiental acreditado según la norma ISO 17025:2005	Laboratorio				1,00	49.000,00	33.689,00		162.487,00
Sistema Interinstitucional del Ambiente (SIA) cuenta con manual para la implementación del reglamento	Reglamento				1,00				48.000,00
Personal del ANAM y SIA capacitados en procesos del sistema ambiental.	Personas				70,00				56.000,00
Instrumento económico que incentiva las inversiones ambientales diseñados.	Documento				1,00				50.000,00
Fortalecimiento Estratégico Territorial									
Agencias de Regionales de ANAM capacitadas y equipados para el seguimiento, control y fiscalización ambiental	Agencia	3,00			3,00	722.000,00			1.519.419,00
Control y fiscalización del uso de los recursos naturales (Propuesta de Ley de Caza)	Documento				1,00	40.000,00			215.000,00

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Instrumentos para el registro de datos, generación, gestión y análisis de información ambiental (documentos), implementados.	Instrumento		2,00		1,00	101.000,00	52.613,00		822.848,00
Foros de sensibilización ambiental para las Oficinas Regionales y Central de ANAM	Foros		2,00		2,00		100.000,00		100.000,00
Plan Estratégico del Centro de Desarrollo Sostenible Ambiental (CEDESAM) diseñado	Documento		1,00		1,00				36.000,00
Política Nacional de la Cultura Ambiental elaborada	Documento		1,00		1,00				50.000,00
Voluntarios ambientales capacitados en iniciativas de educación ambiental	Voluntarios	55,00	55,00		55,00	11.000,00			11.000,00
Comisiones Consultivas Ambientales creadas y capacitadas	Comisiones	28,00	28,00		28,00	19.000,00			19.160,00
Oficinas y Direcciones de ANAM equipadas	Institución				1,00				1.000.000,00
Gestión Integrada de Recursos Hídricos									
Diseño e implementación del sistema de información hídrica	Sistema				1,00				300.000,00
Diseño, rehabilitación e implementación y operación de las estaciones hidrométricas en el Arco Seco diseñados.	piezometro				80,00				450.000,00
Catastro de usuarios de agua en cuencas prioritarias del Arco Seco realizado.	Documento				1,00	31.000,00			60.000,00
Registro electrónico integrado de disponibilidad de agua, usuarios, permisos y concesiones operativo en la web	Sistema				1,00				740.052,00
Estrategias de sostenibilidad ambiental implementadas en cuencas hidrográficas	Documento				5,00				1.490.000,00
Comités de Cuencas establecidos y capacitados.	Comité				7,00	54.000,00			332.950,00
Identificación de las zonas de descarga de acuíferos y desarrollo del plan para su protección	hectáreas				400,00				950.000,00
Instrumentos de gestión en cuencas y áreas críticas (planes de manejo y caudales ambientales)	planes o instrumento de gestión				8,00				986.000,00
Administración del Programa									
TOTAL						1.347.000,00	491.745,00		11.355.171,00
