
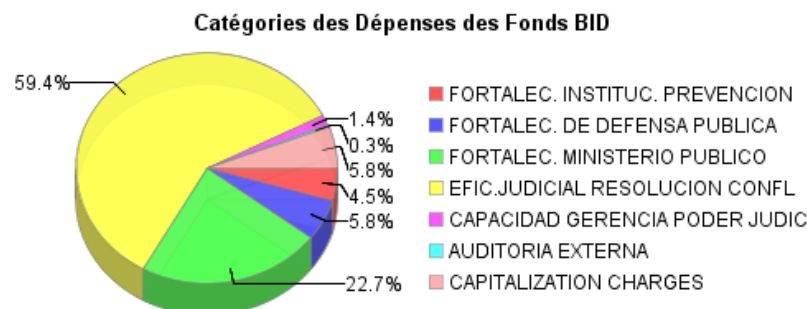
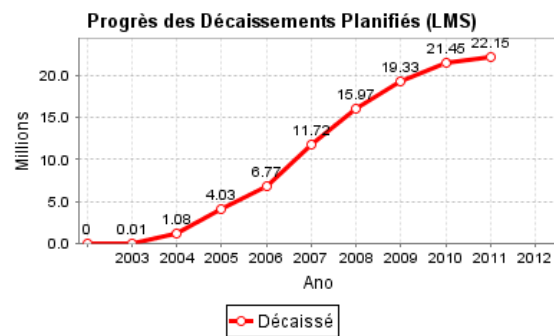



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA): CORTE SUPREMA DE JUSTICIA					
Secteur:					
Numéro(s) de Prêt(s): 1377/OC-CR		Montant Courant Approuvé:	22.400.000,00	Initial BID:	22.400.000,00
Étape: Approved		Montant Décaissé à ce Jour:	22.148.987,90	Courant BID:	22.400.000,00
Type d' Opération: INV - Investissement		% Décaissé:	98,88	Pari Passu:	70,00
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	251.012,10	Cofinancement/Pays:	9.600.000,00
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation				Estimation Initiale:	32.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	228

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B13(R)	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 22-abr-2012 Validé par le Représentant: 30-abr-2012

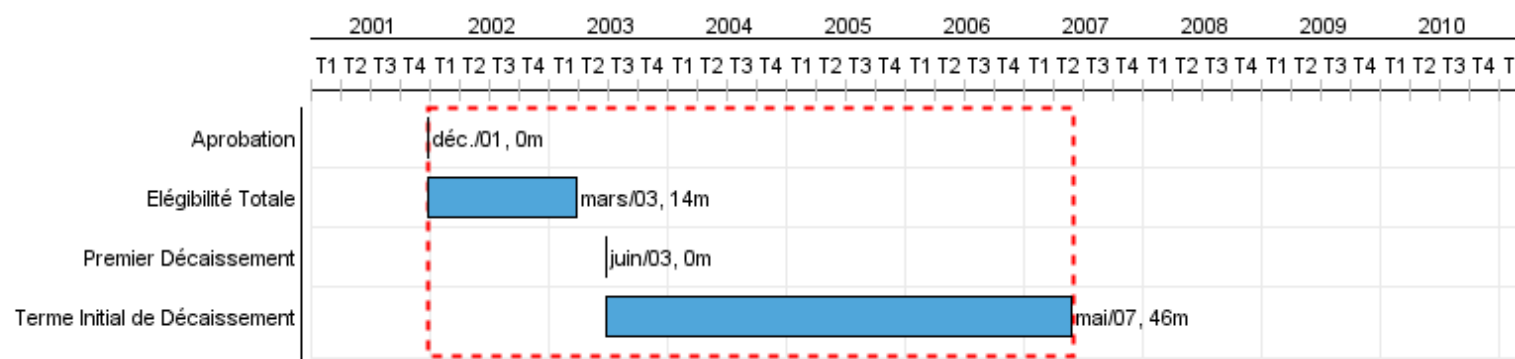

Progrès Cumulé à 2011

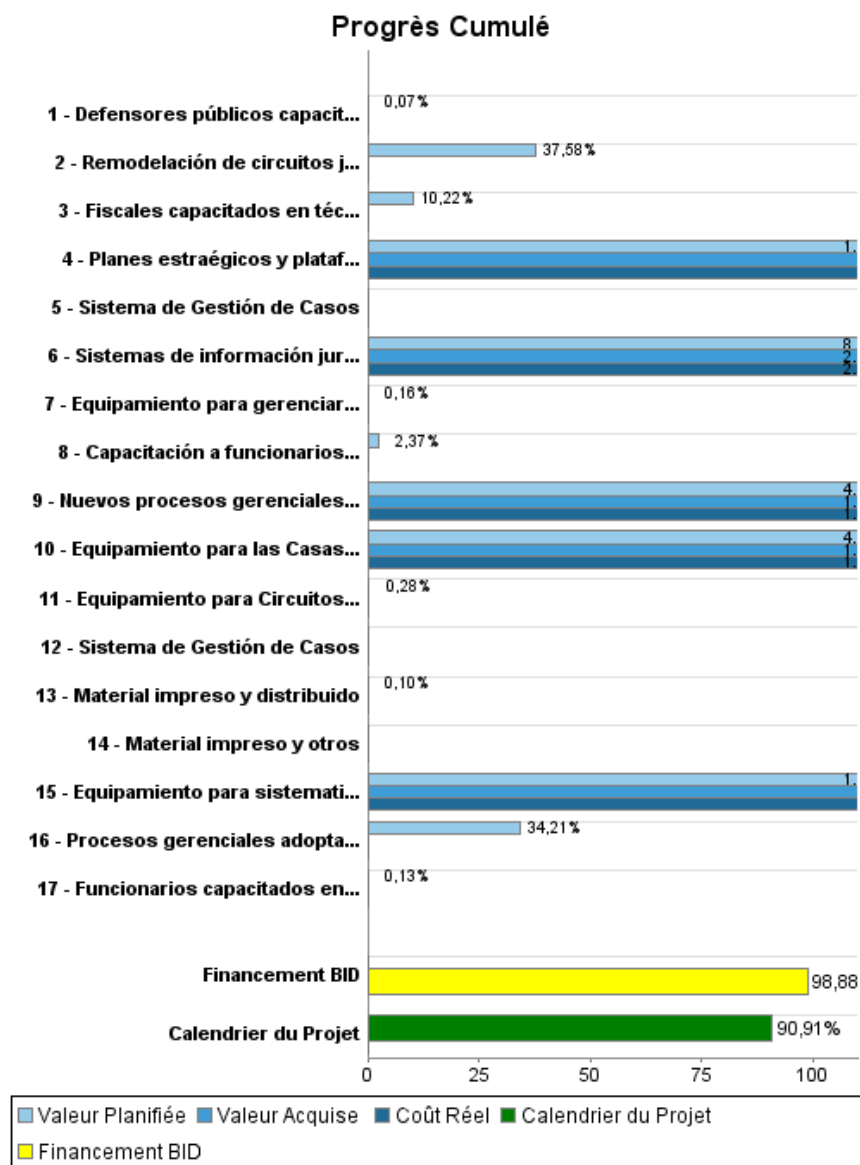

Résultats

Résultat: Eficiencia de la Administración de justicia mejorada.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2003	2005	2008	2009	Fin du Projet
Tasa de congestión global.	casos registrados	1.58	2002	P					0,00
				A	1.63	2.02	2.14	2.31	
Tasa de resolución de casos ingresados	casos registrados	61.20	2001	P					0,00
				A	61.40	49.40	46.80	43.30	
Costo medio de caso terminado (US\$)	USA dolar	401.00	2001	P					0,00
				A	436.30	425.00	529.20	539.70	

Résultat: Transparencia de la Administración de la Justicia mejorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2003	2005	2008	2009	Fin du Projet
Encuesta anual de percepción ciudadana.	Escala de 1 a 5 (1 muy bajo, 5 muy alto)	3.00	2003	P	3.29		4.00		4,00
				A					

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
CAPACIDAD DE GERENCIA DEL PODER JUDICIAL (Proyecto E)									
Nuevos procesos gerenciales adoptados y en funcionamiento	estudios	3,00				80,00			219.000,00
Equipamiento para gerenciar sistemas de información adquiridos y en funcionamiento	unidades	3,00				160,00			100.000,00
FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO PUBLICO (Proyecto C)									
Planes estratégicos y plataformas tecnológicas adoptados y en funcionamiento	estudios					1.287.700,00			2.325.000,00
Equipo informático para sistemas de información adquirido y en funcionamiento	unidades								2.250.000,00
Fiscales capacitados en técnicas de gestión	fiscales				150,00	53.150,00			520.000,00
Sistema de Gestión de Casos	sistema				1,00				
Material impreso y otros	unidades					6.000,00			
Fortalecimiento institucional para la prevención del Delito. (PROYECTO A)									
Equipamiento para las Casas de Justicia adquirido y en funcionamiento	estudios				6,00				189.000,00
Funcionarios capacitados en materia de prevención del delito	funcionarios					420,00			311.300,00
Políticas nacionales de prevención del delito adoptadas y en funcionamiento	estudios								426.300,00
Material impreso y distribuido	unidades					90,00			92.500,00
FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA PUBLICA. (Proyecto B)									
Equipamiento para sistematización de gestión de casos adquirido y en funcionamiento	unidades								700.000,00
Procesos gerenciales adoptados y en funcionamiento	estudios					171.710,00			502.000,00
Defensores públicos capacitados en gestión integral de casos	defensores públicos					70,00			97.000,00
Sistema de Gestión de Casos	sistema				1,00				
Eficiencia Judicial en la resolución de conflictos (PROYECTO D)									
Sistemas de información jurídica adoptados y en funcionamiento	estudios					7.560,00			894.800,00
Equipamiento para Circuitos Judiciales adquirido y en funcionamiento	unidades					21.650,00			7.686.111,00
Remodelación de circuitos judiciales concluida	m2					1.658.250,00			4.412.890,00

RAPPORT DE SUIVI

CR0141 - Judiciary Modernization Program II
2011 2e período con cierre al (31-mars-2012)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 20/04/2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Capacitación a funcionarios judiciales concluida	funcionarios judiciales					7.240,00			306.088,00
ADMINISTRACION, AUTORIA EXTERNA, IMPREVISTOS Y GASTOS FINANCIEROS									
TOTAL						3.214.080,00			21.031.989,00
