

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE
Secteur: ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND GOVERNANCE
Numéro(s) de Prêt(s): 1912/OC-PN
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 10.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour: 2.991.047,05
% Décaissé: 29,91
Solde: 7.008.952,95

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 10.000.000,00
Courant BID: 10.000.000,00
Pari Passu: 71,00
Cofinancement/Pays: 4.000.000,00
Estimation Initiale: 14.000.000,00
Période d'Amortissement (mois): 174

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Reformulation




Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: C(R)


() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: 26-abr-2012


Validé par le Représentant: 27-abr-2012

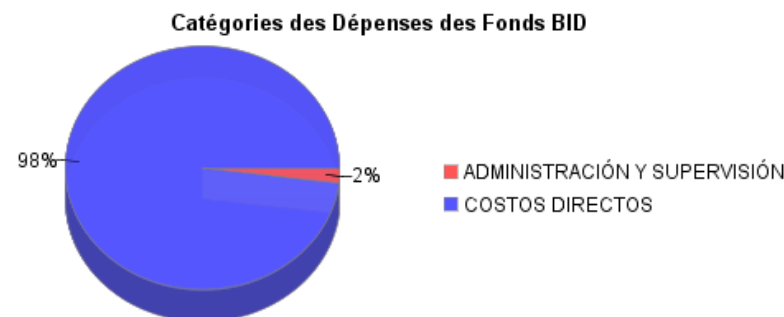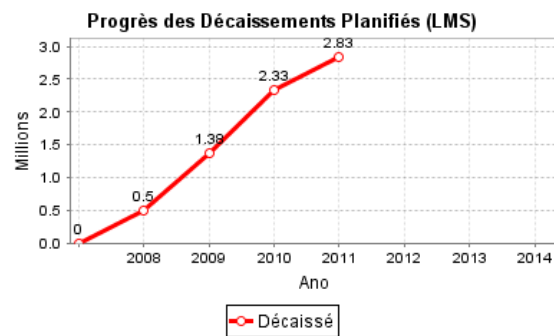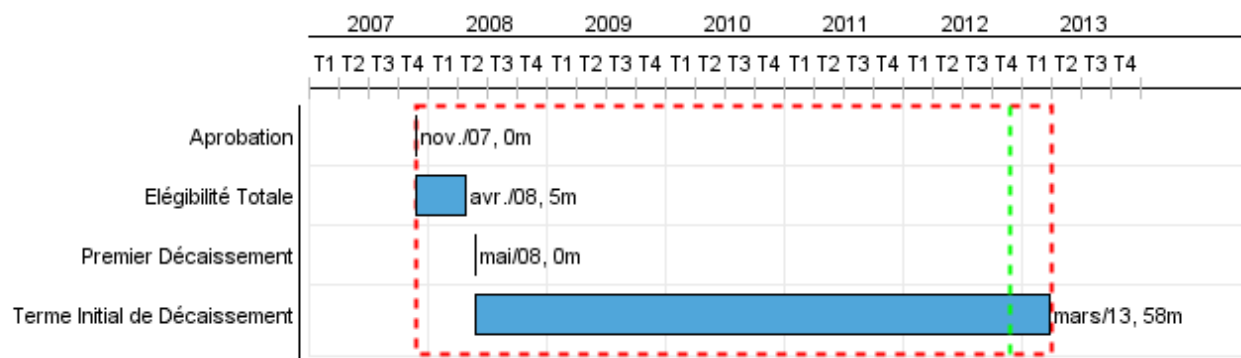

Progrès Cumulé à 2011

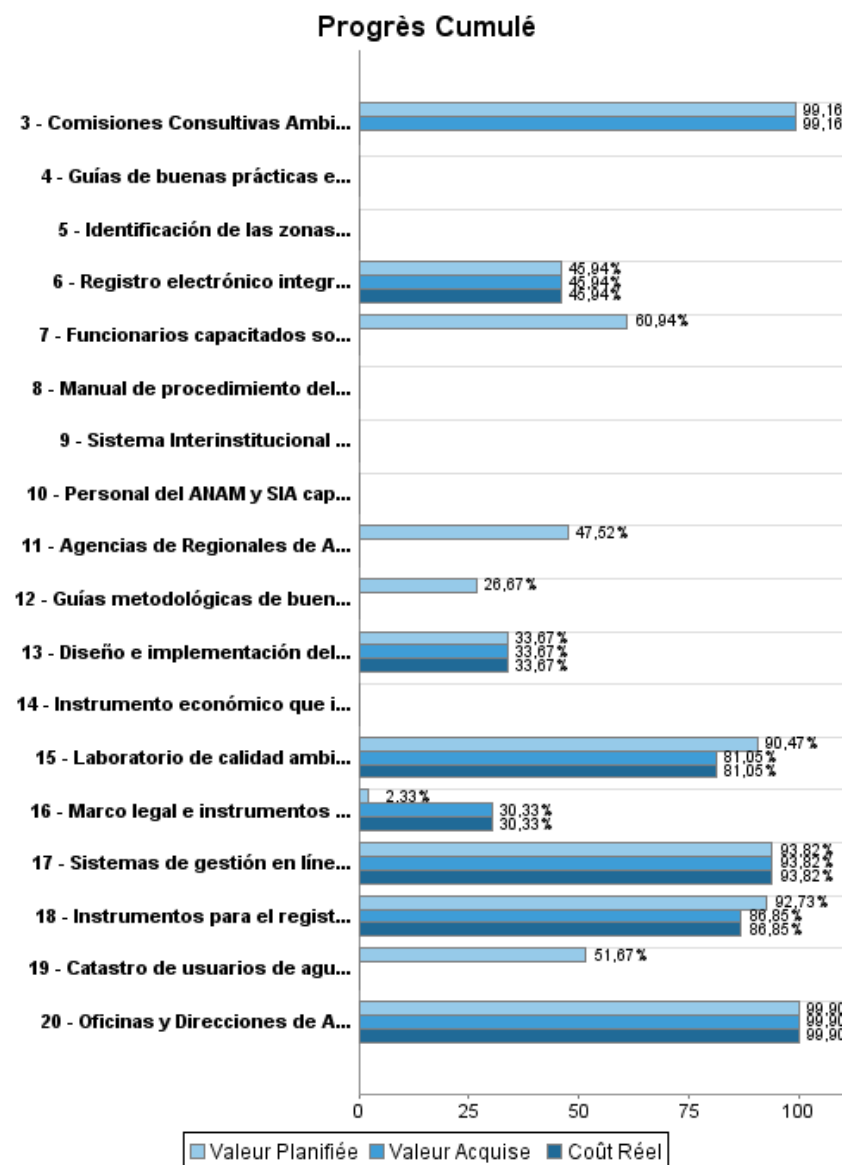

Progrès Cumulé

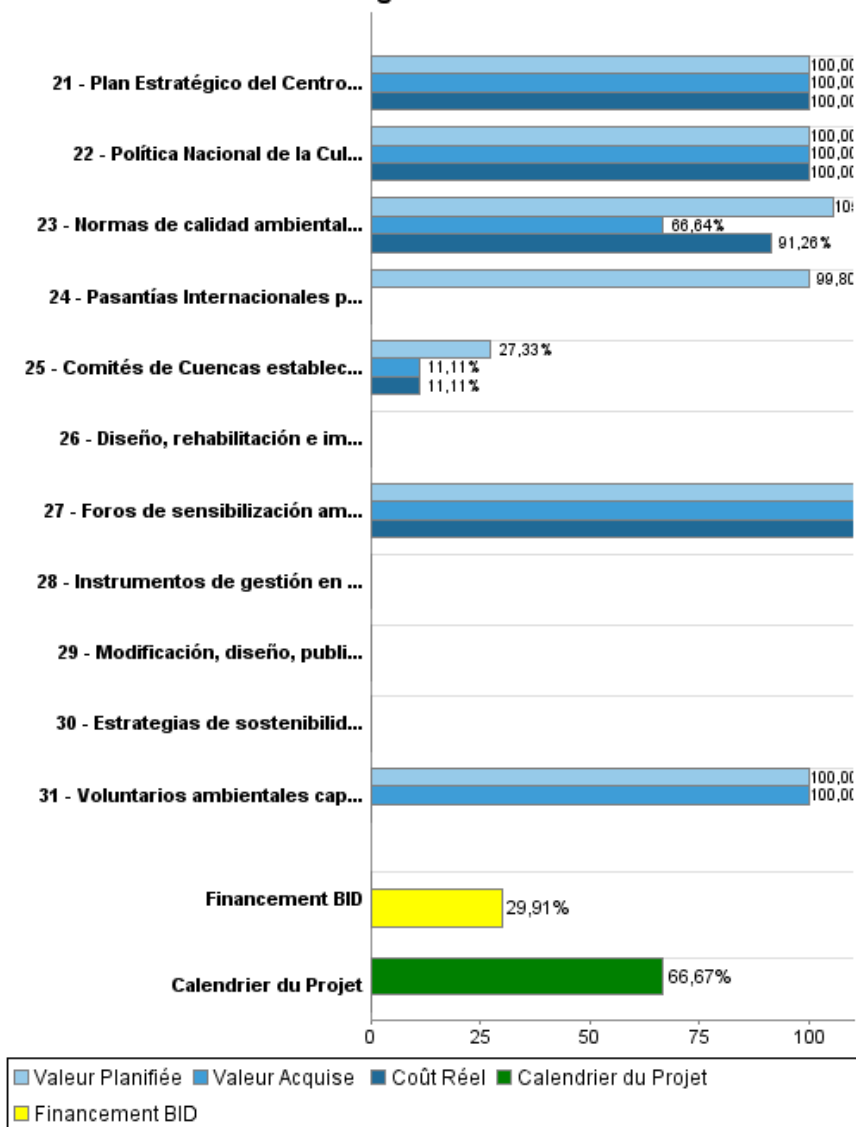

Résultats

Résultat:	Plazos para procesar un EIA según los plazos establecidos por la normativa nacional en la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) mejorados
Suposições:	Se mantiene la política de promover la descentralización de la gestión ambiental.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Periodo para procesar un licenciamiento ambiental (EIA) según la normativa nacional para la categorías I	Días	20.50	2004	P A		10,00
Periodo para procesar un licenciamiento ambiental (EIA) según la normativa nacional para la categorías II	Días	60.60	2004	P A		45,00
Periodo para procesar un licenciamiento ambiental (EIA) según la normativa nacional para la categorías III	Días	86.92	2004	P A		65,00

Résultat:	Oficinas Regionales de ANAM han mejorado la eficiencia en la fiscalización a empresas respecto al cumplimiento de normativa ambiental.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Empresas que cumplen con la normativa ambiental (en base a EsIA aprobados)	%	31.00	2008	P A		75,00

Résultat:	ANAM cuenta con información hídrica de las cuencas priorizadas
Suposições:	no existe información de aguas subterráneas para la toma de decisiones

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Cuencas priorizadas estudiadas	Cuenca		2005	P A	10.00	10,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Consolidación del Marco de Gestión Ambiental									
Marco legal e instrumentos de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) establecidos	Evaluación		1,00		2,00	7.000,00	91.000,00		300.000,00
Guías metodológicas de buenas prácticas para los EIA (Proyectos mineros, energéticos, urbanísticos, turísticos, rellenos sanitarios, porcinos, avícolas, infraestructura portuaria, entre otros)	Guía				3,00				375.000,00
Pasantías Internacionales para los funcionarios de la ANAM sobre EAE y Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) realizadas.	Funcionario	6,00			6,00	50.000,00			50.100,00
Modificación, diseño, publicación y divulgación del nuevo Decreto Ejecutivo de EIA	Decreto (documento)				1,00				110.000,00
Manual de procedimiento del proceso de evaluación de EIA para el Decreto Ejecutivo 123 elaborado.	Manual				1,00				30.000,00
Funcionarios capacitados sobre Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)	funcionario				180,00	39.000,00			64.000,00
Revisores de EIA en ANAM y Administraciones Regionales, certificados y capacitados	Personas				90,00				100.000,00
Guías de buenas prácticas en EIA (Divulgadas, capacitadas y publicadas)	Guia				7,00				78.000,00
Normas de calidad ambiental elaborados	Documento	1,00			2,00	224.000,00	165.447,00		672.230,00
Sistemas de gestión en línea elaborados e implementados	Sistema		1,00		3,00		48.996,00		176.925,00
Laboratorio de calidad ambiental acreditado según la norma ISO 17025:2005	Laboratorio				1,00	49.000,00	33.689,00		162.487,00
Sistema Interinstitucional del Ambiente (SIA) cuenta con manual para la implementación del reglamento	Reglamento				1,00				48.000,00
Personal del ANAM y SIA capacitados en procesos del sistema ambiental.	Personas				70,00				56.000,00
Instrumento económico que incentiva las inversiones ambientales diseñados.	Documento				1,00				50.000,00
Fortalecimiento Estratégico Territorial									
Agencias de Regionales de ANAM capacitadas y equipados para el seguimiento, control y fiscalización ambiental	Agencia	3,00			3,00	722.000,00			1.519.419,00
Control y fiscalización del uso de los recursos naturales (Propuesta de Ley de Caza)	Documento				1,00	40.000,00			215.000,00

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Instrumentos para el registro de datos, generación, gestión y análisis de información ambiental (documentos), implementados.	Instrumento		2,00		1,00	101.000,00	52.613,00		822.848,00
Foros de sensibilización ambiental para las Oficinas Regionales y Central de ANAM	Foros		2,00		2,00		100.000,00		100.000,00
Plan Estratégico del Centro de Desarrollo Sostenible Ambiental (CEDESAM) diseñado	Documento		1,00		1,00				36.000,00
Política Nacional de la Cultura Ambiental elaborada	Documento		1,00		1,00				50.000,00
Voluntarios ambientales capacitados en iniciativas de educación ambiental	Voluntarios	55,00	55,00		55,00	11.000,00			11.000,00
Comisiones Consultivas Ambientales creadas y capacitadas	Comisiones	28,00	28,00		28,00	19.000,00			19.160,00
Oficinas y Direcciones de ANAM equipadas	Institución				1,00				1.000.000,00
Gestión Integrada de Recursos Hídricos									
Diseño e implementación del sistema de información hídrica	Sistema				1,00				300.000,00
Diseño, rehabilitación e implementación y operación de las estaciones hidrométricas en el Arco Seco diseñados.	piezometro				80,00				450.000,00
Catastro de usuarios de agua en cuencas prioritarias del Arco Seco realizado.	Documento				1,00	31.000,00			60.000,00
Registro electrónico integrado de disponibilidad de agua, usuarios, permisos y concesiones operativo en la web	Sistema				1,00				740.052,00
Estrategias de sostenibilidad ambiental implementadas en cuencas hidrográficas	Documento				5,00				1.490.000,00
Comités de Cuencas establecidos y capacitados.	Comité				7,00	54.000,00			332.950,00
Identificación de las zonas de descarga de acuíferos y desarrollo del plan para su protección	hectáreas				400,00				950.000,00
Instrumentos de gestión en cuencas y áreas críticas (planes de manejo y caudales ambientales)	planes o instrumento de gestión				8,00				986.000,00
Administración del Programa									
TOTAL						1.347.000,00	491.745,00		11.355.171,00
