
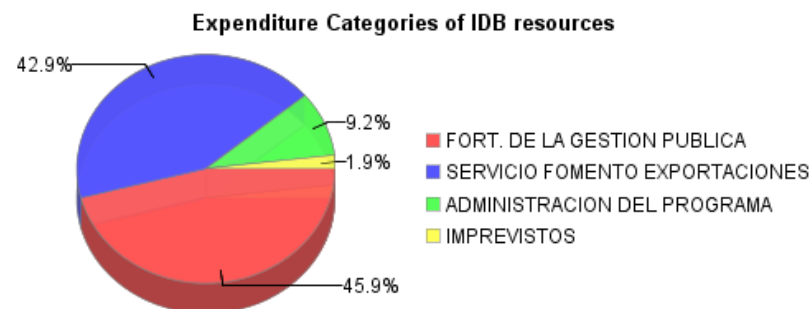
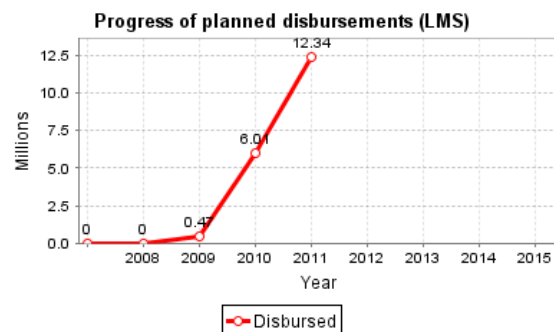



Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS				
Sector:	PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT-BUSINESS CLIMATE				
Loan Number(s):	1941/OC-PN	Current Approved Amount:	51.323.000,00	Original IDB:	51.323.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	16.115.353,18	Current IDB:	51.323.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	31,40	Pari-passu:	53,00
Related Operation(s):	PN-T1026, PN-T1032, RG-T2069	Balance:	35.207.646,82	Co-Financing/Country:	44.751.000,00
Operation Subtype:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Original Estimate:	96.074.000,00
				Amortization Period (months):	180

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: None	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 18-abr-2012 Validated by Country Representative: 27-abr-2012

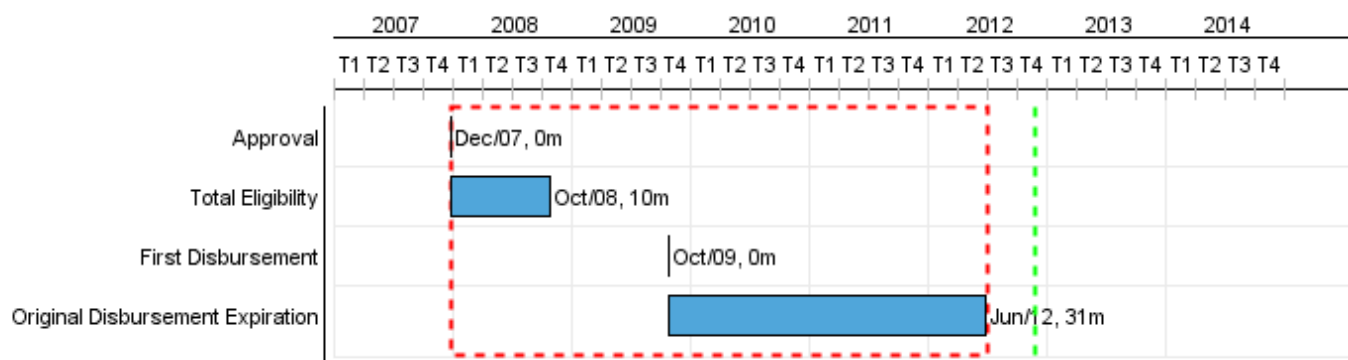

Accumulated Progress as of 2011

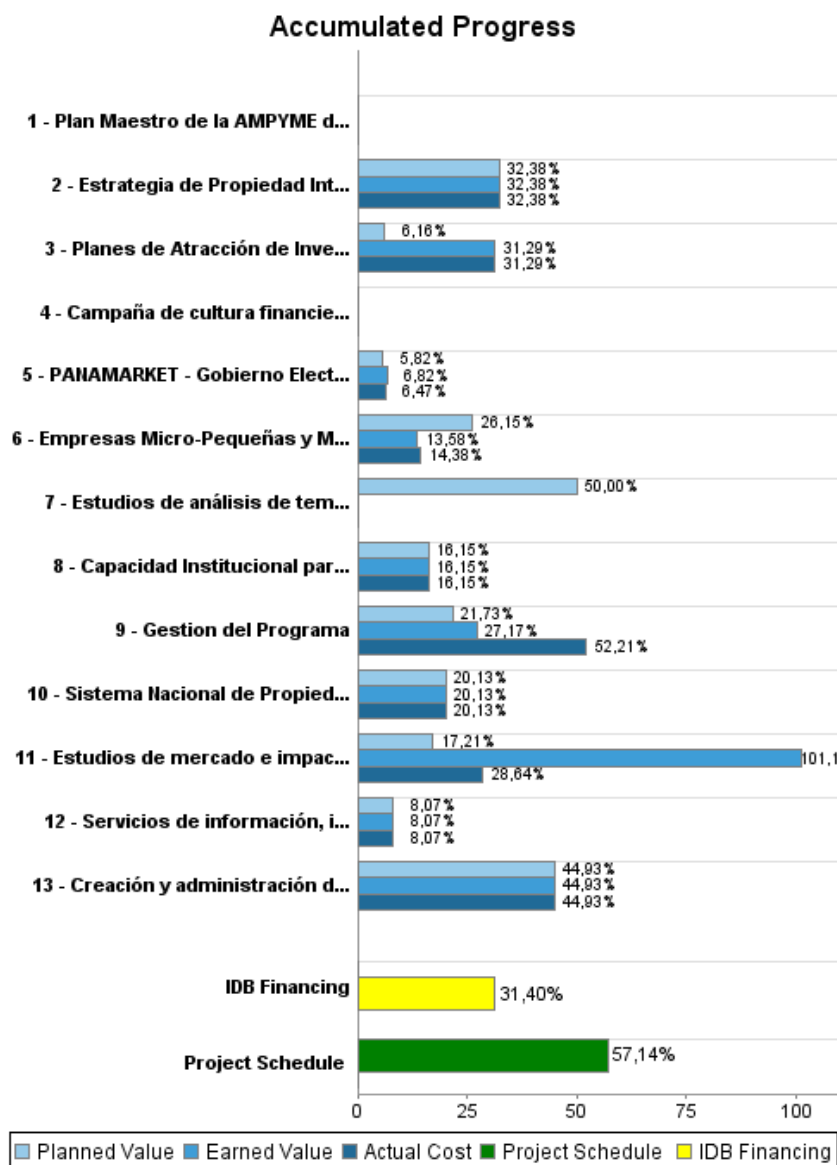

Outcomes

Outcome:	Capacidad de Gobierno de negociaci'on de acuerdos comerciales fortalecida
Comments:	Datos MICI

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	End of project
TLCs firmados	numero TLC	1.00	2006	P	1.00			5,00
				A	1.00			

Outcome:	Desarrollo empresarial intermediado por el sector privado, incrementado
Comments:	Estadísticas de balance de cartera de FINDEC

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	End of project
Monto de creditos entregados a micro-pequenas y medianas empresas a traves de financiacion para el desarrollo de la Competitividad y Productividad (FINDEC) realizados	\$		2006	P			10,000,000.00	25.000.000,00
				A				
Micro-pequenas y medianas empresas a traves de FINDEC financiadas	# empresas		2006	P		25.00		100,00
				A		1,717.00		

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente I: Gestión Pública para la apertura comercial									
Estudios de mercado e impacto publicados	# Estudios	1,00	6,00		4,00	400.000,00	660.000,00		2.383.000,00
Estudios de análisis de temas ambientales y laborales elaborados	# estudios	1,00			4,00	50.000,00			100.000,00
Planes de Atracción de Inversión en mercados estratégicos implementados	# Planes				6,00	200.000,00	1.016.000,00		3.247.000,00
PANAMARKET - Gobierno Electrónico para el comercio e inversión desarrollado	# usuarios				1.000,00	300.000,00	369.000,00		6.877.000,00
Sistema Nacional de Propiedad Intelectual establecido	No. de registros				16.700,00		94.000,00		467.000,00
Servicios de información, inteligencia y promoción comercial desarrollados	No. servicios		1,00		5,00		264.000,00		3.271.000,00
Componente II: Desarrollo de Exportaciones									
Capacidad Institucional para el apoyo a la agroexportación con asistencia implementado	No. de servicios				5,00		2.076.000,00		12.852.000,00
Componente III: Entorno Empresarial Indígena Fortalecido (PRODEI)									
Estrategia de Propiedad Intelectual de productos indígenas implementada	No. de estrategias				1,00		68.000,00		210.000,00
Componente IV: Pro competitividad - Servicios no financieros establecidos									
Empresas Micro-Pequeñas y Medianas Co-Financiadas (Pro competitividad-Servicios no financieros)	#empresas				103,00	4.300.000,00	1.439.000,00		27.535.000,00
Componente V: Desarrollo de la Competitividad y Productividad (FINDEC) financiado									
Creación y administración de un fideicomiso con al menos 1 servicio financiero en operación	No. IFIs financiadas		21,00		20,00		12.369.000,00		27.528.000,00
Componente VI: Entorno Microempresarial Fortalecido - AMPYME									
Plan Maestro de la AMPYME diseñado	No. de planes				1,00				1.350.000,00
Campaña de cultura financiera implementada	No. de capacitados				50.000,00				2.650.000,00
GESTION DEL PROGRAMA									
Gestion del Programa	# indicadores exitosos	1,00	1,00		6,00	1.500.000,00	2.537.000,00		9.203.000,00
TOTAL						6.750.000,00	20.892.000,00		97.673.000,00
