
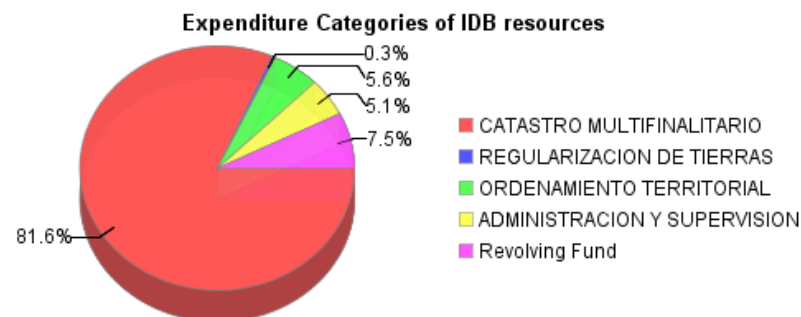
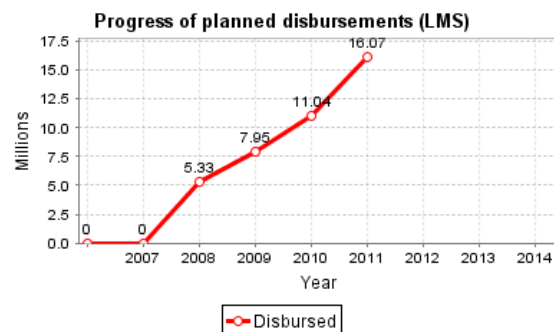



## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)	Total Cost and Source
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS		
Sector:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-LAND ADMINISTRATION AND MANAGEMENT		
Loan Number(s):	1885/OC-PN;1885/OC-PN-1	Current Approved Amount: 54.000.000,00	Original IDB: 81.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date: 50.798.478,31	Current IDB: 54.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed: 94,07	Pari-passu: 71,00
Related Operation(s):	PN-T1055	Balance: 3.201.521,69	Co-Financing/Country: 11.000.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation		Original Estimate: 92.000.000,00
			Amortization Period (months): 199

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: None	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 26-abr-2012 Validated by Country Representative: 27-abr-2012

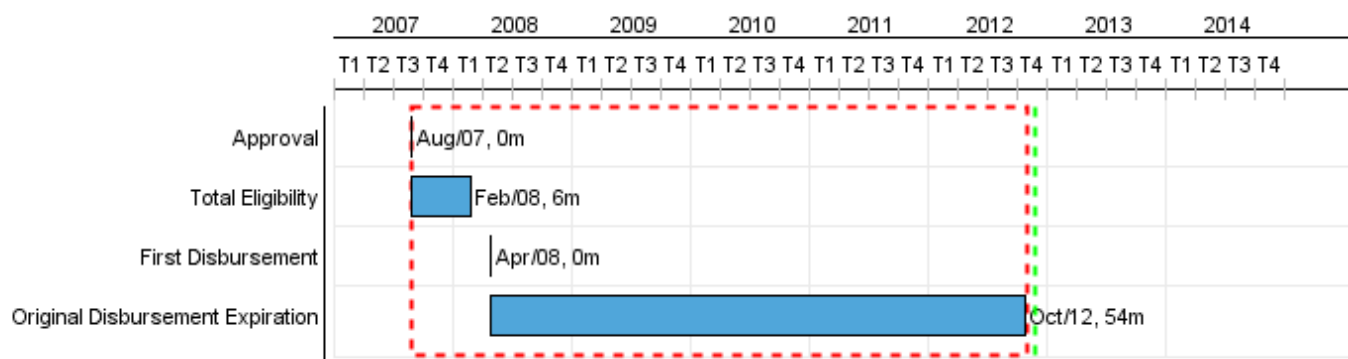

## Accumulated Progress as of 2011

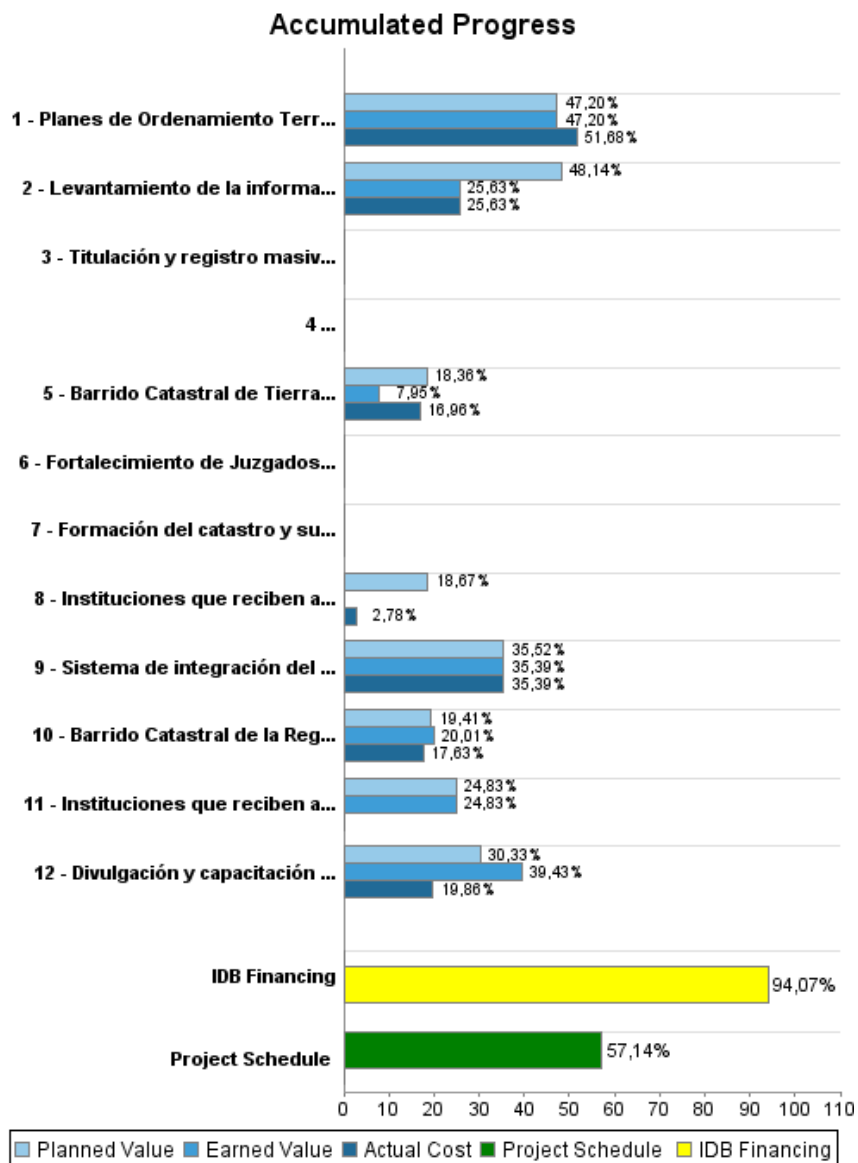

## Outcomes

<b>Outcome:</b>	Titulación y Regularización de predios a nivel urbano y rural integrados sistemáticamente al registro y avalúo masivo.
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Títulos Inscritos en la sección de propiedad del Registro Público	título	96,000.00	2010	P A	110.000,00

**Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011**

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>CATASTRO MULTIFINALITARIO</b>									
Formación del catastro y su integración con otras bases públicas y privadas de información y creación de un sistema informático de vinculación con usuarios	Cobertura				50,00				
<b>REGULARIZACION DE TIERRAS</b>									
Titulación y registro masivo de los predios de la RM, en condición de informalidad	Predios				400.000,00				
<b>ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>									
Planes de ordenamiento territorial elaborados municipal	Plan								
<b>NUEVO MARCO INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACION TERRITORIAL</b>									
<b>ADMINISTRACION Y SUPERVISION 1885</b>									
<b>Catastro Multifinalitario</b>									
Levantamiento de la información fotográfica digital de todo el área Metropolitana y Costa Arriba de Colón	Km				819,00	323.000,00	172.000,00		671.000,00
Sistema de integración del Catastro con otras Bases de Datos Públicas y Privadas y Avalúos Masivos diseñado e implementado	Sistema				1,00	1.080.000,00	1.076.000,00		3.040.771,00
Instituciones que reciben apoyo técnico y equipamiento tecnológico	Institución	3,00	3,00		6,00	250.000,00			1.006.790,00
<b>Servicio de Regularización de Tierras</b>									
Barrido Catastral de la Región Metropolitana	predio	48.355,00	49.870,00		135.000,00	2.300.000,00	2.090.000,00		11.852.552,00
Barrido Catastral de Tierras, Urbanas, Zonas Costeras e Insulares	has	150.000,00	64.989,00		350.000,00	1.000.000,00	924.000,00		5.446.592,00
Instituciones que reciben apoyo técnico y equipamiento tecnológico	Institución	1,00			5,00	400.000,00	59.571,00		2.142.337,00
Divulgación y capacitación de los beneficiarios y entregas de títulos	Evento	30,00	39,00		150,00	91.000,00	59.571,00		300.000,00
<b>Ordenamiento Territorial Municipal</b>									
Planes de Ordenamiento Territorial entregados a sus Municipios	Plan	6,00	6,00		9,00	400.000,00	438.000,00		847.542,00
<b>Nuevo Marco Institucional de la Administración Territorial</b>									
Manuales operativos de campo para el catastro	Documento				1,00				50.000,00
Fortalecimiento de Juzgados para la resolución de conflictos de tenencia de tierras	Juzgado				2,00				325.000,00



## PROGRESS MONITORING REPORT

PN-L1018 - National Land Management Program  
2011 2nd period with closure up to (31-Mar-2012)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 24/04/2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Administración y Supervisión									
TOTAL						5.844.000,00	4.819.142,00		25.682.584,00
