
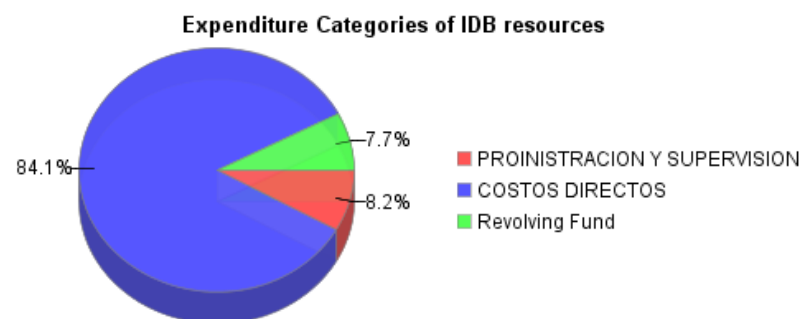
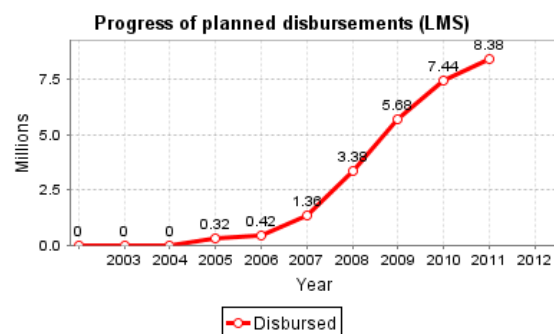



Summary Report

Basic Data	Available Funds (US\$)	Total Cost and Source
Executing Agency (EA): MINISTERIO DE HACIENDA		
Sector: AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-LAND ADMINISTRATION AND MANAGEMENT		
Loan Number(s): 1448/OC-PR;1448/OC-PR-CPS	Current Approved Amount: 9.000.000,00	Original IDB: 18.000.000,00
Stage: Approved	Disbursed Amount to Date: 8.381.514,56	Current IDB: 9.000.000,00
Operation Type: INV - Investment	% Disbursed: 93,13	Pari-passu: 90,00
Related Operation(s):	Balance: 618.485,44	Co-Financing/Country: 1.000.000,00
Operation Subtype: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimate: 19.000.000,00
		Amortization Period (months): 168

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: C(R)	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 26-abr-2012 Validated by Country Representative: 30-abr-2012

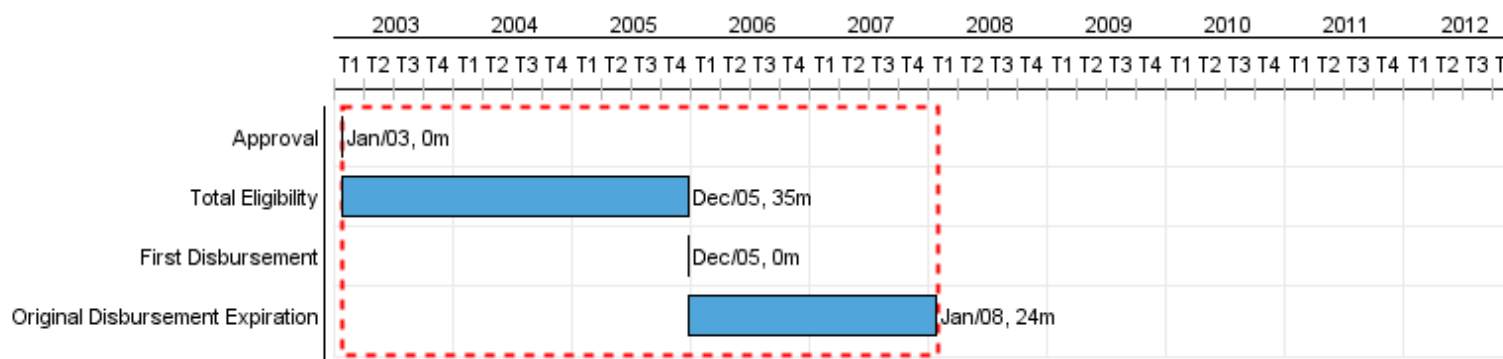

Accumulated Progress as of 2011

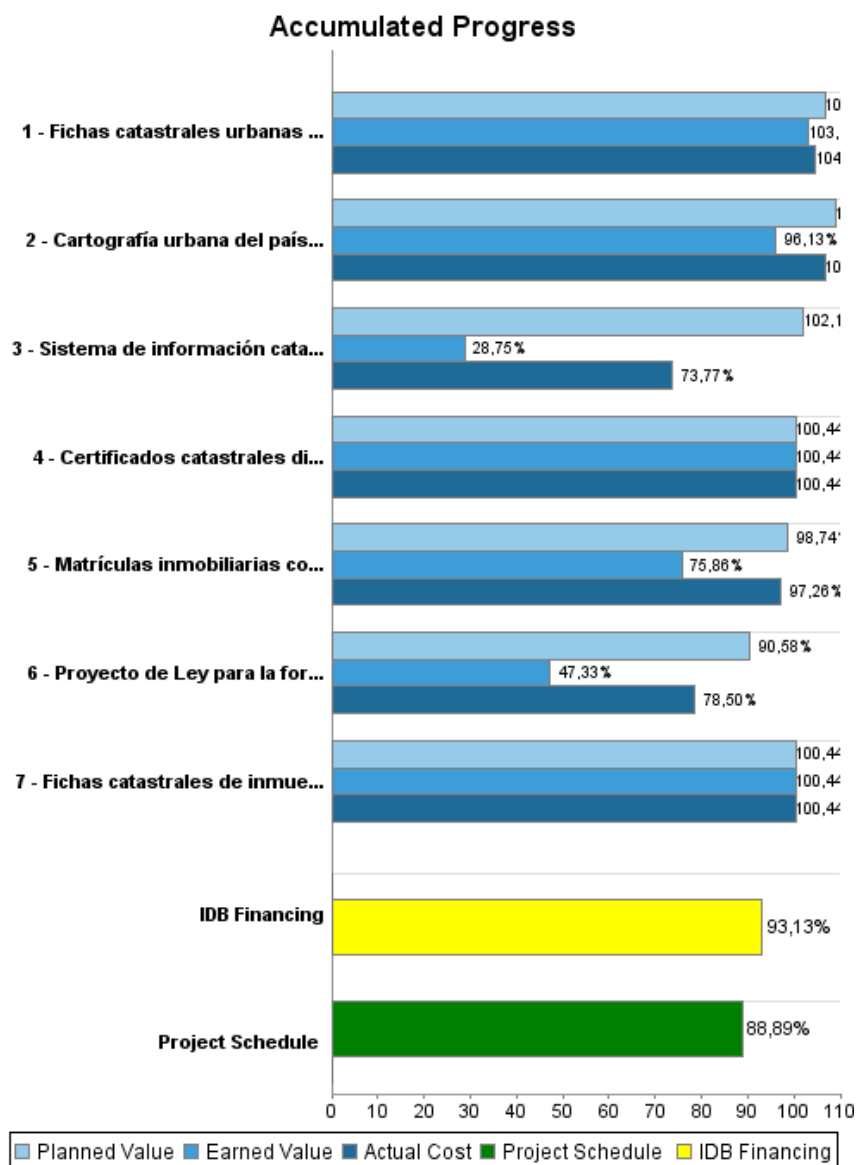

Outcomes

Outcome:	La administración de las tierras en el país es mejorada.
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2007	2008	2009	2010	End of project
Entradas procesadas por registrador en la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP)	Entradas	6.00	2005	P			24.00	24.00	24,00
				A			20.00	20.00	
Oficinas conjuntas de DGRP y Servicio Nacional de Catastro (SNC) en capitales de Alto Paraná, Itapúa y Caaguazú operando.	Oficinas		2005	P	1.00	2.00	3.00	3.00	3,00
				A			2.00	3.00	
Manual de normas de gestión administrativa de DGRP implantado	Manual		2005	P			1.00	1.00	1,00
				A			1.00	1.00	
Manual normas y procedimientos para la formación y actualización catastral funcionando	Manual		2005	P			1.00	1.00	1,00
				A			1.00	1.00	
Registro habilitante de agrimensores implantado	Registro		2005	P			1.00	1.00	1,00
				A				1.00	

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Establecimiento del marco legal y bases técnicas para la formación del catastro registral.									
Proyecto de Ley para la formación de un Catastro Registral presentado al Poder Legislativo.	Proyecto de Ley	1,00	1,00		1,00	40.000,00	8.000,00		265.000,00
Sistema de información catastral y registral vinculadas mediante tecnología informática, funcionando.	Sistema	1,00			1,00	1.080.000,00	200.000,00		3.100.000,00
Modernización del sistema de registro.									
Matrículas inmobiliarias convertidas a formato digital.	Matrículas inmobiliarias	438.000,00	442.402,00		1.194.000,00	442.000,00	398.000,00		2.955.000,00
Modernización del sistema de catastro.									
Fichas catastrales urbanas convertidas a formato digital.	Fichas catastrales	17.000,00	17.000,00		1.500.000,00	30.000,00	20.000,00		473.000,00
Fichas catastrales de inmuebles rurales convertidas a formato digital.	Fichas catastrales				744.000,00				473.000,00
Cartografía urbana del país convertida a formato digital.	Parcelas vectorizadas	63.000,00	63.690,00		1.370.000,00	40.000,00	30.000,00		472.000,00
Certificados catastrales digitalizados.	Certificados escaneados				462.000,00				472.000,00
Administración									
TOTAL						1.632.000,00	656.000,00		8.210.000,00
