
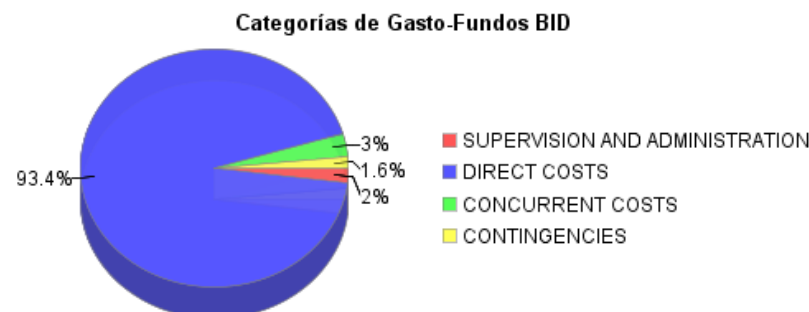
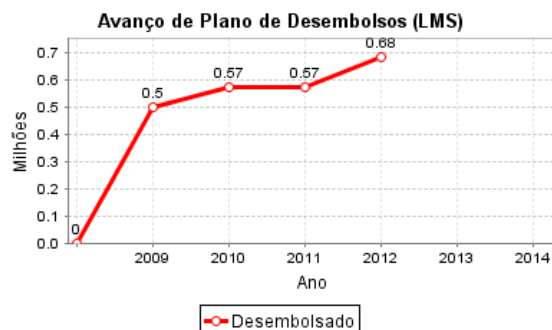



Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTRY OF FINANCE		
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT		
Número da Operação: 2099/OC-BA	Atual: 5.000.000,00	Original BID: 5.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 682.267,89	Corrente BID: 5.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 13,65	Pari-passu: 84,00
Operação Relacionada: BA-T1003, BA-T1020	Saldo: 4.317.732,11	Cofinanciamento/País: 950.000,00
Subtipo de Operação: SEF - Sector Facility		Original Estimado: 5.950.000,00
		Período de Amortização (meses): 174

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B13	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 27-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 30-sep-2012

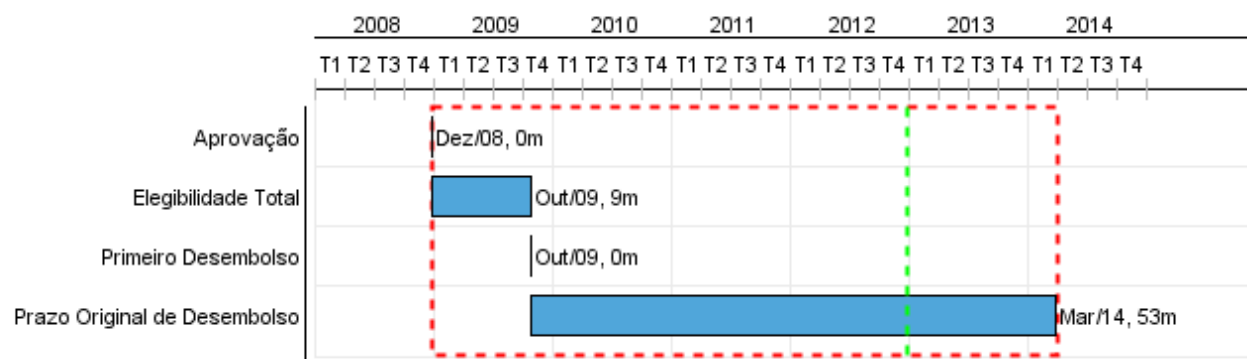

Progresso Acumulado até 2012

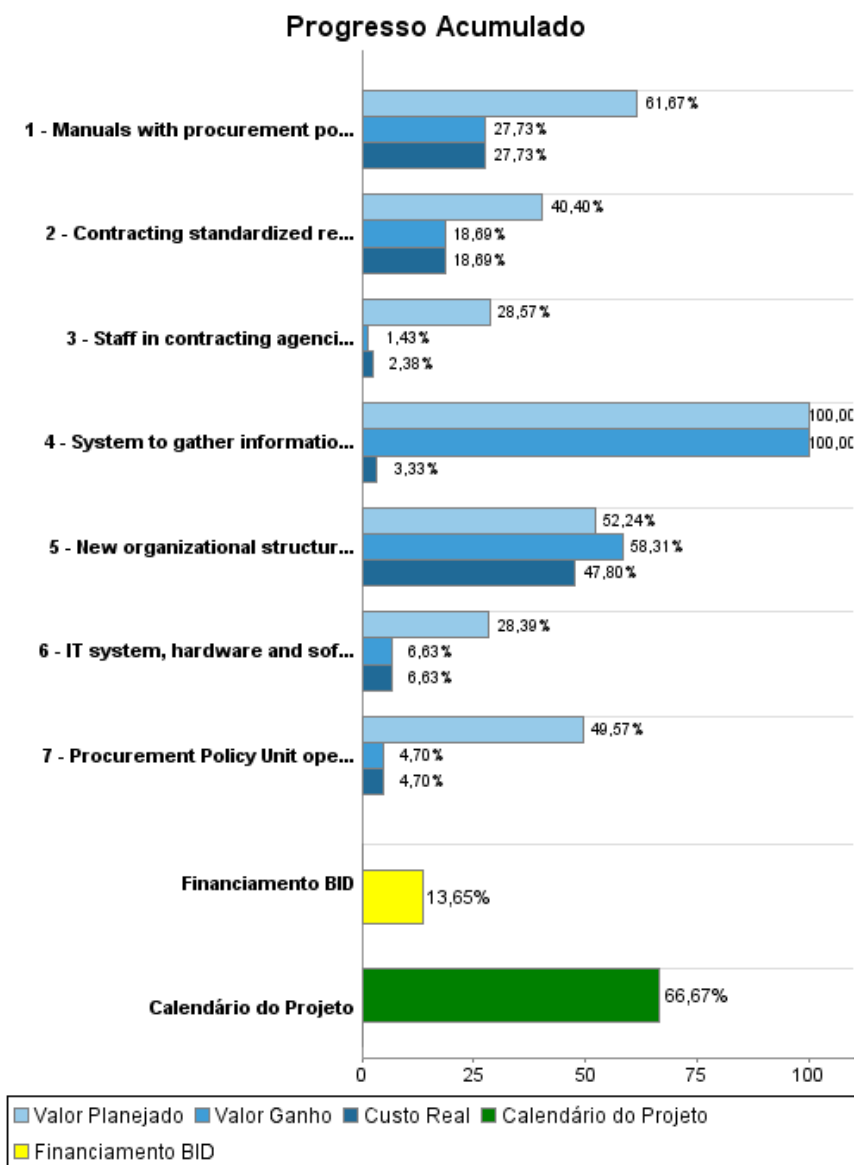

Resultados

Resultado:	Public procurement regulatory framework strengthened
Suposições:	Continued political will exists to adopt and implement a modernized procurement system

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2014	Final do Projeto
New comprehensive procurement legislation approved	Legislation		2008	P	1.00		1.00
				A	1.00		

Resultado:	Procurement operation and marketplace improved
Suposições:	Impetus for reform and modernization of procurement system is stronger than the resistance to change of stakeholders

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2014	Final do Projeto
New organizational structure for the Procurement Policy Policy Unit, the Central Purchasing Department and other procurement entities approved.	Organizational Structure		2008	P	1.00		1.00
				A	1.00		

Resultado:	Procurement institutional capacity strengthened.
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2014	Final do Projeto
Procurement decisions are public and posted online.	%	5.00	2008	P	40.00	90.00	90.00
				A	40.00		

Resultado:	Tecnological infrastructure modernized and updated.
Suposições:	Continued interest and openness of the AUG to expand its competence and knowledge base.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2014	Final do Projeto
E-tendering system and public procurement opportunities webpage established and running.	time		2008	P	3.00	3.00	1.00
				A	1.00		

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
I. Public procurement legal framework strengthened									
Manuals with procurement policy statements, procurement regulations and procedures consistent with the law are prepared.	Framework		1,00		1,00	250.000,00	30.000,00		660.000,00
II. Procurement operations and marketplace improved									
Contracting standardized requirements in place.	Standard set		1,00		1,00	150.000,00	92.497,00		495.000,00
System to gather information on procurement exercises operational	System	1,00	1,00		1,00	300.000,00	10.000,00		300.000,00
Staff in contracting agencies trained in comprehensive procurement procedures	Staff	100,00	5,00		200,00	120.000,00	10.000,00		420.000,00
Procurement Policy Unit operationalized	Procurement Policy Unit		0,50		1,00	255.000,00	7.000,00		575.000,00
III. Procurement institutional capacity strengthened									
New organizational structure for procurement agencies implemented	Organizational Structure	1,00	1,00		1,00	110.000,00	74.810,00		335.000,00
IV. Technological system updated									
IT system, hardware and software and website improved	IT System		0,50		1,00	300.000,00	50.000,00		1.585.000,00
Supervision and Administration									
CPU/PPU	N/A					250.000,00	23.716,00		1.050.000,00
Evaluations and External Auditing									
Evaluations & External Audit	N/A						45.556,00		150.000,00
Contingencies									
Contingencies	N/A								80.000,00
TOTAL						1.735.000,00	343.579,00		5.650.000,00
