
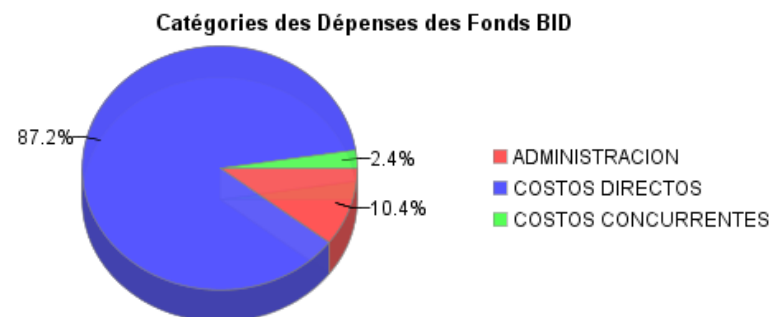
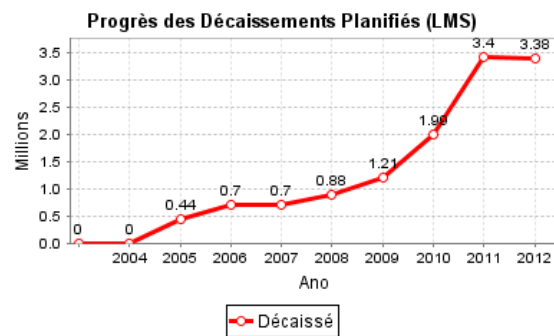



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADMINISTRACIONTRIBUTARIA				
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH				
Numéro(s) de Prêt(s):	1482/OC-PE	Montant Courant Approuvé:	3.384.505,87	Initial BID:	8.859.500,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	3.384.505,87	Courant BID:	3.384.505,87
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	100,00	Pari Passu:	67,00
Opération(s) Connexe(s):	PE-L1130, PE-T1274	Solde:		Cofinancement/Pays:	4.270.400,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	13.129.900,00
				Période d'Amortissement (mois):	186

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: C(R)	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 24-sep-2012 Validé par le Représentant: 27-sep-2012

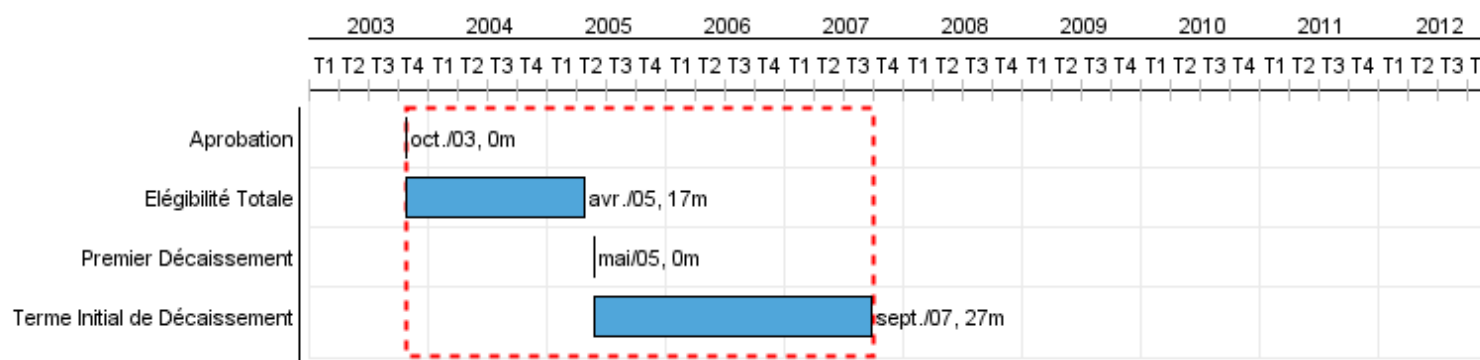

Progrès Cumulé à 2012

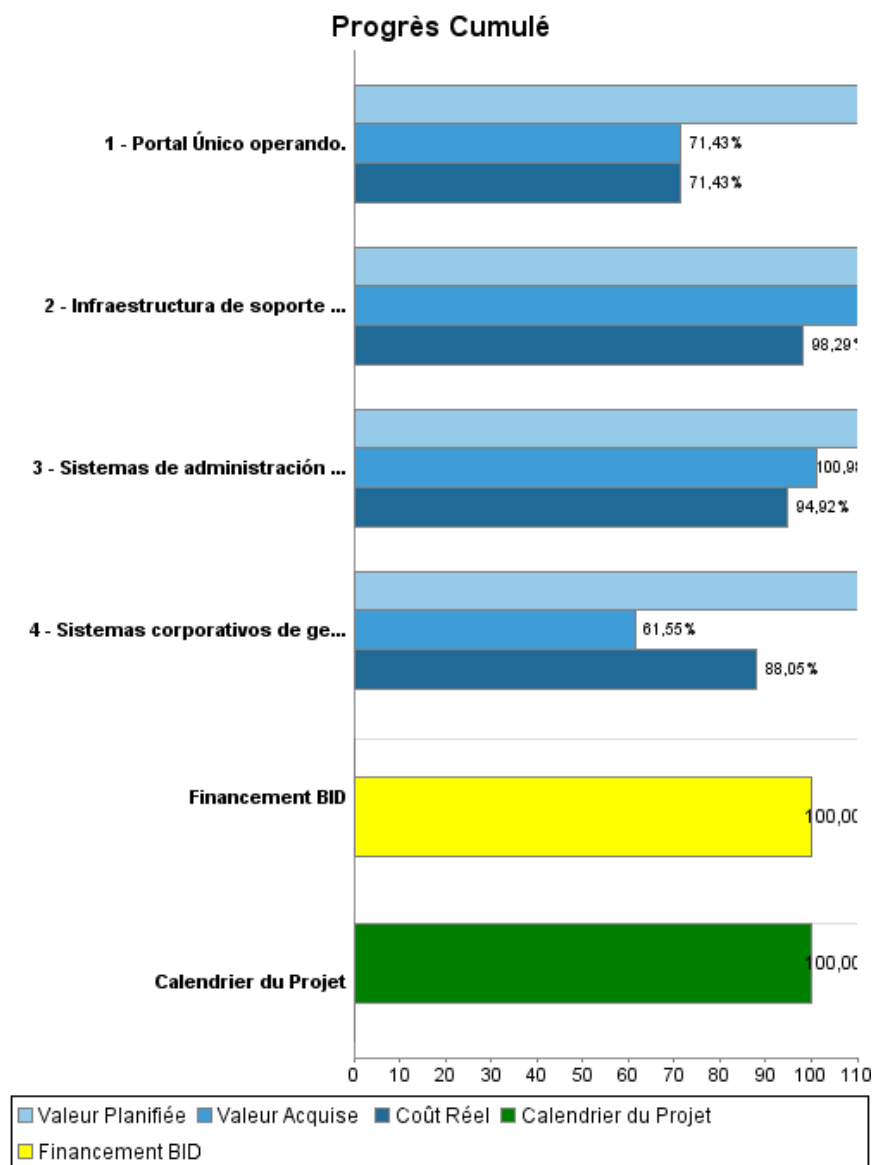

Résultats

Résultat: La gestión administrativa y de apoyo de la nueva SUNAT -luego de la fusión de SUNAD y SUNAT- opera de manera integrada.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	2012	Fin du Projet
Participación del personal de áreas administrativas respecto al total del personal, reducida.	%	31.00	2003	P	21.00	17.00	17.00	17.00	17.00
				A	17.00	17.00	17.00		

Résultat: Procesos para la administración de tributos y control del comercio exterior modernizados.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	2012	Fin du Projet
Tiempo promedio ponderado de despacho de una DUA de importación definitiva sin incidencia, en el canal rojo (revisión física) a nivel nacional, reducido.	Horas	14.90	2003	P	11.00	10.00	9.00	6.70	9.00
				A	8.20	8.10	6.70		
Tiempo promedio ponderado de despacho de una DUA de importación definitiva sin incidencia, en el canal naranja (revisión documentaria) a nivel nacional, reducida.	Horas	5.00	2003	P	3.00	2.50	2.50	1.80	2.50
				A	2.00	2.10	1.80		
Intervenciones terminadas = Auditorias terminadas + Verificaciones terminadas + Acciones Inductivas.	Intervenciones	71,155.00	2003	P	138,434.00	138,434.00	66,056.00	140,688.00	342,924.00
				A	161,448.00	160,987.00	140,688.00		
Acciones de cobranza (medidas cautelares)	Acciones de Cobranza	71,753.00	2003	P	177,000.00	195,880.00	161,601.00	270,544.00	534,481.00
				A	242,530.00	308,133.00	270,544.00		
Recaudacion por Gestion Directa: Pagos de fraccionamiento + Pago de Valores + Telegestión + Ingreso como recaudación de detracciones + Compensaciones de Recaudación + Pagos Inducidos de Fiscalización (verificaciones, auditorias, acciones inductivas y operativos) + Compensaciones	Millones de S/.	3,031,000.00	2007	P	3,765,000.00	3,565,000.00	3,094,000.00	5,484,000.00	3,094,000.00
				A	4,939,000.00	4,527,000.00	5,484,000.00		

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
1. Servicios Corporativos de apoyo fusionados y operando de manera eficiente.									
Sistemas corporativos de gestión y apoyo implementados.	Sistemas	1,00	1,00		2,00	128.000,00	67.342,00		658.000,00
2. Procesos de administración de tributos y control del comercio exterior optimizados									
Sistemas de administración tributaria de tributos y control del comercio exterior implementados.	Sistemas	1,00	1,00		7,00	355.000,00	263.437,00		7.316.000,00
3. Infraestructura de Tecnología estandarizada y modernizada, prestando soporte efectivo a la gestión integrada de la administración tributaria									
Infraestructura de soporte tecnológico puesta en operación.	Infraestructura Tecnológica				1,00	4.000,00	19.137,00		2.972.000,00
Portal Único operando.	Portal	1,00	1,00		1,00				28.000,00
4. Manejo y Administración del Programa									
Manejo Administrativo y Financiero	N/A					30.000,00	21.640,00		767.000,00
TOTAL						517.000,00	371.556,00		11.741.000,00
