
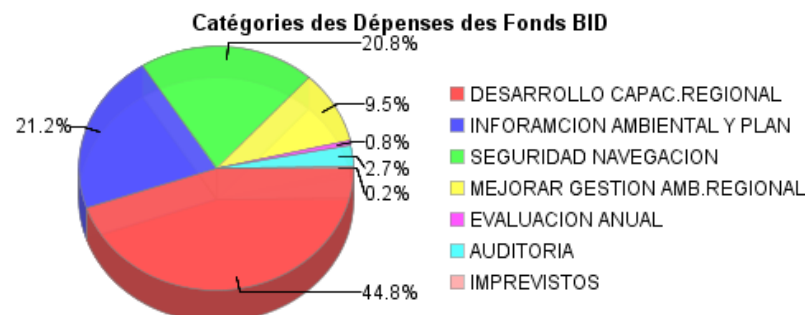
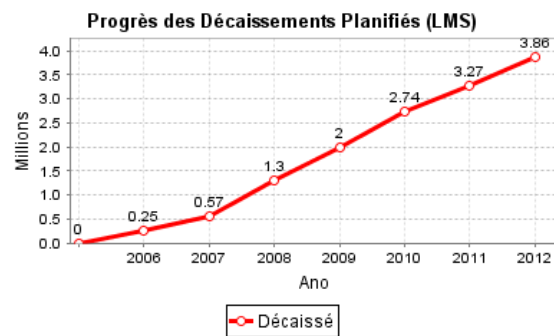



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, Nicaragua				
Secteur:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND GOVERNANCE				
Numéro(s) de Prêt(s):	GRT/FM-9179-RS	Montant Courant Approuvé:	4.800.000,00	Initial BID:	4.800.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	3.991.811,23	Courant BID:	4.800.000,00
Type d' Opération:	GEF - GEF	% Décaissé:	83,16	Pari Passu:	67,00
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	808.188,77	Cofinancement/Pays:	2.400.000,00
Sous-Type de l'Opération:	IGR - Investment Loans			Estimation Initiale:	7.200.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Validé par le Représentant:

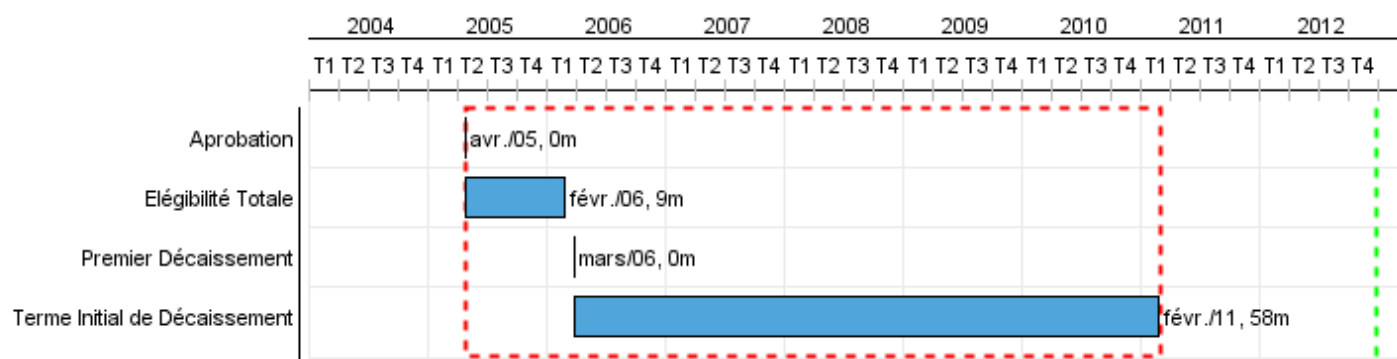

Progrès Cumulé à 2012

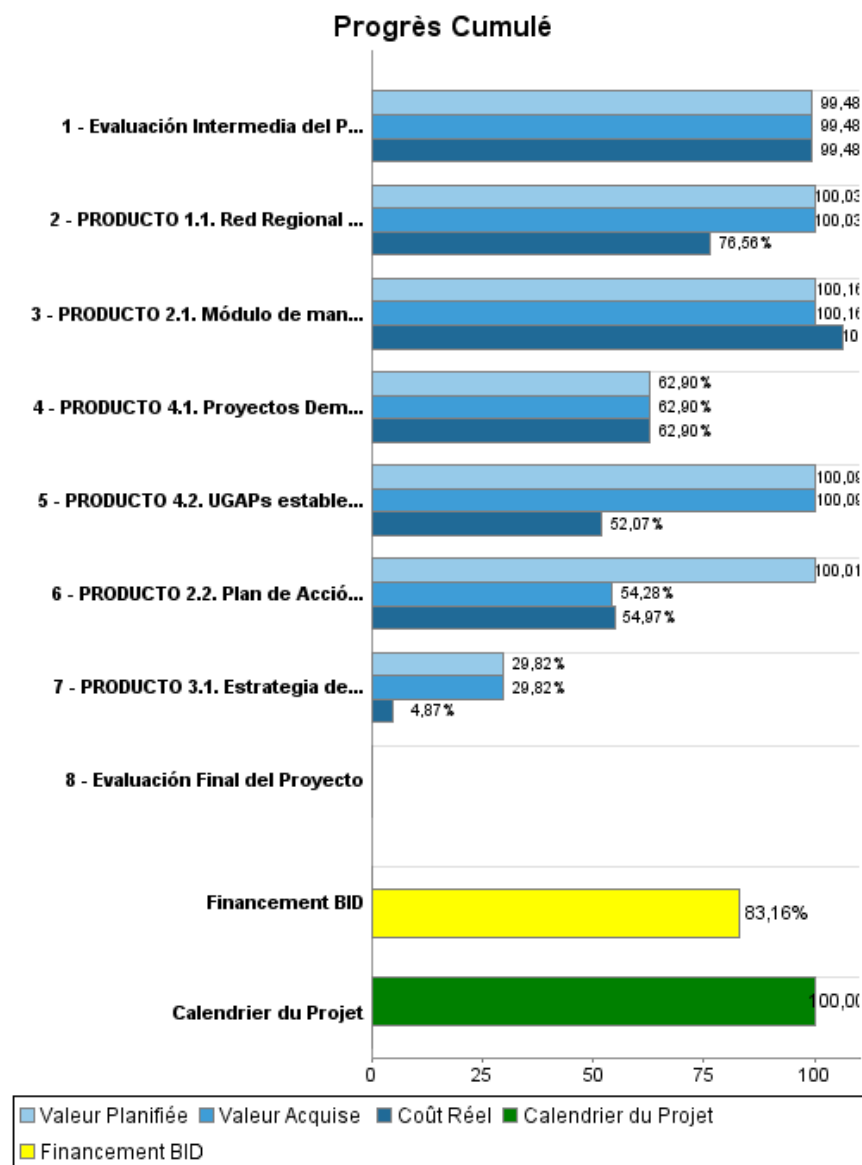

Résultats

Résultat:	Prevención y control de la contaminación y la seguridad de transporte marítimo en el Golfo de Honduras mejorada
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Mecanismo Institucional Sostenible de carácter regional establecido	Mecanismo		2005	P A	3.00
Derrames marítimos accidentales de materiales peligrosos	Derrame	1.00	2010	P A	

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Desarrollo de la capacidad regional para prevenir y controlar la contaminación									
PRODUCTO 1.1. Red Regional de Actores para la prevención y control de la contaminación establecida	Red	1,00	1,00		1,00	226.981,00	104.000,00		523.940,60
Desarrollo de una base de información para el Programa de Acción Estratégico									
PRODUCTO 2.1. Módulo de manejo de información establecido	Módulo	1,00	1,00		1,00	5.115,00	12.000,00		114.381,90
PRODUCTO 2.2. Plan de Acción Estratégico (PAE) socializado	Plan	1,00			1,00	396.848,00	6.000,00		867.755,46
Mejora de la seguridad en las rutas de navegación									
PRODUCTO 3.1. Estrategia de Control de Riesgos de la Navegación ejecutada	Informe	1,00	1,00		1,00	215.332,00	26.000,00		758.879,00
Mejora de la gestión ambiental y medidas de reducción de riesgos en la red regional de cinco puertos									
PRODUCTO 4.1. Proyectos Demostrativos de prevención de la contaminación diseñados	Proyecto				3,00				844.644,00
PRODUCTO 4.2. UGAPs establecidas	UGAP	5,00	5,00		5,00	235.500,00	107.000,00		267.579,00
Gestión del Proyecto									
Coordinación del Proyecto	N/A					167.000,00	75.000,00		3.873.845,90
Monitoreo y Evaluación del Proyecto									
Evaluación Intermedia del Proyecto realizada	Estudio				1,00				25.129,99
Evaluación Final del Proyecto	Estudio	1,00			1,00	25.000,00			
TOTAL						1.271.776,00	330.000,00		7.276.155,85
