
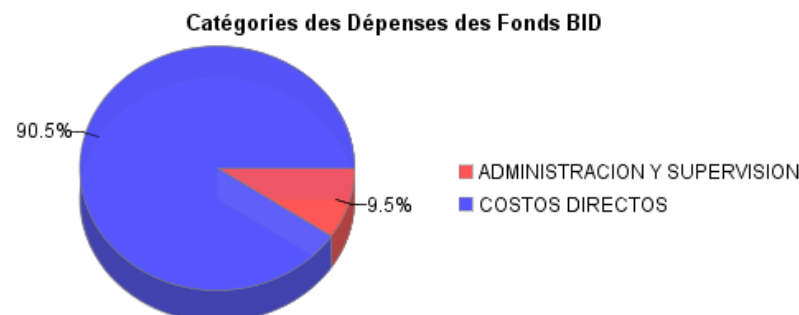
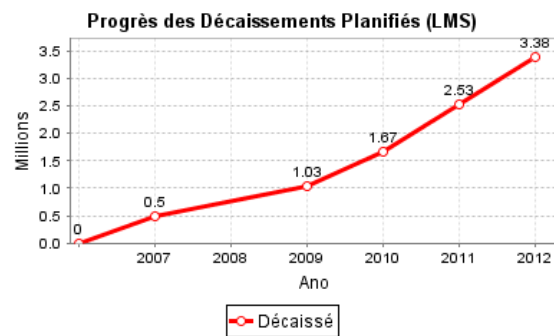



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE VIVIENDA ORDENAMIENTO TERRIT. Y MEDIO AMBIENTE				
Secteur:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND GOVERNANCE				
Numéro(s) de Prêt(s):	1866/OC-UR	Montant Courant Approuvé:	5.000.000,00	Initial BID:	5.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	3.148.440,98	Courant BID:	5.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	62,97	Pari Passu:	71,00
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	1.851.559,02	Cofinancement/Pays:	2.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	SEF - Sector Facility			Estimation Initiale:	7.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	246

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 27-sep-2012 Validé par le Représentant: 28-sep-2012

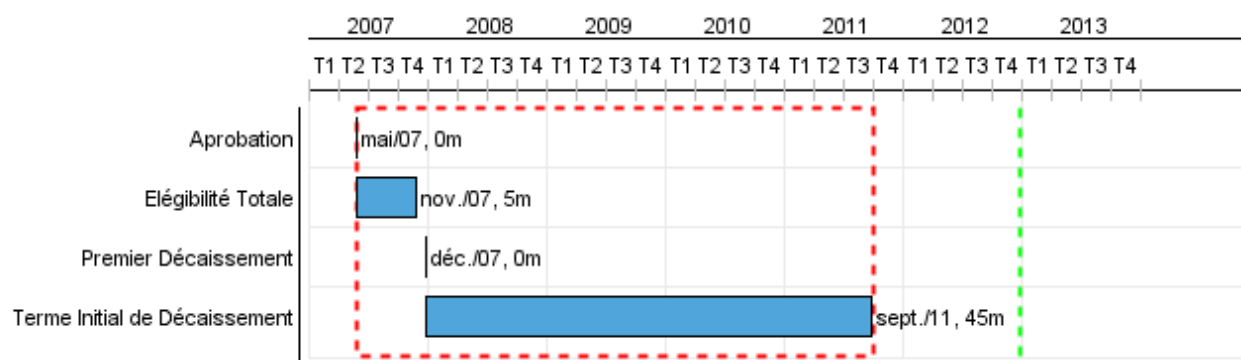

Progrès Cumulé à 2012

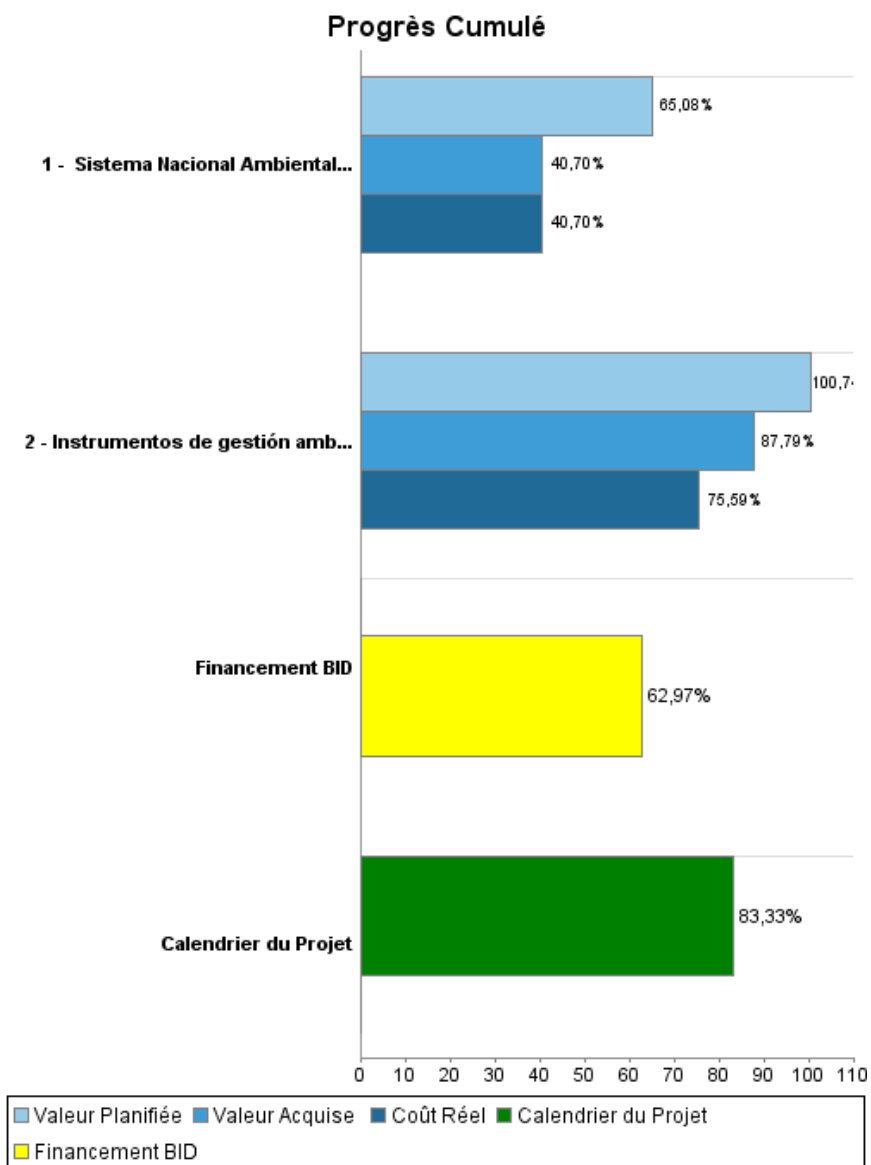

Résultats

Résultat:	Capacidad técnico-operativa de las principales instituciones a cargo de la gestión ambiental del país, fortalecida
Suposições:	Existe voluntad política para modernizar y actualizar el sistema de gestión ambiental actual

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	Fin du Projet
Tiempo de procesamiento de Estudios de Imapacto Ambiental en proyectos ambientalmente complejos a cargo de la Direccion Nacional de Medio Ambiente, cumplen los requisitos de evaluación correspondientes	meses	18.00	2007	P	14.40	11.00	11.00
				A	16.00		
Sistema Nacional Ambiental funcionando, con un organismo cabeza de sector e instituciones sectoriales y departamentales participantes.	Sistema	1.00	2007	P		1.00	1.00
				A			

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Reingeniería de instrumentos de gestión ambiental prioritarios									
Instrumentos de gestión ambiental prioritarios finalizados	Instrumentos	1,00	0,50		8,00	300.000,00	4.422,00		3.168.700,00
Sistema Nacional Ambiental									
Sistema Nacional Ambiental desarrollado	Sistema		0,50		1,00	1.300.000,00	689.382,00		2.781.300,00
Costos Financieros Administración y Supervisión									
Costos Financieros, Administración y Supervisión	N/A					320.000,00	111.970,00		1.050.000,00
TOTAL						1.920.000,00	805.774,00		7.000.000,00
