

## Informe Resumido

### Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): UNIDAD PROVINCIAL COORDINACION Y EJECUCION FINANCIAMIENTO EXTERNO  
Sector: EDUCATION-PRIMARY EDUCATION  
Número(s) de Préstamo: 1991/OC-AR  
Etapas: Approved  
Tipo de Operación: INV - Inversión  
Operación(es) Relacionada(s):  
Subtipo de Operación: ESP - Inversión Específica

### Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 58.500.000,00  
Monto Desembolsado a la fecha: 52.918.140,03  
% Desembolsado: 90,46  
Saldo: 5.581.859,97

### Costo total y Fuente

BID Original: 58.500.000,00  
Actual BID: 58.500.000,00  
Pari-passu: 90,00  
Co-financiamiento/País: 6.500.000,00  
Estimado Original: 65.000.000,00  
Período de Amortización (meses): 234

### Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno

### Reformulación


( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

### Validación

Validado por el Jefe de División:  
Validado por Representante de País:

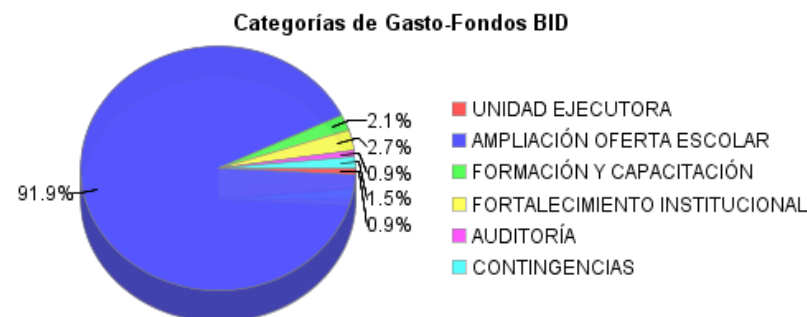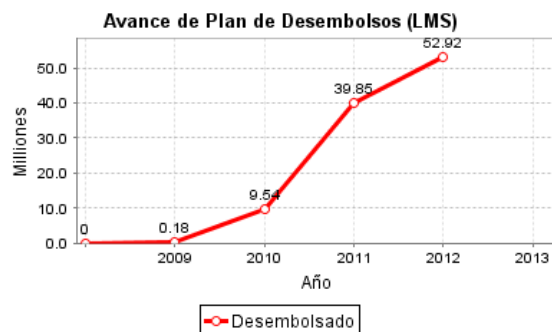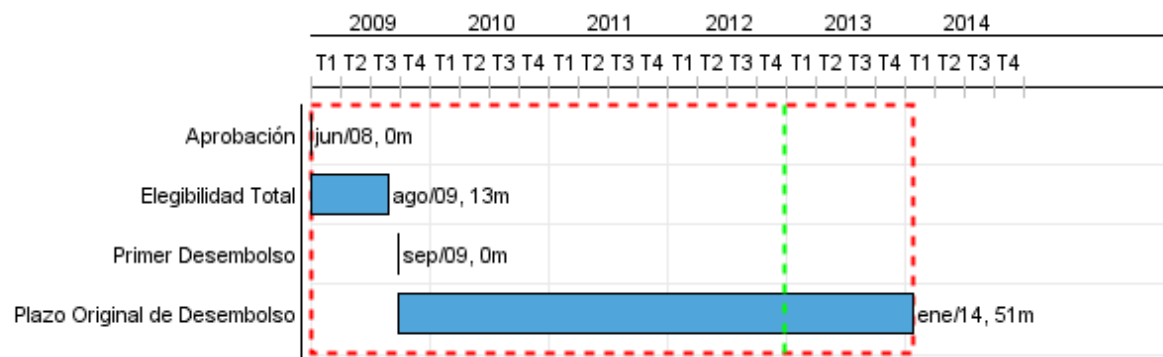

## Progreso Acumulado al 2012

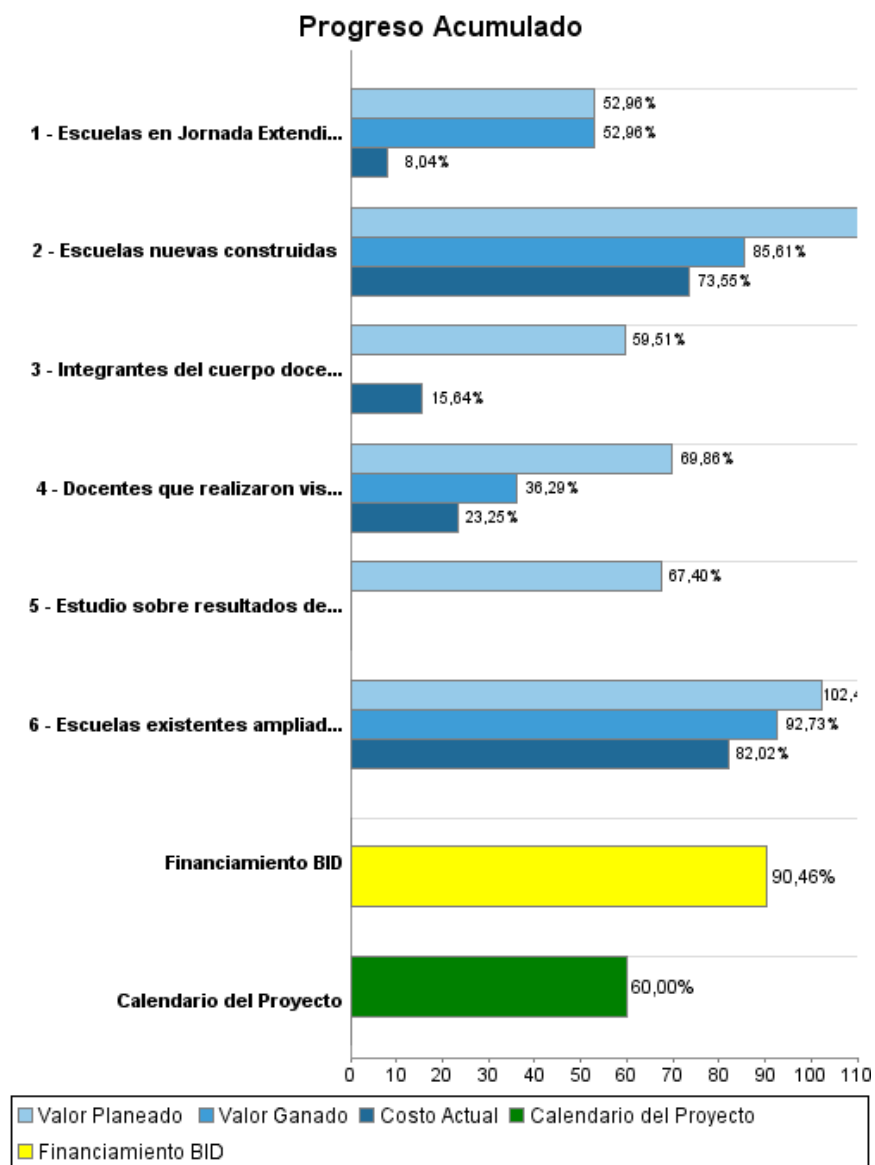

## Resultados

<b>Resultado:</b>	Resultados educativos de los alumnos de primaria provenientes de familias de menores ingresos que asisten a las escuelas de Jornada Escolar Extendida en la provincia de Río Negro mejorados.
<b>Supuestos:</b>	El país y la provincia de Río Negro mantienen un entorno macroeconómico estable. El presupuesto educativo de la provincia incorpora los gastos recurrentes de la jornada escolar extendida y garantiza su financiamiento. La comunidad tiene una percepción favorable de la jornada extendida.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Tasa de repetición de las escuelas del programa en relación con la del grupo de comparación.	Puntos porcentuales	3.30	2007	P A						
Tasa de sobre-edad de las escuelas del programa en relación con la del grupo de comparación.	Puntos porcentuales	25.89	2007	P A						
Diferencia entre el resultado obtenido por el grupo intervenido respecto del grupo de comparación, en las pruebas estandarizadas de aprendizaje de lengua de los alumnos de 3º grado	Puntos porcentuales		2007	P A						5.00
Diferencia entre el resultado obtenido por el grupo intervenido respecto del grupo de comparación en las pruebas estandarizadas de aprendizaje de matemática de los alumnos de 3º grado	Puntos porcentuales		2007	P A						5.00
Diferencia entre el resultado obtenido por el grupo intervenido respecto del grupo de comparación, en las pruebas estandarizadas de aprendizaje de ciencias de los alumnos de 3º grado	Puntos porcentuales		2007	P A						5.00
Diferencia entre el resultado obtenido por el grupo intervenido respecto del grupo de comparación, en las pruebas estandarizadas de aprendizaje de lengua de los alumnos de 6º grado	Puntos porcentuales	33.70	2007	P A						5.00
Diferencia entre el resultado obtenido por el grupo intervenido respecto del grupo de comparación, en las pruebas estandarizadas de aprendizaje de matemática de los alumnos de 6º grado	Puntos porcentuales	34.90	2007	P A						5.00
Diferencia entre el resultado obtenido por el grupo intervenido respecto del grupo de comparación, en las pruebas estandarizadas de aprendizajes de ciencias de los alumnos de 6º grado	Puntos porcentuales		2007	P A						5.00

<b>Resultado:</b>	Política social favorable a la equidad y productividad
<b>Observaciones:</b>	Refiere a meta corporativa que, si bien es de productos, no puede asociarse a un único producto del programa.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Estudiantes (niños y niñas) beneficiados	Estudiantes		2009	P A			2,950.00	4,850.00	700.00	20,720.00
					7,376.00	1,601.00	5,399.00			

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Ampliación de oferta escolar de jornada extendida</b>									
Escuelas nuevas construidas	escuelas	5,00	1,00		18,00	6.714.000,00	2.258,00		25.380.000,00
Escuelas existentes ampliadas o rehabilitadas con equipamiento básico en funcionamiento en Jornada Extendida	escuelas	15,00	10,00		70,00	5.616.000,00	7.102,00		31.185.000,00
Escuelas en Jornada Extendida equipadas con materiales didácticos	escuelas				88,00				2.685.000,00
<b>Formación y capacitación</b>									
Integrantes del cuerpo docente capacitados para Jornada Extendida	Docentes				3.267,00	145.500,00			1.368.000,00
<b>Fortalecimiento institucional</b>									
Docentes que realizaron visitas formativas a experiencias de Jornada Escolar Extendida y diseminaron sus experiencias	Docentes	55,00			200,00	196.300,00			500.000,00
Estudio sobre resultados de la implementación de la Jornada Escolar Extendida	Evaluación				1,00	10.910,00			630.000,00
Otras actividades de fortalecimiento institucional	N/A					129.340,00			870.000,00
<b>Unidad Ejecutora, auditoría, costos financieros y contingencias</b>									
Unidad Ejecutora, auditoría, costos financieros y contingencias	N/A					375.180,00	611,00		2.382.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>13.187.230,00</b>	<b>9.971,00</b>		<b>65.000.000,00</b>
