
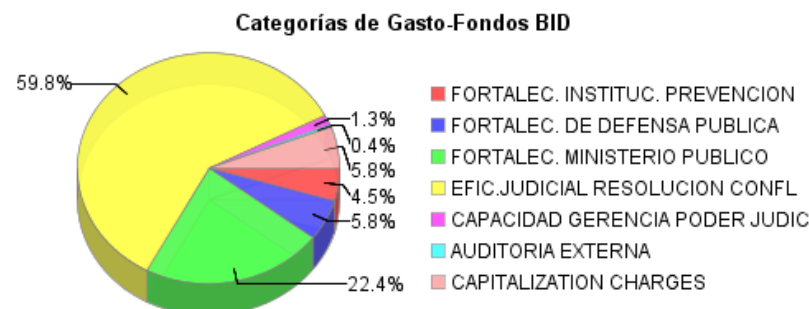
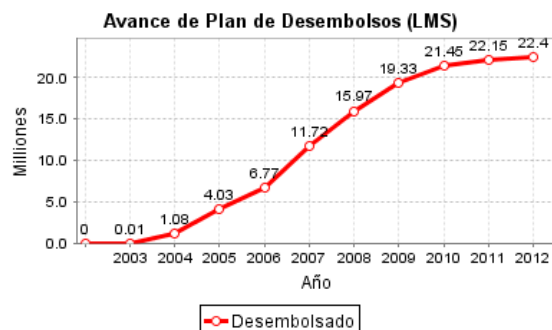



## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE				
Número(s) de Préstamo:	1377/OC-CR	Monto Aprobado Actual:	22.400.000,00	BID Original:	22.400.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	22.400.000,00	Actual BID:	22.400.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	100,00	Pari-passu:	70,00
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo:		Co-financiamiento/País:	9.600.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica			Estimado Original:	32.000.000,00
				Período de Amortización (meses):	228

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B13(R)	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 31-oct-2012 Validado por Representante de País: 01-nov-2012

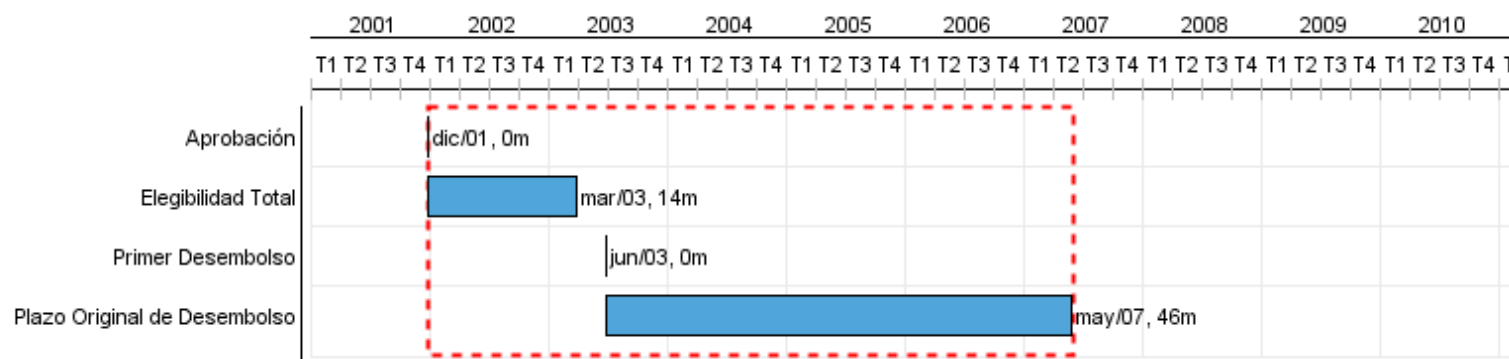

## Progreso Acumulado al 2012

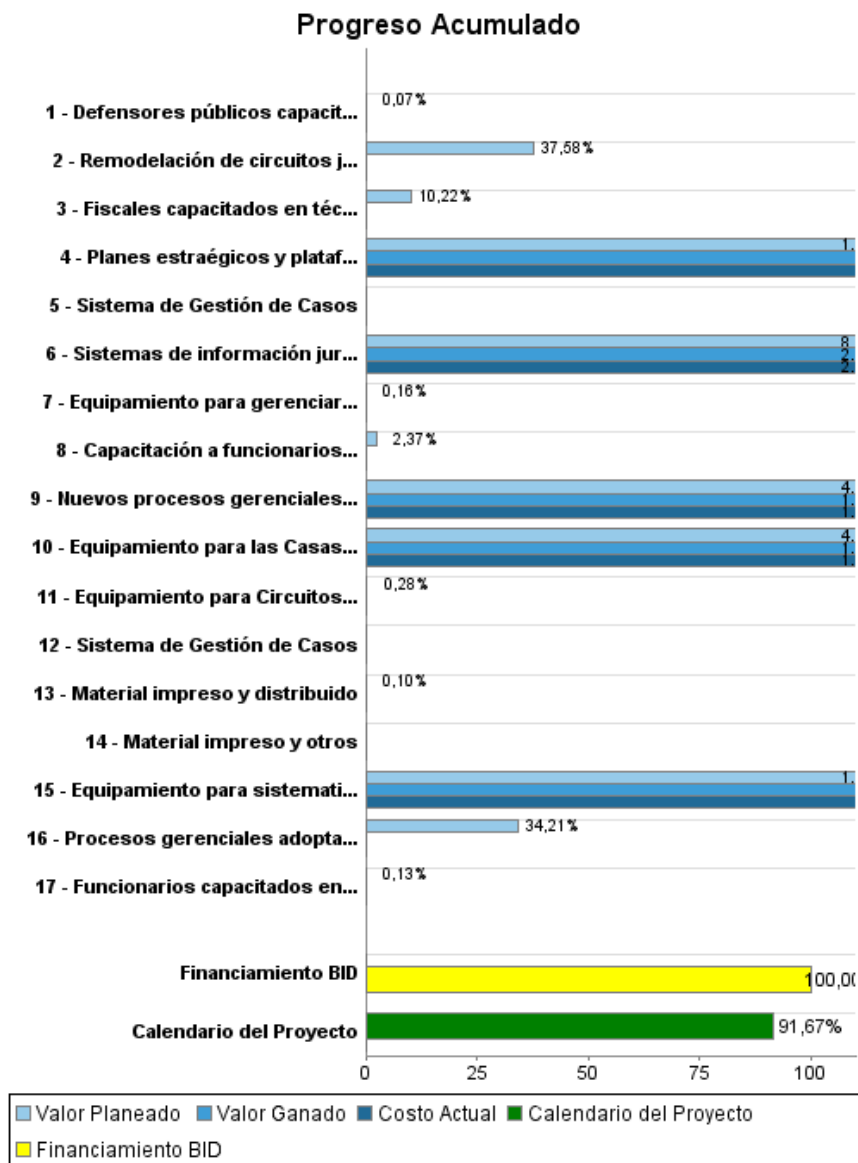

## Resultados

**Resultado:** Eficiencia de la Administración de justicia mejorada.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2003	2005	2008	2009	Fin de Proyecto
Tasa de congestión global.	casos registrados	1.58	2002	P					
				A	1.63	2.02	2.14	2.31	
Tasa de resolución de casos ingresados	casos registrados	61.20	2001	P					
				A	61.40	49.40	46.80	43.30	
Costo medio de caso terminado (US\$)	USA dolar	401.00	2001	P					
				A	436.30	425.00	529.20	539.70	

**Resultado:** Transparencia de la Administración de la Justicia mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2003	2005	2008	2009	Fin de Proyecto
Encuesta anual de percepción ciudadana.	Escala de 1 a 5 (1 muy bajo, 5 muy alto)	3.00	2003	P	3.29		4.00		4.00
				A					

**Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012**

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>CAPACIDAD DE GERENCIA DEL PODER JUDICIAL (Proyecto E)</b>									
Nuevos procesos gerenciales adoptados y en funcionamiento	procesos								219.000,00
Equipamiento para gerenciar sistemas de información adquiridos y en funcionamiento	unidades								100.000,00
<b>FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO PUBLICO (Proyecto C)</b>									
Planes estratégicos y plataformas tecnológicas adoptados y en funcionamiento.	consultorías								2.325.000,00
Equipo informático para sistemas de información adquirido y en funcionamiento	unidades								2.250.000,00
Fiscales capacitados en técnicas de gestión	fiscales				150,00				520.000,00
Sistema de Gestión de Casos	sistema	1,00			1,00				
Material impreso y otros	unidades								
<b>Fortalecimiento institucional para la prevención del Delito. (PROYECTO A)</b>									
Equipamiento para las Casas de Justicia adquirido y en funcionamiento	unidades				6,00				189.000,00
Funcionarios capacitados en materia de prevención del delito	funcionarios								311.300,00
Políticas nacionales de prevención del delito adoptadas e implementadas	programas nacionales								426.300,00
Material impreso y distribuido	unidades								92.500,00
<b>FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA PUBLICA. (Proyecto B)</b>									
Equipamiento para sistematización de gestión de casos adquirido y en funcionamiento	unidades								700.000,00
Procesos gerenciales adoptados y en funcionamiento	procesos								502.000,00
Defensores públicos capacitados en gestión integral de casos	defensores públicos								97.000,00
Sistema de Gestión de Casos	sistema	1,00			1,00				
<b>Eficiencia Judicial en la resolución de conflictos (PROYECTO D)</b>									
Sistemas de información jurídica adoptados y en funcionamiento	sistemas								894.800,00
Equipamiento para Circuitos Judiciales adquirido y en funcionamiento	unidades								7.686.111,00
Remodelación de circuitos judiciales concluida	m2								4.412.890,00

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

CR0141 - Programa Mejoramiento Administración Justicia II  
2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo  
Última Actualización del PMR: 29/10/2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Capacitación a funcionarios judiciales concluida	funcionarios judiciales								306.088,00
<b>ADMINISTRACION, AUTORIA EXTERNA, IMPREVISTOS Y GASTOS FINANCIEROS</b>									
ADMINISTRACION, AUTORIA EXTERNA, IMPREVISTOS Y GASTOS FINANCIEROS	N/A								
<b>TOTAL</b>									<b>21.031.989,00</b>
