

## Rapport Résumé

### Données Générales

Agence d' Exécution (EA): CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
Secteur: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE  
Numéro(s) de Prêt(s): 1377/OC-CR  
Étape: Approved  
Type d' Opération: INV - Investissement  
Opération(s) Connexe(s):  
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

### Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 22.400.000,00  
Montant Décaissé à ce Jour: 21.773.598,34  
% Décaissé: 97,20  
Solde: 626.401,66

### Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 22.400.000,00  
Courant BID: 22.400.000,00  
Pari Passu: 74,19  
Cofinancement/Pays: 9.600.000,00  
Estimation Initiale: 32.000.000,00  
Période d'Amortissement (mois): 228

### Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet




### Reformulation

### Validation


Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B

( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: Apr 15, 2011  
Validé par le Représentant: Apr 20, 2011

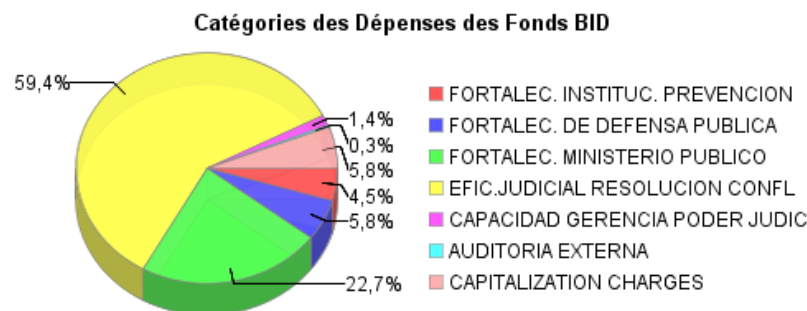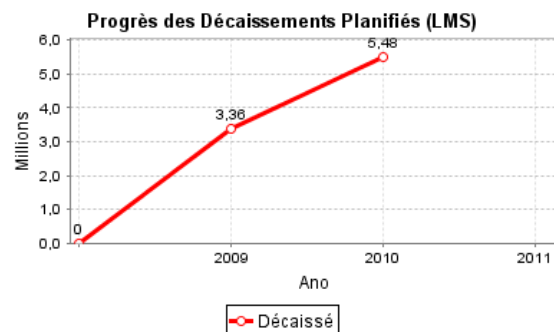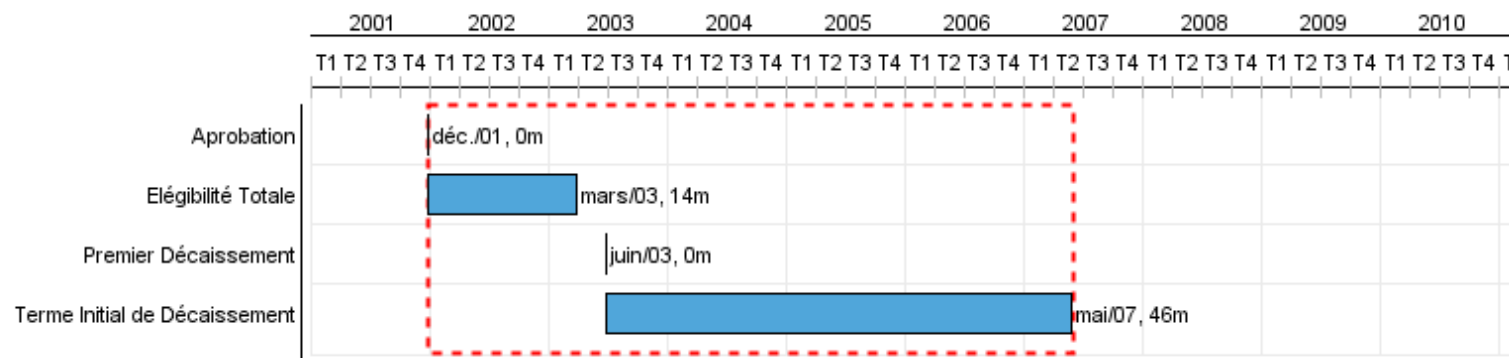

## Progrès Cumulé à 2010

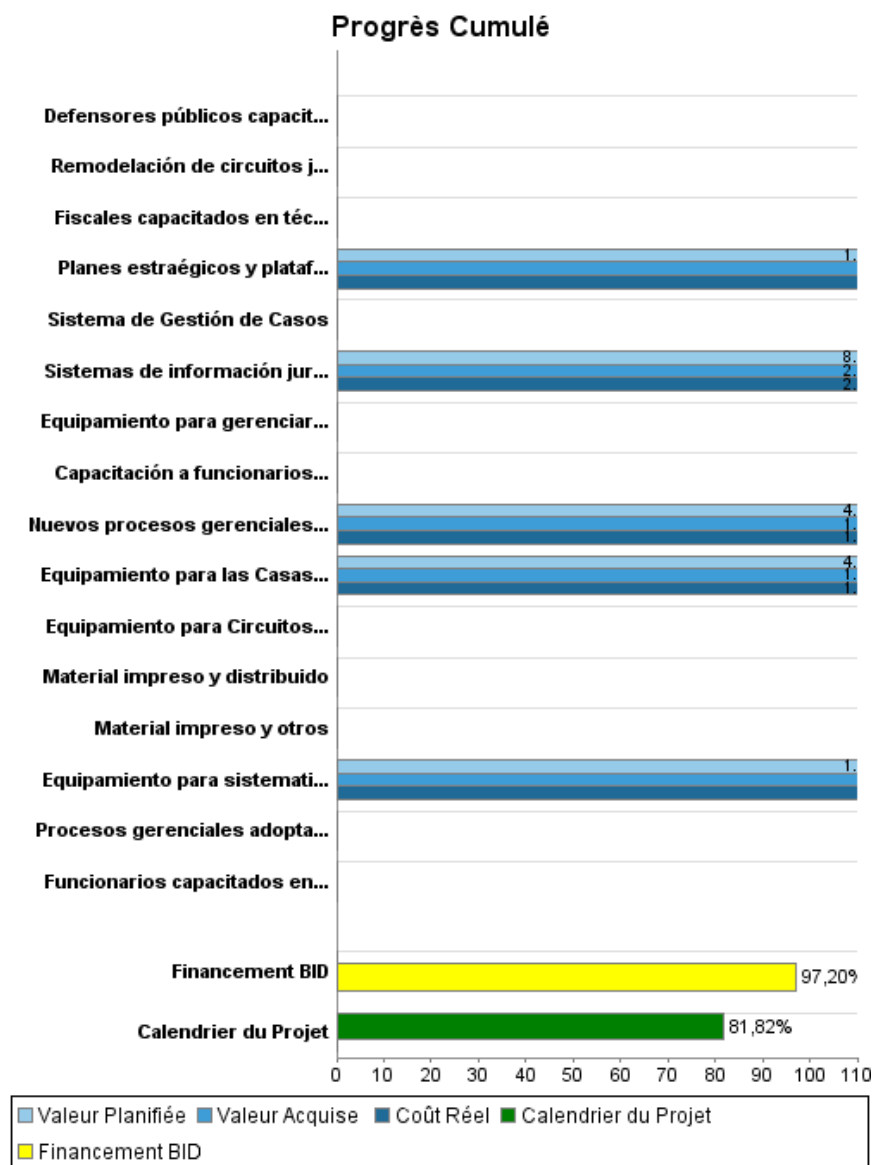

## Résultats

**Résultat:** Eficiencia de la Administración de justicia mejorada.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2003	2005	2008	2009	Fin du Projet
Tasa de congestión global.	casos registrados	1,58	2002	P					0,00
				A	1,63	2,02	2,14	2,31	
Tasa de resolución de casos ingresados	casos registrados	61,20	2001	P					0,00
				A	61,40	49,40	46,80	43,30	
Costo medio de caso terminado (US\$)	USA dolar	401,00	2001	P					0,00
				A	436,30	425,00	529,20	539,70	

**Résultat:** Transparencia de la Administración de la Justicia mejorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2003	2005	2008	2009	Fin du Projet
Encuesta anual de percepción ciudadana.	Escala de 1 a 5 (1 muy bajo, 5 muy alto)	3,00	2003	P	3,29		4,00		4,00
				A					

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>CAPACIDAD DE GERENCIA DEL PODER JUDICIAL (Proyecto E)</b>									
Nuevos procesos gerenciales adoptados y en funcionamiento	estudios						113.710,00		219.000,00
Equipamiento para gerenciar sistemas de información adquiridos y en funcionamiento	unidades								100.000,00
<b>FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO PUBLICO (Proyecto C)</b>									
Planes estratégicos y plataformas tecnológicas adoptados y en funcionamiento	estudios						466.220,00		2.325.000,00
Equipo informático para sistemas de información adquirido y en funcionamiento	unidades								2.250.000,00
Fiscales capacitados en técnicas de gestión	fiscales				150,00				520.000,00
Sistema de Gestión de Casos	sistema				1,00				
Material impreso y otros	unidades								
<b>Fortalecimiento institucional para la prevención del Delito. (PROYECTO A)</b>									
Equipamiento para las Casas de Justicia adquirido y en funcionamiento	estudios				6,00		77.120,00		189.000,00
Funcionarios capacitados en materia de prevención del delito	funcionarios								311.300,00
Políticas nacionales de prevención del delito adoptadas y en funcionamiento	estudios								426.300,00
Material impreso y distribuido	unidades								92.500,00
<b>FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA PUBLICA. (Proyecto B)</b>									
Equipamiento para sistematización de gestión de casos adquirido y en funcionamiento	unidades						23.820,00		700.000,00
Procesos gerenciales adoptados y en funcionamiento	estudios								502.000,00
Defensores públicos capacitados en gestión integral de casos	defensores públicos								97.000,00
Sistema de Gestión de Casos	sistema				1,00				
<b>Eficiencia Judicial en la resolución de conflictos (PROYECTO D)</b>									
Sistemas de información jurídica adoptados y en funcionamiento	estudios						2.720.370,00		894.800,00
Equipamiento para Circuitos Judiciales adquirido y en funcionamiento	unidades								7.686.111,00
Remodelación de circuitos judiciales concluida	m2								4.412.890,00

## RAPPORT DE SUIVI

CR0141 - Judiciary Modernization Program II  
2010 2<sup>o</sup> período con cierre al (31-Mar-2011)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement  
Dernière Mise à Jour: 12/04/2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Capacitación a funcionarios judiciales concluida	funcionarios judiciales								306.088,00
<b>ADMINISTRACION, AUTORIA EXTERNA, IMPREVISTOS Y GASTOS FINANCIEROS</b>									
<b>TOTAL</b>							<b>3.401.240,00</b>		<b>21.031.989,00</b>
