
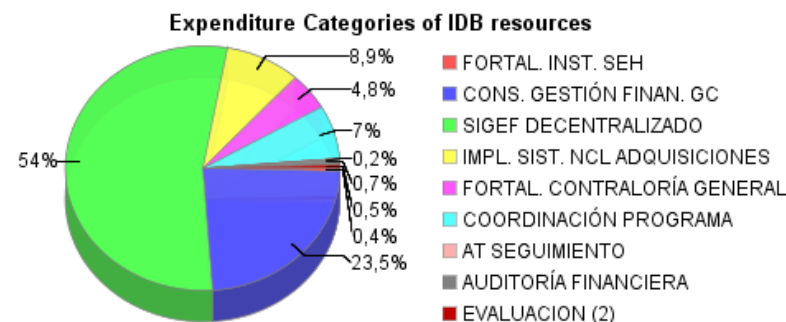
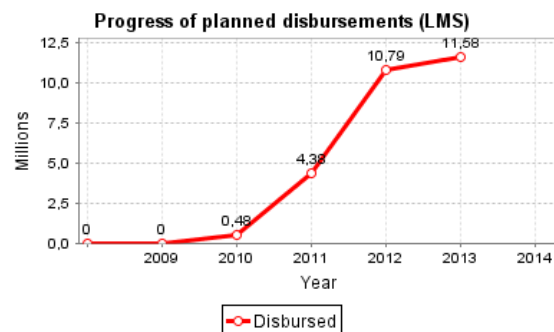



Summary Report

| Basic Data | | Available Funds (US\$) | | Total Cost and Source | |
|------------------------|---|---------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Executing Agency (EA): | SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA | | | | |
| Sector: | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT | | | | |
| Loan Number(s): | 1809/OC-DR | Current Approved Amount: | 21.000.000,00 | Original IDB: | 21.000.000,00 |
| Stage: | Approved | Disbursed Amount to Date: | 11.582.683,65 | Current IDB: | 21.000.000,00 |
| Operation Type: | INV - Investment | % Disbursed: | 55,16 | Pari-passu: | 90,00 |
| Related Operation(s): | | Balance: | 9.417.316,35 | Co-Financing/Country: | 2.400.000,00 |
| Operation Subtype: | ESP - Specific Investment Operation | | | Original Estimate: | 23.400.000,00 |
| | | | | Amortization Period (months): | 204 |


| Project Environmental and Social Impact Category | Reformulation | Validation |
|--|--|--|
| Project Environmental and Social Impact Category: B13(R) | () Was the objective(s) of this project reformulated? | Validated by Division Chief: 28-mar-2013 Validated by Country Representative: 03-abr-2013 |

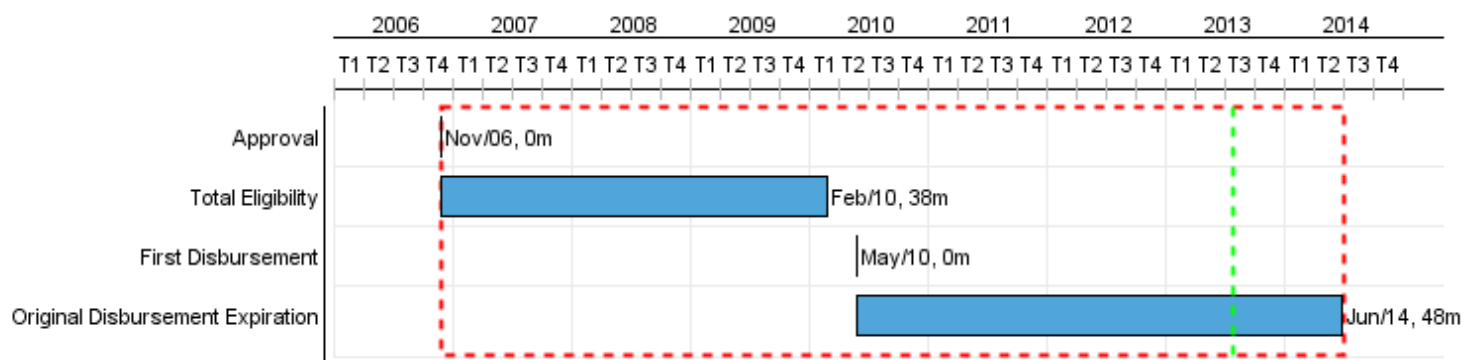

Accumulated Progress as of 2012

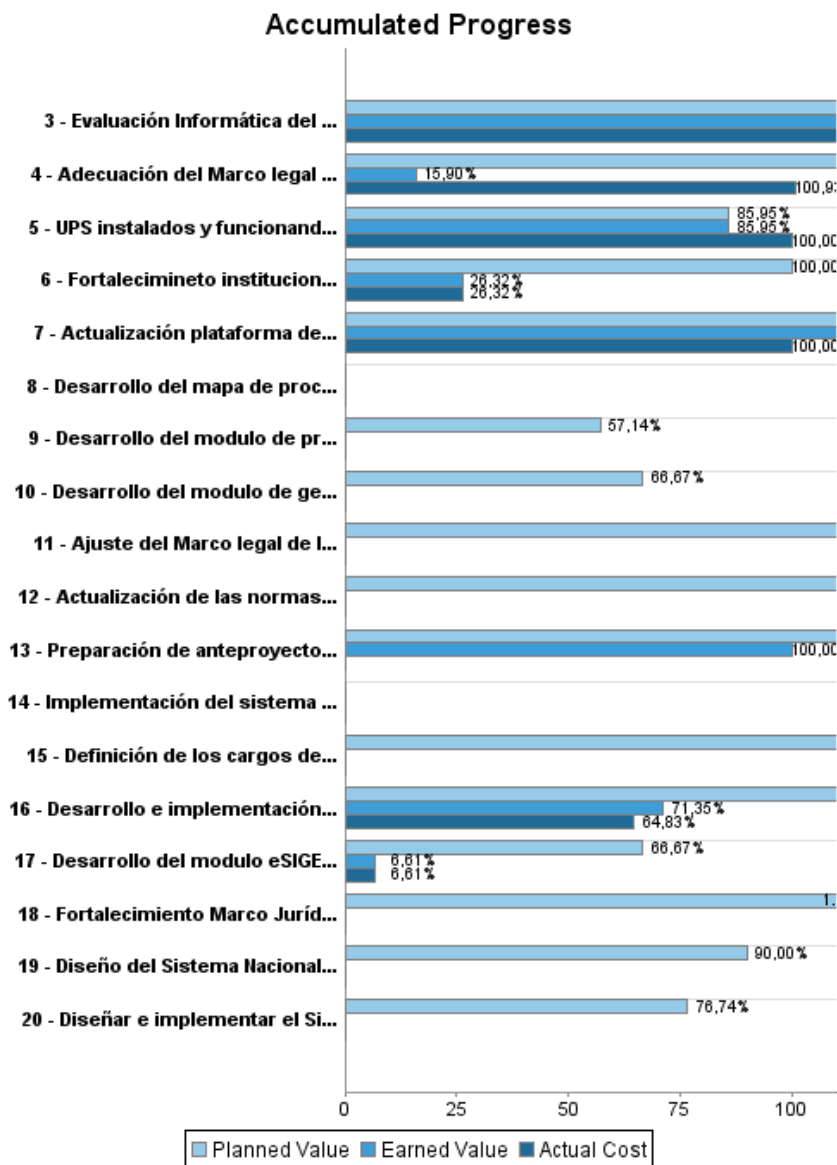

Accumulated Progress

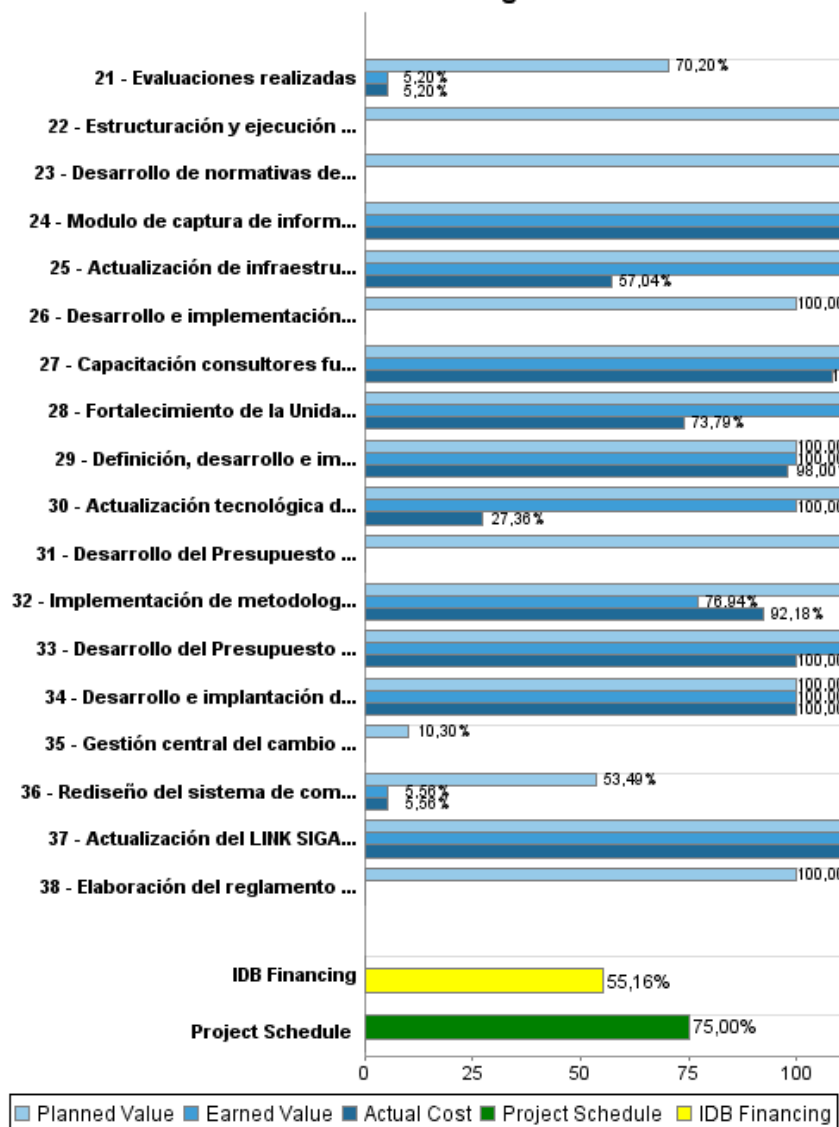

Outcomes

| | |
|-----------------|---|
| Outcome: | Información para la toma de decisiones en la política fiscal aumentada. |
|-----------------|---|

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2012 | End of project |
|---|--------------------------|----------|---------------|--------|-------|----------------|
| Ingresos de financiamiento del Gobierno Central captados automáticamente por el SIGEF | porcentaje ingresos | 30,00 | | P A | 75,00 | 100,00 |
| Las compras y contrataciones del gobierno central se llevan a cabo a través de los nuevos módulos de compras y contrataciones y contabilidad del SIGEF. | porcentaje compras | | | P A | 15,00 | 25,00 |
| Las instituciones que manejan fondos públicos son auditados anualmente. | porcentaje instituciones | | | P A | 25,00 | 70,00 |
| Gastos de financiamiento del Gobierno Central captados automáticamente por el SIGEF | porcentaje gastos | 30,00 | | P A | 75,00 | 100,00 |
| Operaciones de financiamiento del Gobierno Central captados automáticamente por el SIGEF | porcentaje operaciones | 40,00 | | P A | 80,00 | 100,00 |

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

| Description | Unit of Measure | Physical | | | | Financial | | | |
|---|--------------------------------------|----------|--------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------|
| | | Planned | Actual | Accumulated units | EOP units | Planned | Actual | Accumulated costs | EOP costs |
| Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Estado de Finanzas (SEF) | | | | | | | | | |
| Adecuación del Marco legal de la administración financiera a la constitución vigente | anteproyecto de ley | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 9.450,00 | 10.000,00 | | 59.450,00 |
| Preparación de anteproyecto de ley del "Sistema de Administración de Bienes Nacioanles" | anteproyecto de ley | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 15.250,00 | | | 15.250,00 |
| Fortalecimiento de la Unidad de Análisis Política Y Fiscal | unidad política fiscal | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 28.597,10 | 4.197,00 | | 93.088,25 |
| Estructuración y ejecución de la oferta académica en adm. financiera | oferta academica | 1,00 | | | 1,00 | 75.930,00 | | | 75.930,00 |
| Implementación del sistema de educación a distancia (via internet) | convenio de coop. e-learning | | | | 1,00 | | | | |
| Definición de los cargos de la carrera especializada en Finanzas Publicas y socialización de la carrera | carrera en Finanzas Pub. | | | | 1,00 | | | | 15.750,00 |
| Fortalecimineto institucional de órganos rectores | manuales de organización y funciones | | 0,17 | | 2,00 | | | | 47.500,00 |
| Consolidación de la Reforma de la Gestión Financiera del Gobierno Central | | | | | | | | | |
| Evaluación Informática del SIGEF | Evaluación SIGEF | | | | 1,00 | | | | 52.245,00 |
| Capacitación consultores funcionales e informáticos del PAFI | consultores | | | | 49,00 | | 5.000,00 | | 62.250,00 |
| UPS instalados y funcionando para centro de datos | UPS | | | | 1,00 | | | | 93.982,24 |
| Implementación de metodología y herramientas para el desarrollo y documentación del SIGEF | metodologías y herramientas | | 1,00 | | 3,00 | | 42.359,00 | | 64.581,25 |
| Actualización plataforma desarrollo del SIGEF | Sistemas | | 1,00 | | 1,00 | | | | 56.700,00 |
| Desarrollo del mapa de procesos de la administración financiera | mapas de procesos | | 6,00 | | | | | | |
| Desarrollo del Presupuesto Orientado a Resultados (POR) | POR | 1,00 | | | 1,00 | 33.075,00 | | | 33.075,00 |
| Desarrollo del Presupuesto Plurianual | Presupuesto Plurianual | | 1,00 | | 1,00 | | | | 23.450,00 |
| Definición, desarrollo e implementación de la cuenta única (CUT) | Cuenta única | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 33.363,81 | 31.000,00 | | 118.363,81 |

| Description | Unit of Measure | Physical | | | | Financial | | | |
|--|------------------------|----------|--------|-------------------|-----------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | Planned | Actual | Accumulated units | EOP units | Planned | Actual | Accumulated costs | EOP costs |
| Desarrollo de normativas de Contabilidad Gubernamental | Normativa desarrollada | 1,00 | | | 1,00 | 37.800,00 | | | 37.800,00 |
| Desarrollo e implantación del módulo de gestión financiera de la nómina del SIGEF | Módulo nómina | 1,00 | | | 1,00 | | | | 27.000,00 |
| Modulo de captura de información financiera del SPNF implementado y ampliada la base de datos del SIGEF | Modulo | 1,00 | 0,60 | | 1,00 | | 10.000,00 | | 26.000,00 |
| Actualización del LINK SIGADE-SIGEF | LINK actualizado | | 1,00 | | 1,00 | | 20.200,00 | | 12.700,00 |
| Desarrollo Expediente y Firma digital | N/A | | | | | | | | 12.600,00 |
| Sostenibilidad, Mantenimiento y soporte del SIGEF Central | N/A | | | | | 76.905,24 | | | 152.190,48 |
| Consultores de planta | N/A | | | | | 1.321.843,66 | 1.154.247,00 | | 5.829.678,07 |
| Elaboración del reglamento de aplicación de la ley 423-06 en el ambito de los ayuntamientos | reglamento | | | | 1,00 | | | | 30.000,00 |
| Desarrollo del Sistema de Administración Financiera en las Instituciones Descentralizadas y Autónomas. | | | | | | | | | |
| Desarrollo e implementación de un datawarehouse y consulta del ciudadano | Datawarehouse | | 1,00 | | 1,00 | 77.159,71 | | | 219.420,35 |
| Acceso a SIGEF a través del internet | acceso a internet | | 1,00 | | 1,00 | 1.148.823,59 | 1.117.903,00 | | 1.148.823,59 |
| Actualización de infraestructura tecnológica del SIGEF | Infraestructura | 0,74 | 1,00 | | 1,00 | 5.655.710,40 | 3.158.633,00 | | 5.812.400,18 |
| Desarrollo del modulo eSIGEF para 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social | Sistemas | | 1,00 | | 1,00 | 355.215,00 | 70.460,00 | | 1.065.647,81 |
| Gestión central del cambio en la implantación del eSIGEF en 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social | Instituciones | | | | 34,00 | | | | 330.000,00 |
| Soporte anual de infraestructura tecnológica por 3 años | N/A | | | | | 444.747,20 | 496.000,00 | | 1.334.241,60 |
| Costo recursos humanos PAFI (consultores) | N/A | | | | | 1.038.942,20 | 1.025.626,00 | | 2.077.884,39 |
| Desarrollo e implementación del servicio de autenticación centralizada | sistema | | | | 2,00 | | | | 187.000,00 |
| Desarrollo del modulo de presupuesto eSIGEF para 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social | Sistemas | | | | 34,00 | | | | 105.000,00 |

| Description | Unit of Measure | Physical | | | | Financial | | | |
|---|--|----------|--------|-------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | Planned | Actual | Accumulated units | EOP units | Planned | Actual | Accumulated costs | EOP costs |
| Desarrollo del modulo de gestión financiera y contable del eSIGEF para 30 instituciones descentralizadas y autónomas y 4 instituciones de la Seguridad Social | Sistemas | | | | 34,00 | | | | 1.065.000,00 |
| Fortalecimiento de la Gestión de Compras y Contrataciones. | | | | | | | | | |
| Fortalecimiento Marco Jurídico de compras y contrataciones | anteproyecto ley modificación adquisiciones públicas | 1,00 | | | 1,00 | 37.012,50 | | | 37.012,50 |
| Rediseño del sistema de compras y contrataciones y portal único de adquisiciones | Sistema compras y contrataciones | | 1,00 | | 1,00 | 250.000,00 | 51.516,93 | | 1.060.948,81 |
| Actualización tecnológica de infraestructura del sistema de compras | Infraestructura | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 300.000,00 | 82.093,00 | | 300.000,00 |
| Sostenibilidad del sistema de compras y contrataciones - Mantenimiento | N/A | | | | | | | | |
| Costo de los consultores de planta | N/A | | | | | 106.223,00 | 231.857,00 | | 212.447,15 |
| Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General e implementación del sistema de control interno | | | | | | | | | |
| Ajuste del Marco legal de la CGR | Anteproyecto ley SINACI | | | | 1,00 | | | | 42.950,00 |
| Actualización de las normas básicas de Control Interno | Normas Control Interno | 1,00 | | | 1,00 | 124.850,00 | | | 124.800,00 |
| Diseño del Sistema Nacional de Control Interno (SINACI) | Sistema | | | | 1,00 | | | | 251.800,00 |
| Diseñar e implementar el Sistema de Auditoría Interna Gubernamental | Sistema | | | | 1,00 | | | | 621.400,00 |
| Componentes no inversión | | | | | | | | | |
| Auditorías financieras ejecutadas | auditoría | 1,00 | 1,00 | | 4,00 | 24.500,00 | 18.907,00 | | 98.000,00 |
| Evaluaciones realizadas | evaluación | 1,00 | | | 2,00 | 15.000,00 | | | 100.000,00 |
| Equipo de Coordinación del PAFI | N/A | | | | | 1.169.771,00 | 819.314,00 | | 4.353.462,00 |
| Costos financieros | | | | | | | | | |
| Comisión de crédito pagada | N/A | | | | | | 5.160,00 | | 107.750,00 |
| TOTAL | | | | | | 12.380.169,41 | 8.354.472,93 | | 27.595.572,48 |
