



## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	Advocacia Geral da União		
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE		
Numéro(s) de Prêt(s):	2965/OC-BR	Montant Courant Approuvé: 17.100.000,00	Initial BID: 17.100.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	Courant BID: 17.100.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	Pari Passu: 40,00
Opération(s) Connexe(s):	RG-P1442, RG-P1478, RG-P1509	Solde: 17.100.000,00	Cofinancement/Pays: 25.690.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		Estimation Initiale: 42.790.000,00
			Période d'Amortissement (mois):

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division:
		Validé par le Représentant:

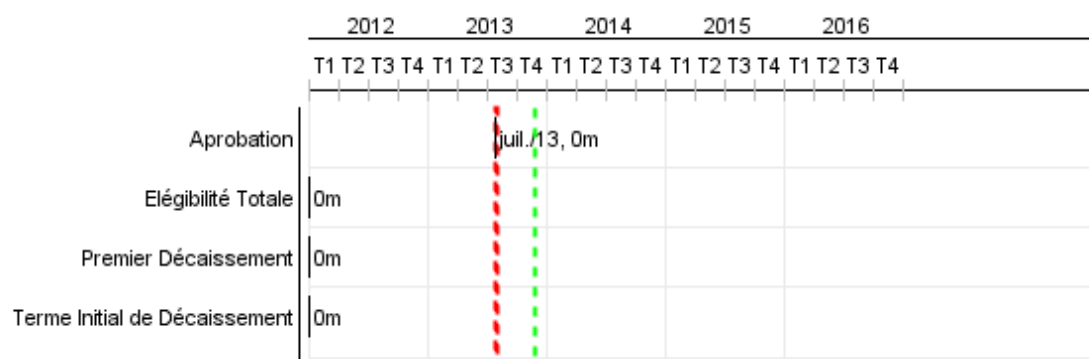


## Progrès Cumulé à 2013



## RAPPORT DE SUIVI

BR-L1277 - Program to Support the Modernization of the Advocacia-Geral da Uniao  
2013 1º período con cierre al (31-oct.-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID  
Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement  
Dernière Mise à Jour: 09/10/2013

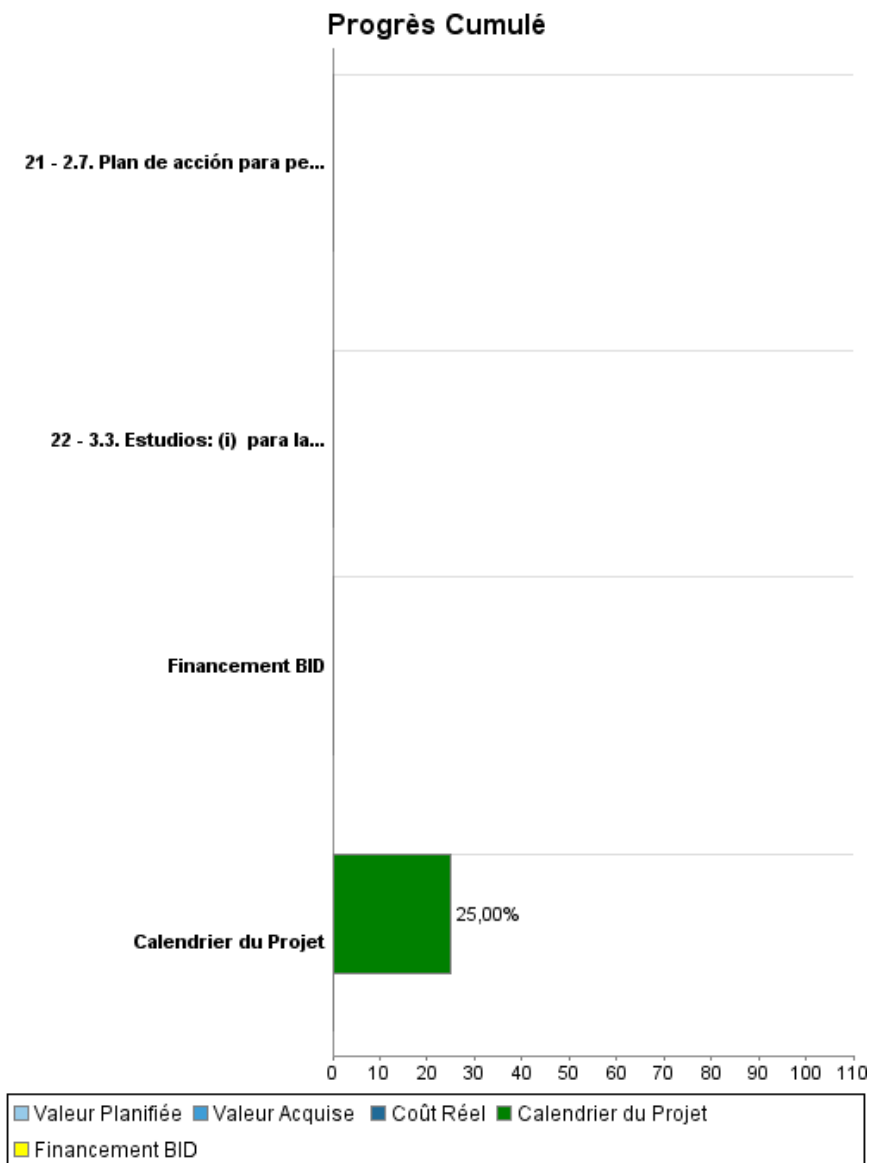

## Résultats

<b>Résultat:</b>	Efectividad judicial
------------------	----------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Tasa porcentual de sentencias desfavorables / total de sentencias * 100	Tasa por-centual de cada año	58,90	2010	P A	30,00

<b>Résultat:</b>	Cobranza judicial
------------------	-------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Tasa porcentual de los montos recaudados por medio de cobranza judicial / total de deuda activa acumulada en el año * 100	Tasa porcentual de cada año	3,10	2010	P A	8,00

<b>Résultat:</b>	Recuperación patrimonial
------------------	--------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Tasa porcentual de los montos patrimoniales recuperados sobre el total de mon-tos involucrados (TCU, convenios, acciones civiles públicas, etc.)	Tasa porcentual de cada año	7,50	2010	P A	22,00

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Fortalecimiento de la Gestión Estratégica</b>									
1.1. Plan de acción para la implementación de la estrategia a fin de mejorar la defensa jurídica del Estado y el papel de la AGU en la sostenibilidad jurídica de las políticas públicas, incluyendo la evaluación de los riesgos para el Estado (Directivas estratégicas 2008/2015).	Plan				1,00				382.889,00
1.2. Sistema para el monitoreo estratégico de los créditos activos y riesgos para el Estado. Estudio para el cálculo de la dimensión del costo fiscal implícito en los pro-cesos contra el Estado.	Sistema				1,00				343.333,00
1.3. Estudio para el cálculo de la dimensión del costo fiscal implícito en los pro-cesos contra el Estado.	Estudio				1,00				120.000,00
1.4. Sistema de indicadores, metas y evaluación para la gestión por resultados	Sistema				1,00				142.500,00
1.5. Herramienta que permita verificar y monitorear la consistencia entre los lineamientos estratégicos y los resultados operativos.	Herramienta				1,00				336.111,00
1.6 Creación de Oficinas de: (i) gestión del conocimiento; (ii) gestión de procesos; y (iii) gestión de proyectos institucionales	Oficinas				3,00				335.139,00
1.7. Instalación herramienta de BI incluyendo recursos para text mining y data mining.	Herramienta				1,00				336.111,00
1.8. Modelo dinámico de gerencia, control, optimización, integración y sostenibilidad de los procesos operativos y de gestión.	Modelo				1,00				464.444,00
1.9. Diseño de una política de comunicación de los cambios a los ciudadanos sobre las acciones previstas en el programa	Política				1,00				815.278,00
1.10. Diseño e implementación de: (i) un plan con la estrategias de gestión del cambio; y (ii) un plan de comunicación interna de los cambios.	Planes				2,00				658.056,00
<b>Mejoramiento de la Gestión Jurídica de la AGU</b>									

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
2.1. reingeniería flujos de trabajo: (i) contenciosos Administración Directa; (ii) consultoría y asesoría Administración Directa; (iii) contenciosos, de consultoría y asesoría jurídicas en la Administración Indirecta; (iv) cálculos y pericias; y (v) Métodos Alternativos Resolución de Conflictos.	Reingeniería				5,00				7.535.833,00
2.2 Planes con las estrategias de prevención para: (i) todos los órganos de la Administración Directa; y (ii) todos los órganos de la Administración Indirecta.	Planes				2,00				758.889,00
2.3 Implementación de planes anuales de capacitación continua de personal especializado en administración y recuperación de créditos	Planes				5,00				839.444,00
2.4. Sistema para la evaluación de riesgos del Estado y su integración en los sistemas corporativos de la AGU. Cuantificar, registrar e informar	Sistema				1,00				388.889,00
2.5 Sistema para identificación y facilitación de la eliminación de los pagos indebidos en los procesos contra el Estado	Sistema				1,00				120.000,00
2.6 Sistema integrado de gestión jurídica de la AGU	Sistema				1,00				24.807.639,00
2.7. Plan de acción para perfeccionamiento de la integración interinstitucional entre los órganos responsables de la deuda activa ( crédito público).	Plan				1,00				260.000,00
<b>Perfeccionamiento de la Gestión Administrativa de la AGU</b>									
3.1. Plan estratégico de gestión de la Secretaría-General	Plan				1,00				80.000,00
3.2. Reingeniería de los flujos de trabajo en los procesos administrativos (excluidos los procesos Logística y RRHH).	Reingeniería				1,00				506.667,00
3.3. Estudios: (i) para la implementación de centros de costos; y (ii) para revisión del modelo de gestión logística territorial	Estudios				2,00				507.222,00
3.4. Sistema integrado de gestión administrativa, sincronizado al SIAFI en los aspectos presupuestarios y financieros	Sistema				1,00				756.667,00
3.5. Modelo de gestión por competencias de la AGU	Modelo				1,00				1.066.667,00

## RAPPORT DE SUIVI

BR-L1277 - Program to Support the Modernization of the Advocacia-Geral da Uniao  
2013 1º período con cierre al (31-oct.-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement  
Dernière Mise à Jour: 09/10/2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Gerencia y Administración</b>									
Gerencia y evaluación	N/A								817.000,00
<b>Imprevistos</b>									
Varios	N/A								411.000,00
<b>TOTAL</b>									<b>42.789.778,00</b>
